



CRONOGRAMA DE PROYECTO

ESTABILIDAD FÍSICA, HIDROLÓGICA Y GEOQUÍMICA DD GAYCO N°630, GAYCO N°580 Y ABRA UM RAURA
Rev. 0

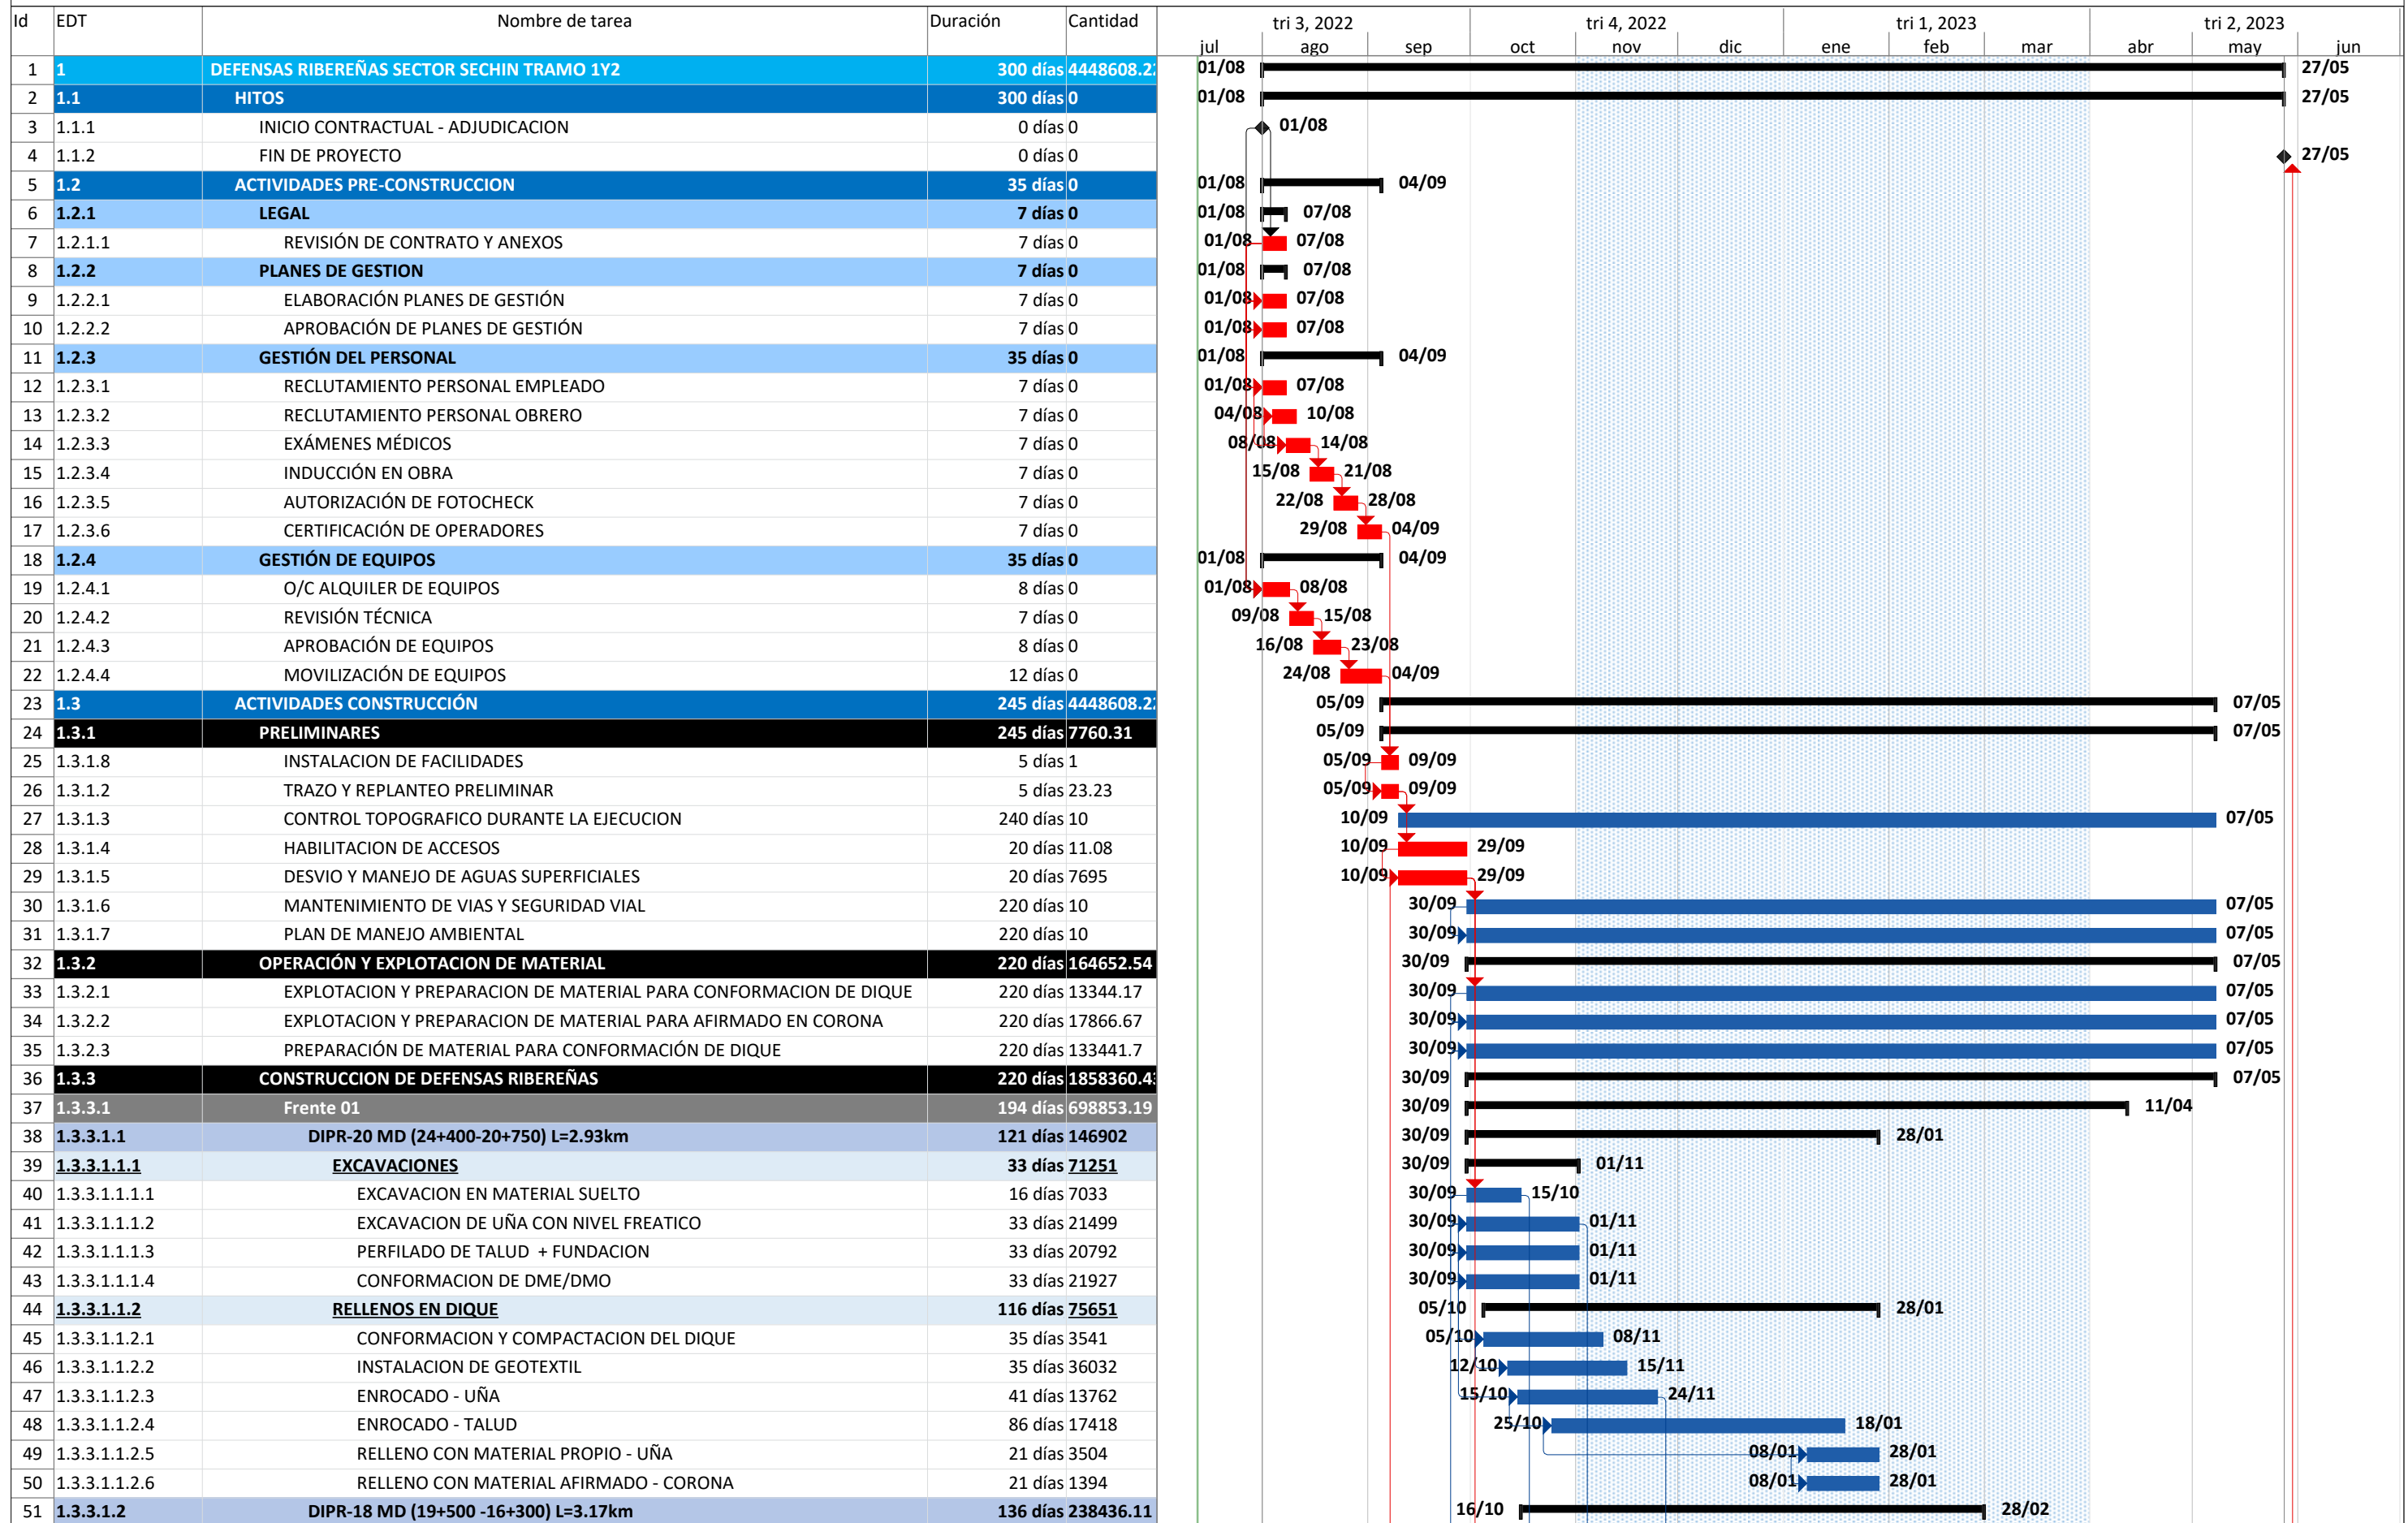


CRONOGRAMA DE PROYECTO

ESTABILIDAD FÍSICA, HIDROLÓGICA Y GEOQUÍMICA DD GAYCO N°630, GAYCO N°580 Y ABRA UM RAURA
Rev. 0

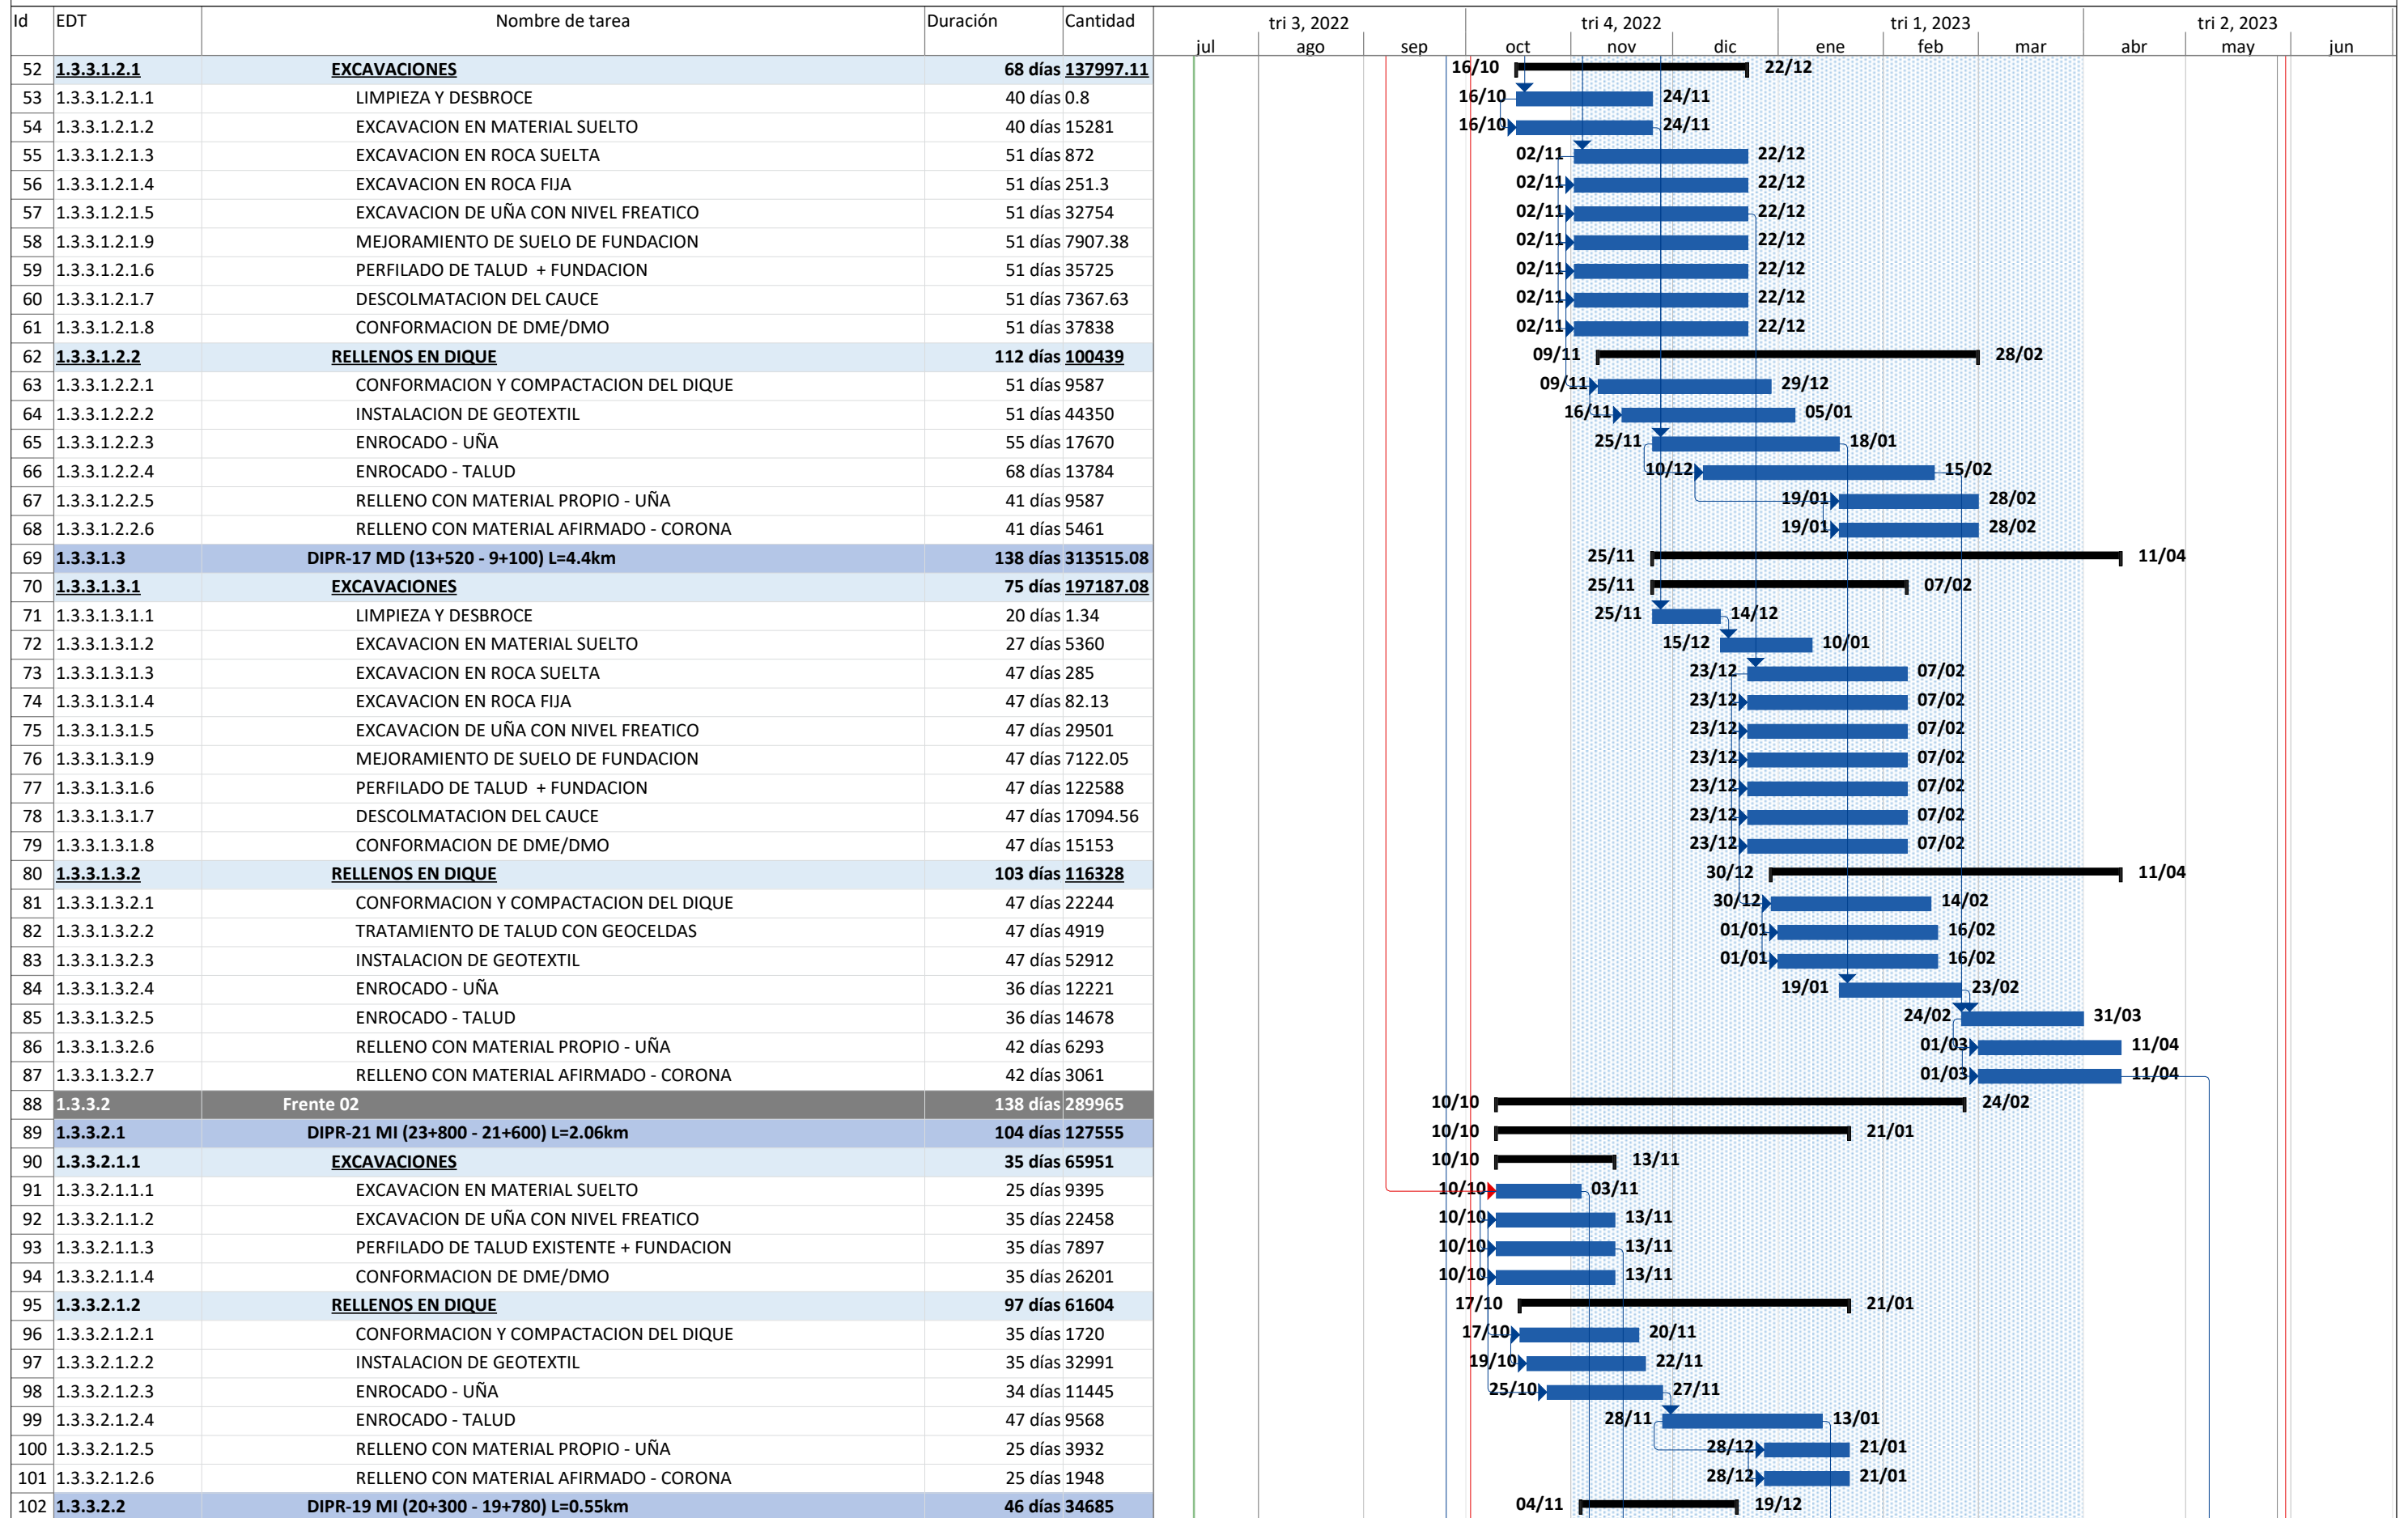

CRONOGRAMA DE PROYECTO

ESTABILIDAD FÍSICA, HIDROLÓGICA Y GEOQUÍMICA DD GAYCO N°630, GAYCO N°580 Y ABRA UM RAURA
Rev. 0

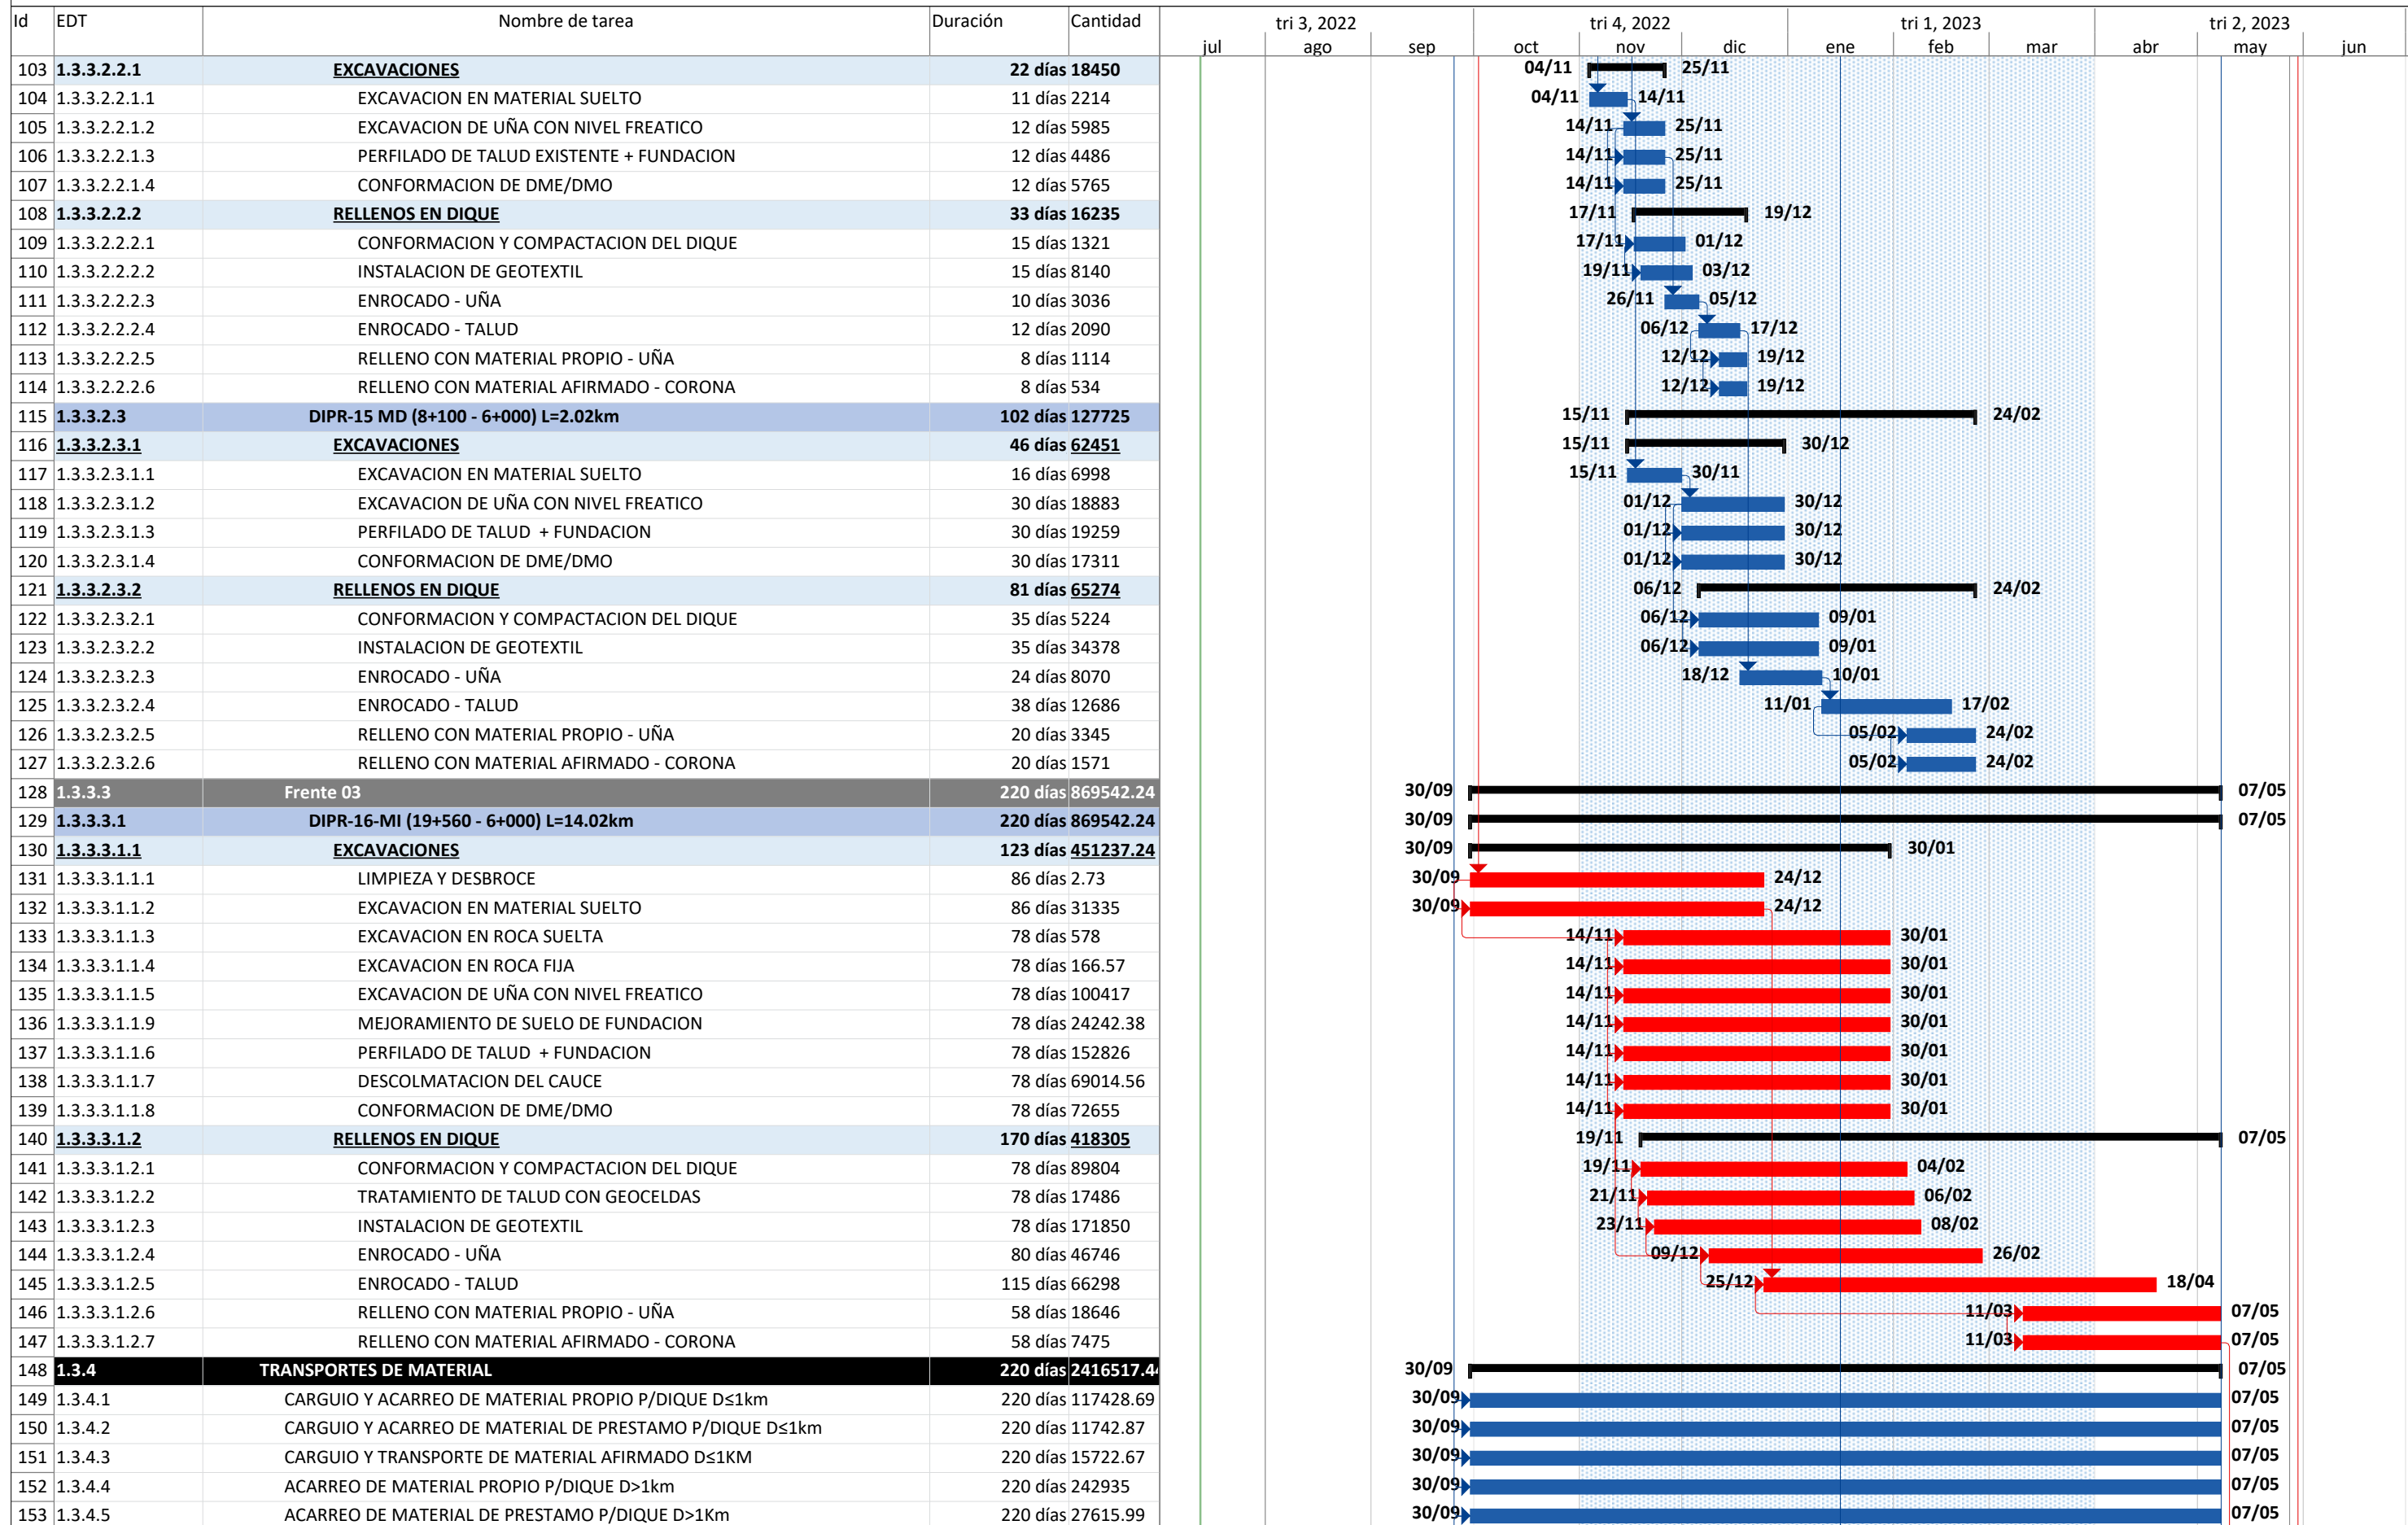



CRONOGRAMA DE PROYECTO
ESTABILIDAD FÍSICA, HIDROLÓGICA Y GEOQUÍMICA DD GAYCO N°630, GAYCO N°580 Y ABRA UM RAURA
Rev. 0

id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Cantidad																	
					jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun					
154	1.3.4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM	220 días	92526.38				30/09									07/05				
155	1.3.4.7	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km	220 días	248732.45				30/09									07/05				
156	1.3.4.8	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km	220 días	721616.77				30/09									07/05				
157	1.3.4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤1km (INCLUYE CARGUÍO)	220 días	2733.38				30/09									07/05				
158	1.3.4.10	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km	220 días	219535.02				30/09									07/05				
159	1.3.4.11	TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km	220 días	715928.22				30/09									07/05				
160	1.3.5	COMPONENTE DE INTERFERENCIAS	96 días	1317.5								14/01				19/04					
161	1.3.5.1	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN SIN REVESTIMIENTO	7 días	1								14/01			20/01						
162	1.3.5.2	REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO	18 días	1273.5								21/01			07/02						
163	1.3.5.3	REEMPLAZO DE BOCATOMA	40 días	33								08/02									
164	1.3.5.10	REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA	6 días	0											20/03		25/03				
165	1.3.5.5	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA	0 días	0													25/03				
166	1.3.5.6	REUBICACIÓN DE POSTE DE DATOS	0 días	0													25/03				
167	1.3.5.11	REUBICACION DE POZO SUPERFICIAL	10 días	0											26/03		04/04				
168	1.3.5.13	REUBICACION DE POZO PROFUNDO	15 días	0											05/04		19/04				
169	1.3.5.9	REUBICACIÓN DE TUBERÍA AGUA	0 días	10													19/04				
170	1.4	ACTIVIDADES POST CONSTRUCCION	20 días	0													08/05	27/05			
171	1.4.2	CIERRE DE PROYECTO, DESMOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPOS	20 días	0													08/05	27/05			
