


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROYECTO - ROCA

CHECK	NOMBRE DE LA TAREA	ESTADO	ASIGNADA A	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN APROXIMADA (días)	COMENTARIOS
	Actividades preliminares contractuales para el personal y equipos	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	01/02	10/02	10	El Cronograma se proyectará a partir de la carta de adjudicación.
—	Actividades Logísticas	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	05/02	14/02	10	
—	Actividades de Movilización/Personal y equipos	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	06/02	15/02	10	
—	Implementación preliminar en la operación	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	10/02	16/02	7	
—	Actividades preliminares de habilitación de áreas de trabajo	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	17/02	23/02	7	
—	Puesta en marcha blanca de las actividades operativas	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	24/02	28/02	5	
—	Ejecución propia del Proyecto	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	01/03	28/06	120	
—	Actividades de desmovilización	No se ha iniciado	EQUIPO DE LA SUBCONTRATISTA	29/06	06/07	8	

—

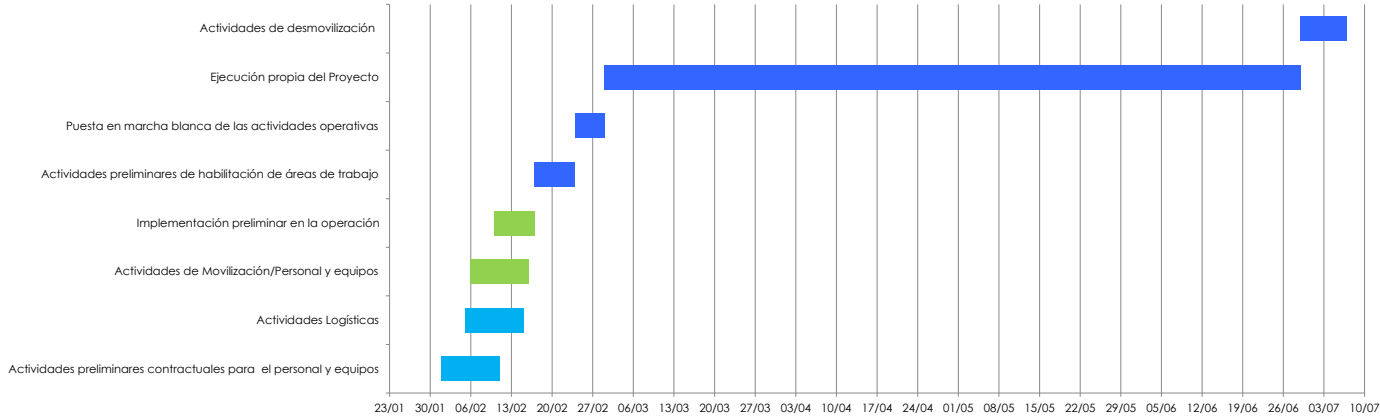

CRONOGRAMA - SUMINISTRO DE ROCA PUESTO EN ACOPIO	CRONOGRAMA			
	COMENZAR	FINALIZAR	CANT. DE DÍAS	Cantidad estimada m3 /semana
Cantidad de ROCA(m3) - semana 01	01/03/25	07/03/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 02	08/03/25	14/03/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 03	15/03/25	21/03/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 04	22/03/25	28/03/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 05	29/03/25	04/04/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 06	05/04/25	11/04/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 07	12/04/25	18/04/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 08	19/04/25	25/04/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 09	26/04/25	02/05/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 10	03/05/25	09/05/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 11	10/05/25	16/05/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 12	17/05/25	23/05/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 13	24/05/25	30/05/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 14	31/05/25	06/06/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 15	07/06/25	13/06/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 16	14/06/25	20/06/25	7	3,169.97
Cantidad de ROCA(m3) - semana 17+1	21/06/25	28/06/25	8	3,622.82
			120.00	54,342.29

ROCA A EXTRAER POR TAMAÑO, CONSIDERANDO EL HUSO GRANULOMETRICO DE LOS ESPESORES 0.90m y 1.20m				
Tipo de roca	Diámetro	Rango	Volumen	Porcentaje por tamaño de roca
ROCA PEQUEÑA	Lado Intermedio D15 (min)	27cm a 40cm	1,274.89	2%
ROCA MEDIANA	Lado Intermedio D15-D50	40 cm a 70 cm	28,870.99	53%
ROCA REGULAR	Lado Intermedio D50-D85	70 cm a 95 cm	17,319.95	32%
ROCA GRANDE	Lado Intermedio D85-D100	95 cm a 120 cm	6,876.46	13%
VOLUMEN TOTAL DE ROCA (m3)			54,342.29	
