


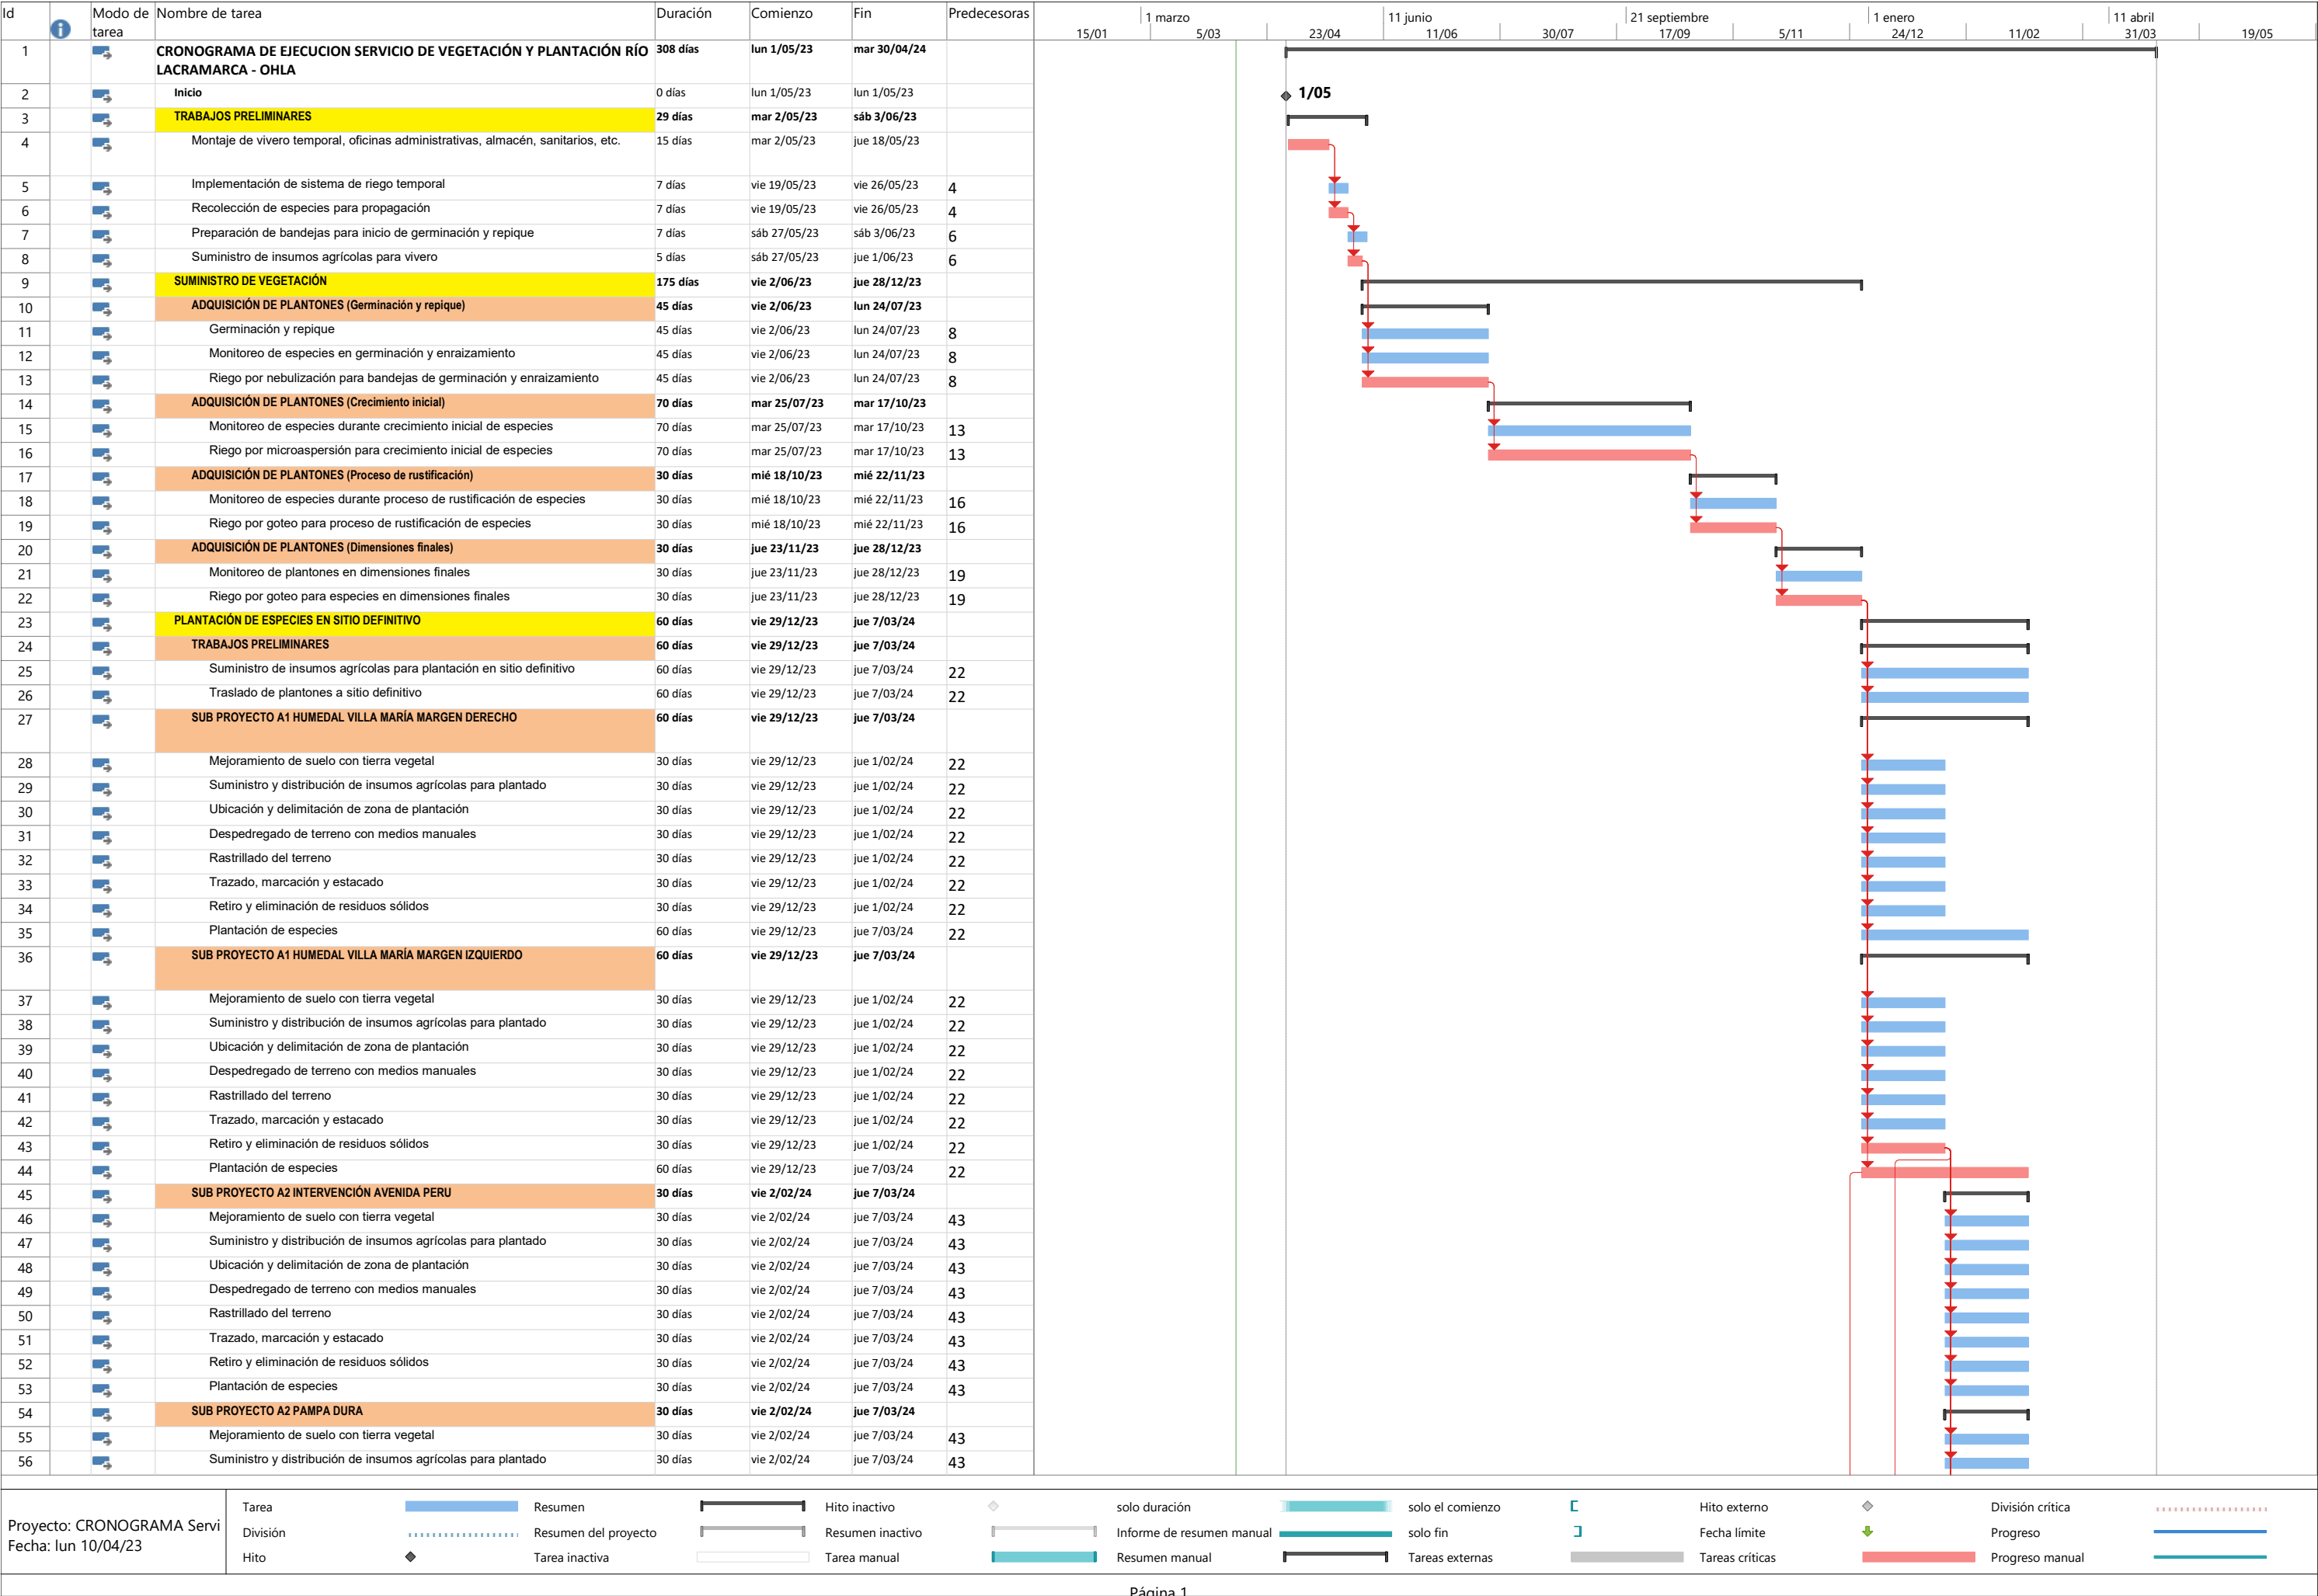

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								15/01	1 marzo	5/03	23/04	11 junio	30/07	21 septiembre	5/11	1 enero	11/02	11 abril	19/05
57			Ubicación y delimitación de zona de plantación	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
58			Despedregado de terreno con medios manuales	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
59			Rastrillado del terreno	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
60			Trazado, marcación y estacado	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
61			Retiro y eliminación de residuos sólidos	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
62			Plantación de especies	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
63			SUB PROYECTO A2 TANGAY	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24													
64			Mejoramiento de suelo con tierra vegetal	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
65			Suministro y distribución de insumos agrícolas para plantado	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
66			Ubicación y delimitación de zona de plantación	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
67			Despedregado de terreno con medios manuales	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
68			Rastrillado del terreno	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
69			Trazado, marcación y estacado	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
70			Retiro y eliminación de residuos sólidos	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
71			Plantación de especies	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
72			SUB PROYECTO A3 PUENTE CHACHAPOYAS	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24													
73			Mejoramiento de suelo con tierra vegetal	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
74			Suministro y distribución de insumos agrícolas para plantado	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
75			Ubicación y delimitación de zona de plantación	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
76			Despedregado de terreno con medios manuales	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
77			Rastrillado del terreno	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
78			Trazado, marcación y estacado	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
79			Retiro y eliminación de residuos sólidos	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
80			Plantación de especies	30 días	vie 2/02/24	jue 7/03/24	43												
81			ACONDICIONAMIENTO DE ESPECIES (Riego+Mantenimiento)	106 días	vie 29/12/23	mar 30/04/24													
82			Riego con camión cisterna adaptada con pitón contra incendios	106 días	vie 29/12/23	mar 30/04/24	44CC												
83			Mantenimiento preventivo para establecimiento de especies	90 días	mié 17/01/24	mar 30/04/24	43FC-14 días												
84			Fin	0 días	lun 1/05/23	lun 1/05/23													

Hito inactivosolo duraciónsolo el comienzoHito externoDivisión crítica

Página 2
