


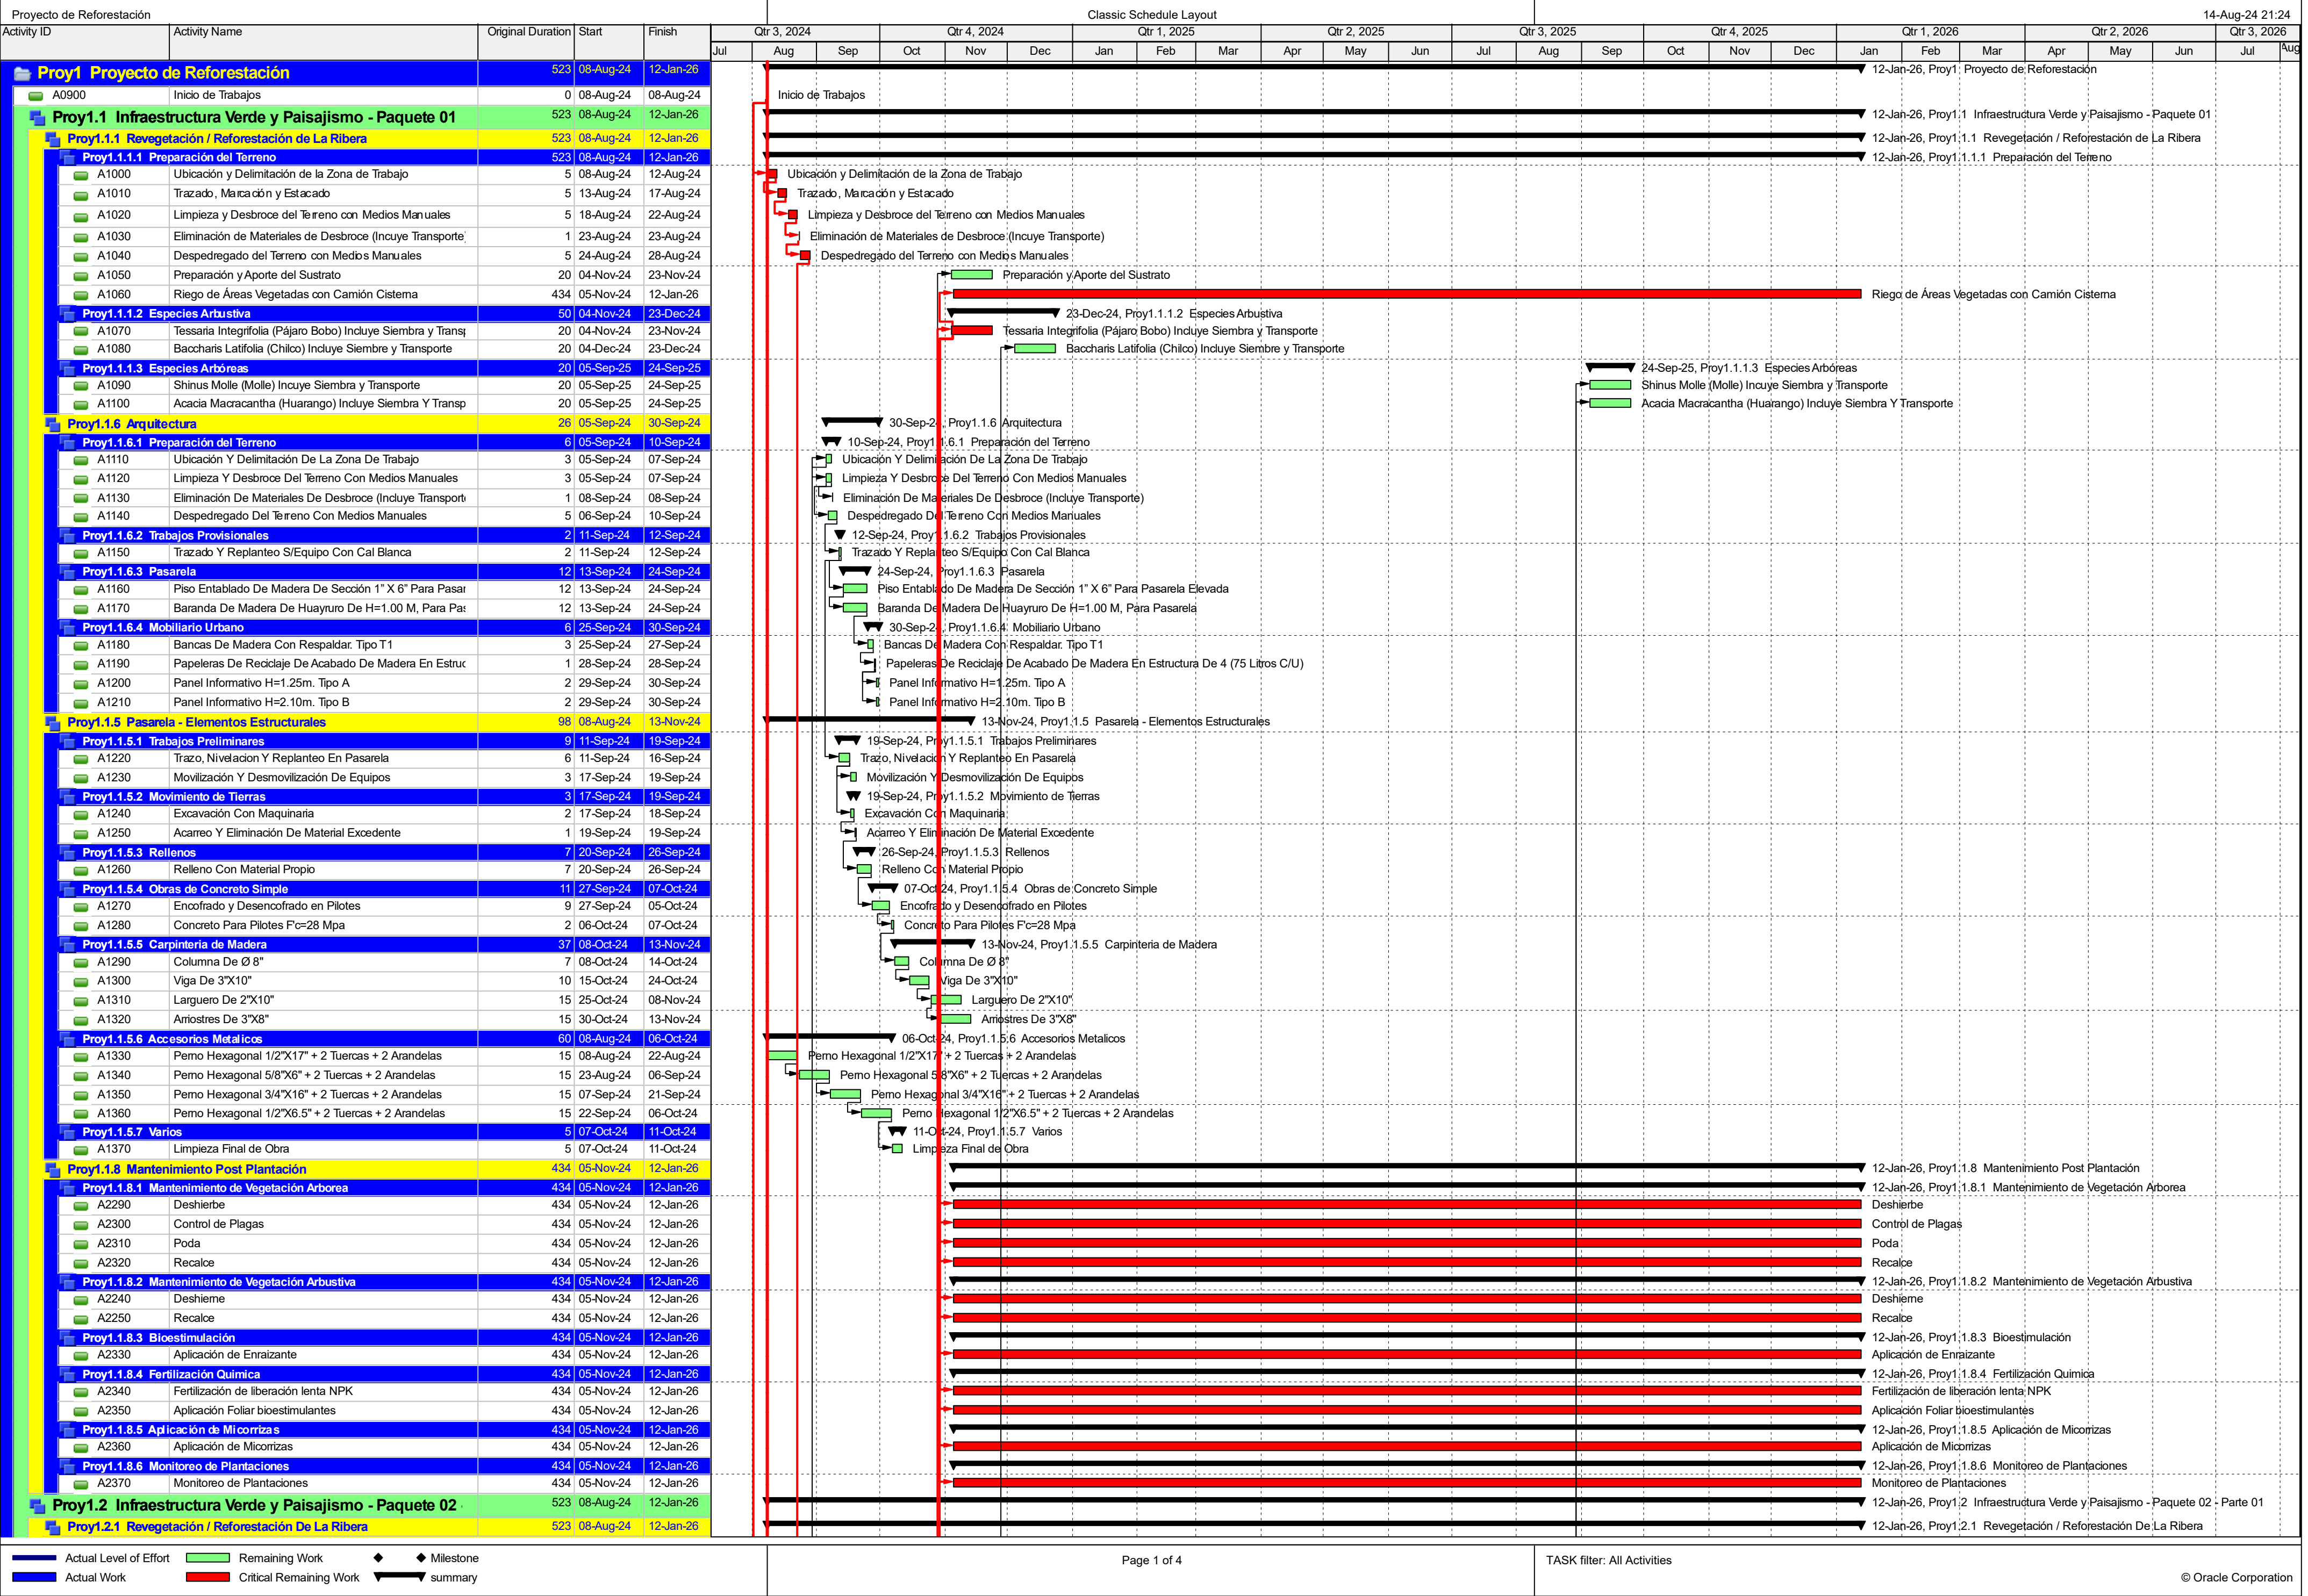

Proyecto de Reforestación					Classic Schedule Layout																14-Aug-24 21:24										
Activity ID		Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2024			Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026	
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
		Proy1.2.1.1 Preparación Del Terreno	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		A1380 Ubicación Y Delimitación De La Zona De Trabajo	5	08-Aug-24	12-Aug-24																										
		A1390 Trazado, Marcación Y Estacado	5	13-Aug-24	17-Aug-24																										
		A1400 Limpieza Y Desbroce Del Terreno Con Medios Manuales	5	18-Aug-24	22-Aug-24																										
		A1410 Eliminación De Materiales De Desbroce (Incluye Transporte)	1	23-Aug-24	23-Aug-24																										
		A1420 Despedregado Del Terreno Con Medios Manuales	5	24-Aug-24	28-Aug-24																										
		A1430 Preparación Y Aporte Del Sustrato	20	04-Nov-24	23-Nov-24																										
		A1440 Riego De Áreas Vegetadas Con Camión Cisterna	434	05-Nov-24	12-Jan-26																										
		Proy1.2.1.2 Especies Arbustivas	50	04-Nov-24	23-Dec-24																										
		A1450 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye Siembra Y Trans	20	04-Nov-24	23-Nov-24																										
		A1460 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye Siembra Y Transporte	20	04-Dec-24	23-Dec-24																										
		Proy1.2.1.3 Especies Arbóreas	115	02-Jun-25	24-Sep-25																										
		A1470 Schinus Molle (Molle) Incluye Siembra Y Transporte	20	05-Sep-25	24-Sep-25																										
		A1480 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye Siembra Y Transp	20	05-Sep-25	24-Sep-25																										
		A1490 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye Siembra Y Transporte	20	02-Jun-25	21-Jun-25																										
		Proy1.2.1.4 Vivero Temporal	7	29-Aug-24	04-Sep-24																										
		A1500 Implementación De Vivero Temporal	7	29-Aug-24	04-Sep-24																										
		Proy1.2.5 Mantenimiento Post Plantación	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.2.5.2 Mantenimiento de Vegetación Arbolea	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2420 Deshierbe	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2430 Control de Plagas	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2440 Poda	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2450 Recalce	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.2.5.1 Mantenimiento de Vegetación Arbustiva	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2380 Deshierbe	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2410 Recalce	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.2.5.3 Bioestimulación	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2460 Aplicación de Enraizante	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.2.5.5 Fertilización Química	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2470 Fertilización de liberación lenta NPK	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2480 Aplicación Foliar Bioestimulantes	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.2.5.6 Aplicación de Micorizas	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2490 Aplicación de Micorizas	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.2.5.7 Monitoreo de Plantaciones	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2500 Monitoreo de Plantaciones	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3 Infraestructura Verde y Paisajismo - Paquete 02	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		Proy1.3.1 Revegetación / Reforestación De La Ribera	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		Proy1.3.1.1 Preparación Del Terreno	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		A1510 Ubicación Y Delimitación De La Zona De Trabajo	5	08-Aug-24	12-Aug-24																										
		A1520 Trazado, Marcación Y Estacado	5	13-Aug-24	17-Aug-24																										
		A1530 Limpieza Y Desbroce Del Terreno Con Medios Manuales	5	18-Aug-24	22-Aug-24																										
		A1540 Eliminación De Materiales De Desbroce (Incluye Transporte)	1	23-Aug-24	23-Aug-24																										
		A1550 Despedregado Del Terreno Con Medios Manuales	5	24-Aug-24	28-Aug-24																										
		A1560 Preparación Y Aporte Del Sustrato	20	04-Nov-24	23-Nov-24																										
		A1570 Riego De Áreas Vegetadas Con Camión Cisterna	204	23-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3.1.2 Especies Arbóreas	115	02-Jun-25	24-Sep-25																										
		A1580 Schinus Molle (Molle) Incluye Siembra Y Transporte	20	05-Sep-25	24-Sep-25																										
		A1590 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye Siembra Y Transp	20	05-Sep-25	24-Sep-25																										
		A1600 Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye Siembra Y Transporte	20	02-Jun-25	21-Jun-25																										
		Proy1.3.3 Mantenimiento Post Plantación	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3.3.1 Mantenimient de Vegetación Arborea	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2510 Deshierbe	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2520 Control de Plagas	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2530 Poda	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2540 Recalce	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3.3.2 Bioestimulación	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2570 Aplicación de Enraizante	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3.3.4 Fertilización Química	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2580 Fertilización de liberación lenta NPK	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2590 Apliación Foliar Bioestimulantes	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3.3.5 Aplicación de Micorizas	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2600 Apliación de Micorizas	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.3.3.6 Monitoreo de Plantaciones	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		A2610 Monitoreo de Plantaciones	224	03-Jun-25	12-Jan-26																										
		Proy1.4 Infraestructura Verde y Paisajismo - Paquete 03	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		Proy1.4.1 Revegetación / Reforestación De La Ribera	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		Proy1.4.1.1 Preparación Del Terreno	523	08-Aug-24	12-Jan-26																										
		A1610 Ubicación Y Delimitación De La Zona De Trabajo	5	08-Aug-24	12-Aug-24																										
		A1620 Trazado, Marcación Y Estacado	5	13-Aug-24	17-Aug-24																										
		A1630 Limpieza Y Desbroce Del Terreno Con Medios Manuales	5	18-Aug-24	22-Aug-24																										
		A1640 Eliminación De Materiales De Desbroce (Incluye Transporte)	1	23-Aug-24	23-Aug-24																										
		A1650 Despedregado Del Terreno Con Medios Manuales	5	24-Aug-24	28-Aug-24																										
		A1680 Preparación Y Aporte Del Sustrato	20	28-Oct-24	16-Nov-24																										
		A1690 Riego De Áreas Vegetadas Con Camión Cisterna	414	25-Nov-24	12-Jan-26																										
		Proy1.4.1.2 Especies Arbustivas	50	04-Nov-24	23-Dec-24																										
		A1700 Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye Siembra Y Trans	20	04-Nov-24	23-Nov-24																										
		A1710 Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye Siembra Y Transporte	20	04-Dec-24	23-Dec-24																										
		Proy1.4.1.3 Especies Arbóreas	115	02-Jun-25	24-Sep-25																										

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

◆ Milestone

◆ summary

Page 2 of 4

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

[illegible]

Proyecto de Reforestación					Classic Schedule Layout															14-Aug-24 21:24												
Activity ID		Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Qtr 3, 2024			Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026		
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	
		A2180	Tubo Astm A500/A500m	1	21-Dec-24	21-Dec-24																										
		Proy1.5.10 Mantenimiento Post Plantación	235	04-May-25	24-Dec-25																											
		Proy1.5.10.1 Mantenimiento de Vegetación Arborea	235	04-May-25	24-Dec-25																											
		A2730	Deshierva	235	04-May-25	24-Dec-25																										
		A2740	Control de Plagas	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		A2750	Poda	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		A2760	Recalce	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		Proy1.5.10.2 Mantenimiento de Vegetación Arbustiva	120	04-May-25	31-Aug-25																											
		A2770	Deshierva	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		A2780	Recalce	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		Proy1.5.10.3 Bioestimulación	120	04-May-25	31-Aug-25																											
		A2790	Aplicación de Enraizante	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		Proy1.5.10.4 Fertilización Química	120	04-May-25	31-Aug-25																											
		A2800	Fertilización de liberación lenta NPK	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		A2810	Aplicación Foliar Bioestimulantes	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		Proy1.5.10.5 Aplicación de Micorrizas	120	04-May-25	31-Aug-25																											
		A2820	Aplicación de Micorrizas	120	04-May-25	31-Aug-25																										
		Proy1.5.10.6 Monitoreo de Plantaciones	120	04-May-25	31-Aug-25																											
		A2830	Monitoreo	120	04-May-25	31-Aug-25																										

Milestone

Milestone

summary

Page 4 of 4

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
