


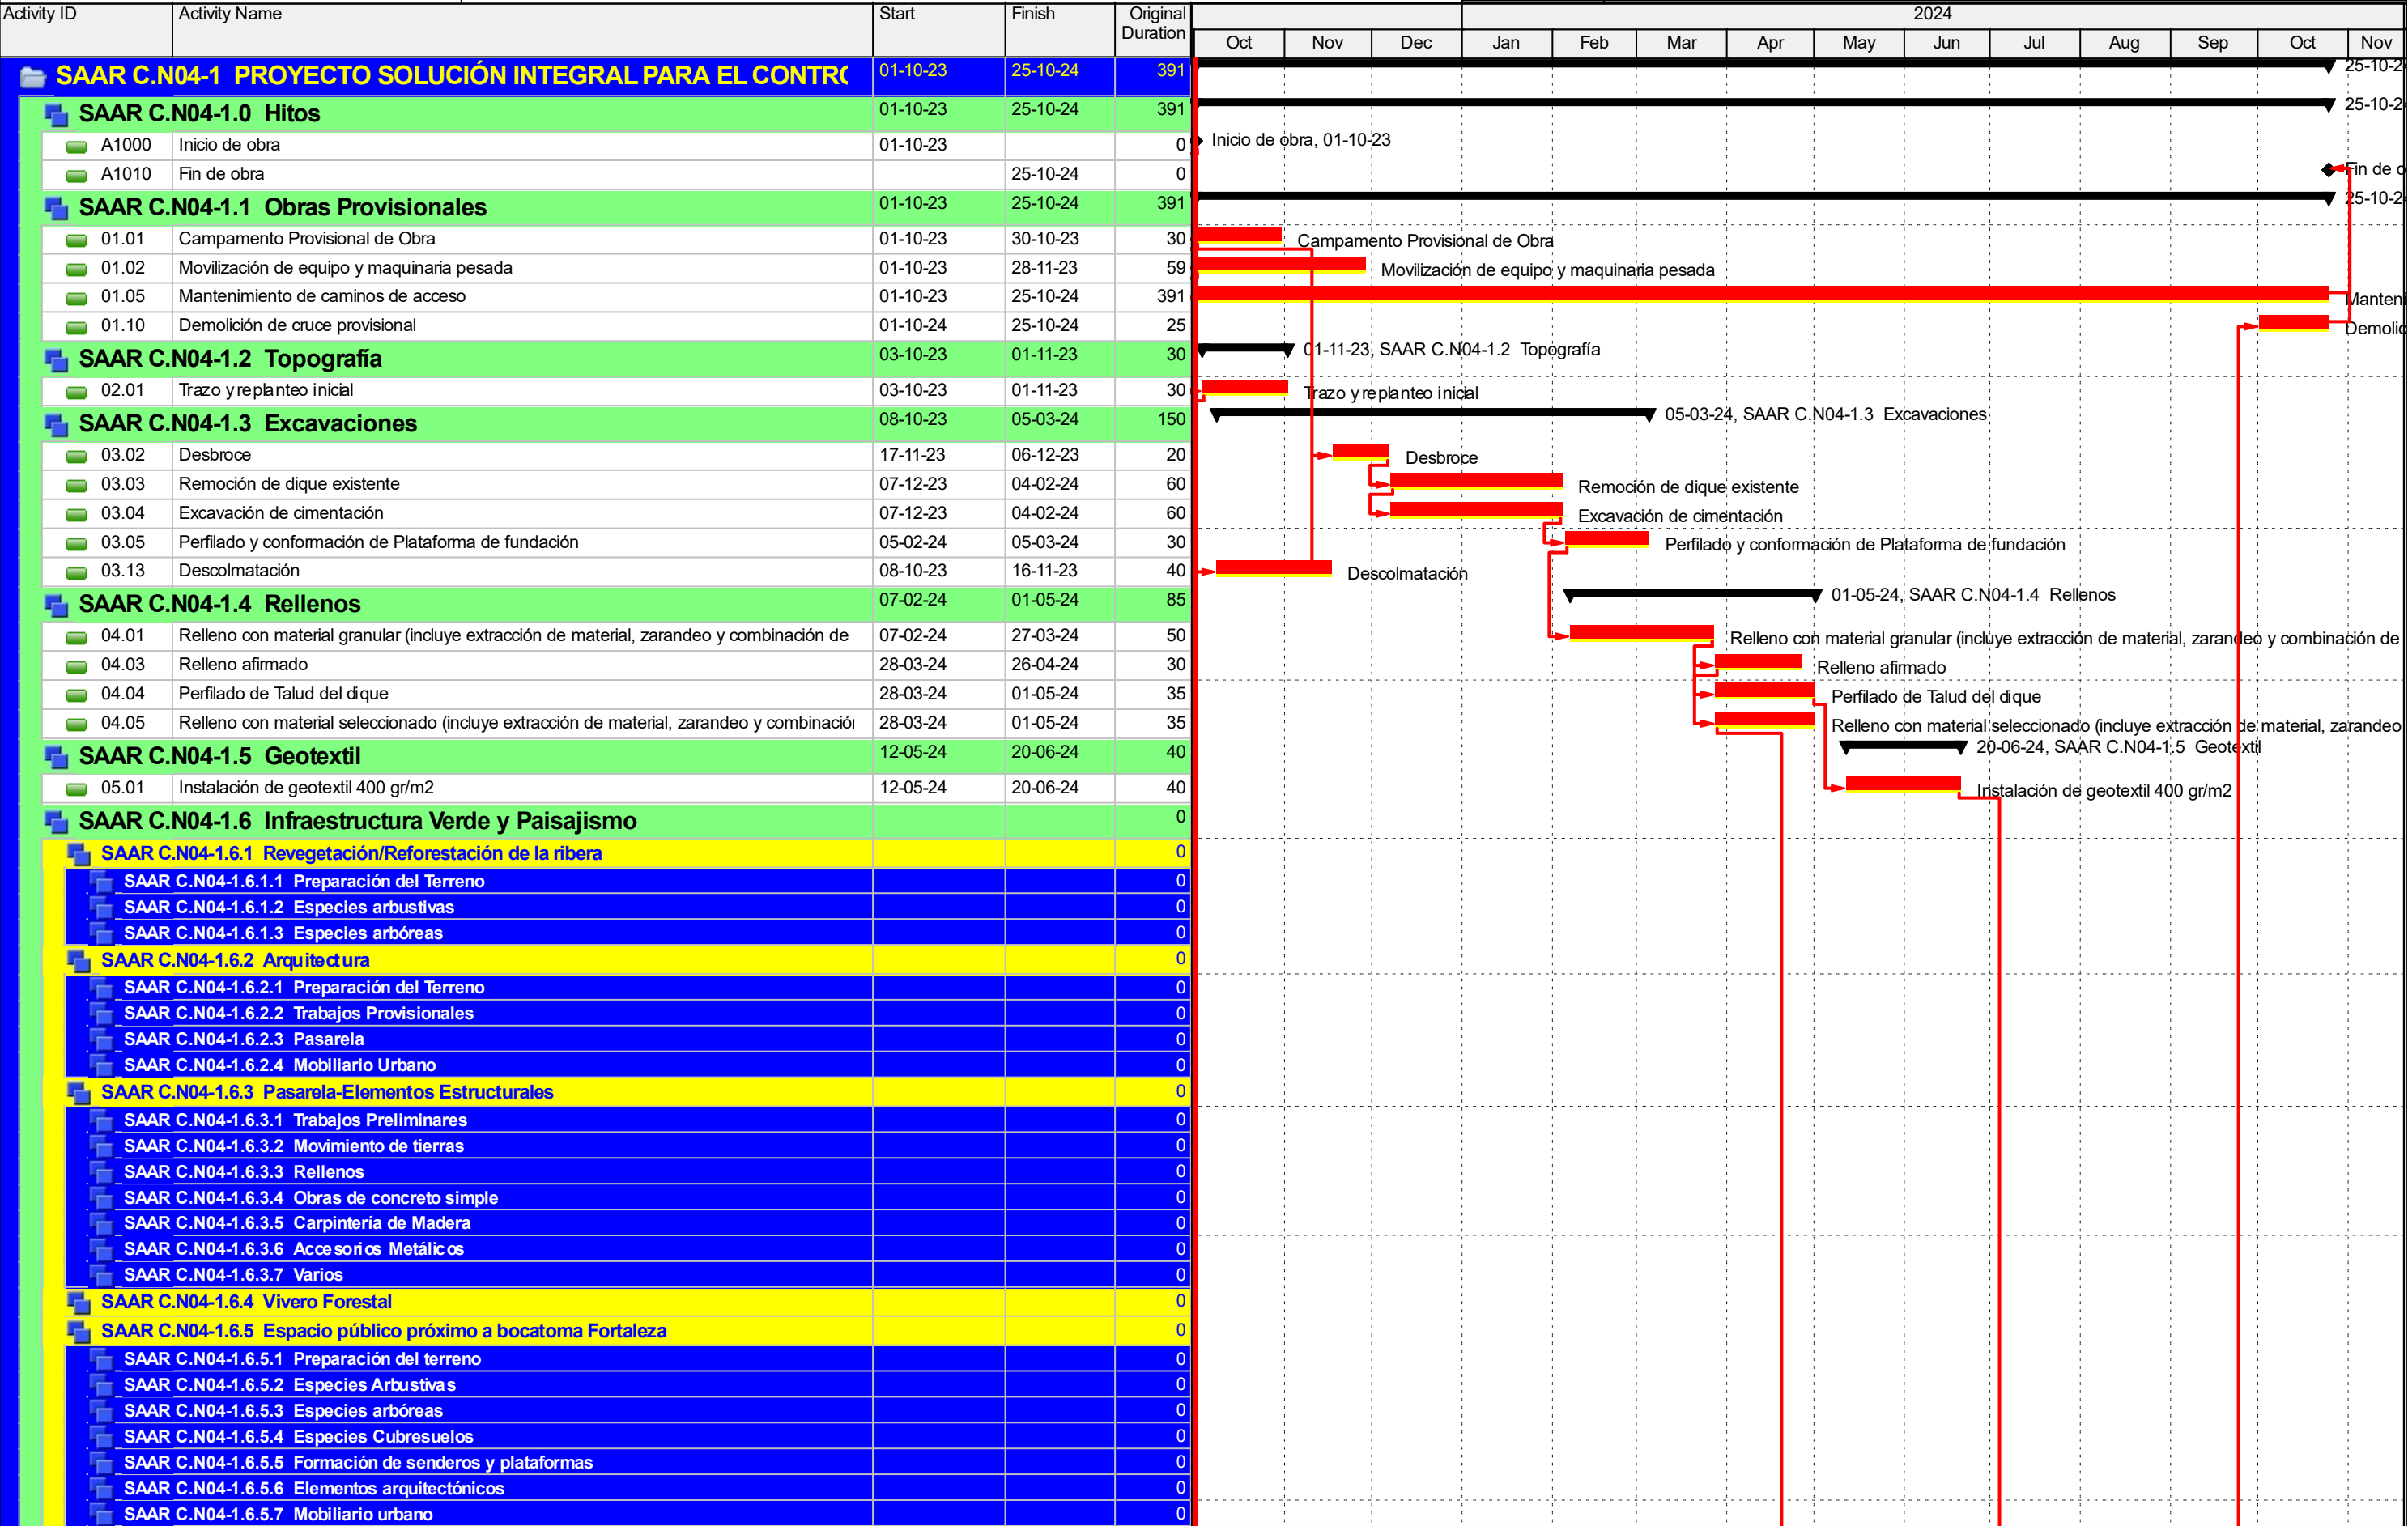

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration	2024											
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
	SAAR C.N04-1.6.5.8 Señalética Informativa			0												
	SAAR C.N04-1.6.5.9 Señalética Informativa-1			0												
	SAAR C.N04-1.7 Colocación de la roca	11-07-24	25-10-24	107												
07.02	Colocación de roca en uña	11-07-24	29-08-24	50												
07.03	Colocación de roca en Talud	18-07-24	05-09-24	50												
07.04	Extracción y seleccón de Rocas Reutilizables	18-07-24	05-09-24	50												
07.05	Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm	16-09-24	05-10-24	20												
07.06	Malla Gavión de 1m x 1m x 5m	06-10-24	25-10-24	20												
07.07	Enrocado talud enchachado con concreto	07-08-24	30-09-24	55												
	SAAR C.N04-1.8 Transportes			0												
	SAAR C.N04-1.9 Señalización			0												
	SAAR C.N04-1.10 Calidad			0												
	SAAR C.N04-1.11 Obras Civiles	27-04-24	02-09-24	129												
11.01	Trazo y replanteo de interferencia	27-04-24	03-05-24	7												
11.04	Limpieza de terreno manual	04-05-24	08-05-24	5												
11.05	Excavaciones no clasificadas para estructuras	09-05-24	13-05-24	5												
11.06	Excavación no clasificada de zanja	14-05-24	18-05-24	5												
11.10	Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)	19-05-24	28-05-24	10												
11.14	Encofrado y Desencofrado Caravista	28-06-24	17-07-24	20												
11.15	Encofrado y Desencofrado Cara Oculta	30-06-24	19-07-24	20												
11.16	Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2	29-05-24	27-06-24	30												
11.17	Emboquillado de piedra e=0.20m	20-07-24	18-08-24	30												
11.18	Emboquillado de piedra e=0.30m	04-08-24	02-09-24	30												
11.19	Emboquillado de piedra e=0.50m	04-08-24	02-09-24	30												
	SAAR C.N04-1.12 Accesos			0												
	SAAR C.N04-1.13 Medio Ambiente			0												
	SAAR C.N04-1.14 Muros			0												
	SAAR C.N04-1.15 Otros			0												
