400195 Cronograma del Proyecto (8 Semanas) al 31-12-23

ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización
	400195 Cronograma del Proyecto (8 Semanas) al 31-12-23	1554	11/06/21 A	15/08/26
	GENERALES	1554	11/06/21 A	15/08/26
	GESTIÓN	1554	11/06/21 A	15/08/26
	ACTIVIDADES GENERALES DE GESTIÓN	970	26/06/21 A	17/09/24
	CONTROL DE PROYECTOS	1554	11/06/21 A	15/08/26
	FECHAS CONTRACTUALES	793	12/06/21 A	29/01/24
	HITOS PREVISTOS	1035	01/03/23 A	15/08/26
	FECHAS CON ALTA PROBABILIDAD DE IMPACTO AL PROYECTO	397	16/02/22 A	08/06/23 A
	HITOS DE INICIO (CON PLAZOS DE PERMISOS ANTE LA ANA DE ACUERDO A LA NORMA)	1110	11/06/21 A	18/02/25
	HITOS DE INICIO (TENDENCIA)	591	01/03/23 A	18/02/25
	HITOS DE FINALIZACION	466	27/11/24	18/06/26
	HITOS FIN ETAPA RIBA	712	31/12/21 A	09/05/24
	GESTIÓN DE INTERESADOS	1053	20/08/21 A	17/02/25
	PROMA - CUI 2501802 - DEFENSAS RIBEREÑAS	394	20/08/21 A	12/12/22 A
	PROMA - CUI 2509655 - DIQUES TRANSVERSALES	893	20/08/21 A	07/08/24
	IGAPRO/GA - CUI 2501802 - DEFENSAS RIBEREÑAS	694	25/08/21 A	12/12/23 A
	IGAPRO/GA - CUI 2509655 - DIQUES TRANSVERSALES	947	25/08/21 A	16/10/24
	PERMISO DE FUENTES DE AGUA	656	05/10/22 A	10/12/24
	PERMISO DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	656	05/10/22 A	10/12/24
	ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	1026	22/09/21 A	17/02/25
	OTROS COSTOS DEL PROYECTO	600	27/03/23 A	25/03/25
	OTROS COSTOS DEL PROYECTO	600	27/03/23 A	25/03/25
	DISEÑO	904	11/08/21 A	10/08/24
	GESTIÓN GENERAL DEL DISEÑO	861	01/10/21 A	10/08/24
	BIM	861	01/10/21 A	10/08/24
	COORDINACIÓN ESPACIAL	875	11/08/21 A	04/07/24
	COORDINACIÓN ESPACIAL	875	11/08/21 A	04/07/24
	DISEÑO TÉCNICO	878	11/09/21 A	10/08/24
	DISEÑO TÉCNICO	878	11/09/21 A	10/08/24
	INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN	505	06/12/22 A	10/08/24
	PROCURA	1030	26/06/21 A	28/11/24
	DISEÑO	595	26/06/21 A	15/06/23 A
	CONTRATISTA	886	20/12/21 A	28/11/24
	CONTRATISTA GESTIÓN SOCIAL-ETAPA CONSTRUCCIÓN	305	31/01/23 A	05/02/24
	CONTRATISTA CANTERAS	167	14/10/22 A	03/05/23 A
	CONTRATISTA PAQUETE 1	738	20/12/21 A	30/05/24
	CONTRATISTA PAQUETE 2	769	05/05/22 A	23/11/24
	CONTRATISTA PAQUETE 3	749	02/06/22 A	28/11/24
	CONTRATISTA PAQUETE 4	428	05/01/23 A	05/06/24
	CONTRATISTA PAQUETE 5	420	24/01/23 A	15/06/24
	CONTRATISTA PAQUETE 6	656	18/04/22 A	19/06/24
	CONTRATISTA PAQUETE 7	265	16/04/22 A	28/02/23 A
	CONTRATISTA PAQUETE 8	625	18/04/22 A	13/05/24
	CONTRATISTA PAQUETE 9	630	18/04/22 A	18/05/24
	CONTRATISTA PAQUETE 10	87	13/07/24	28/10/24
	CONTRATISTA MONITOREO ARQUEOLÓGICO DURANTE LA EJECUCIÓN	245	02/05/22 A	20/02/23 A
	CONTRATISTA ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, AIRE Y RUIDO	163	23/01/23 A	07/08/23 A
	CONTRATISTA PERMISOLOGIA	366	15/12/22 A	29/02/24
	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	1487	12/06/21 A	18/04/26

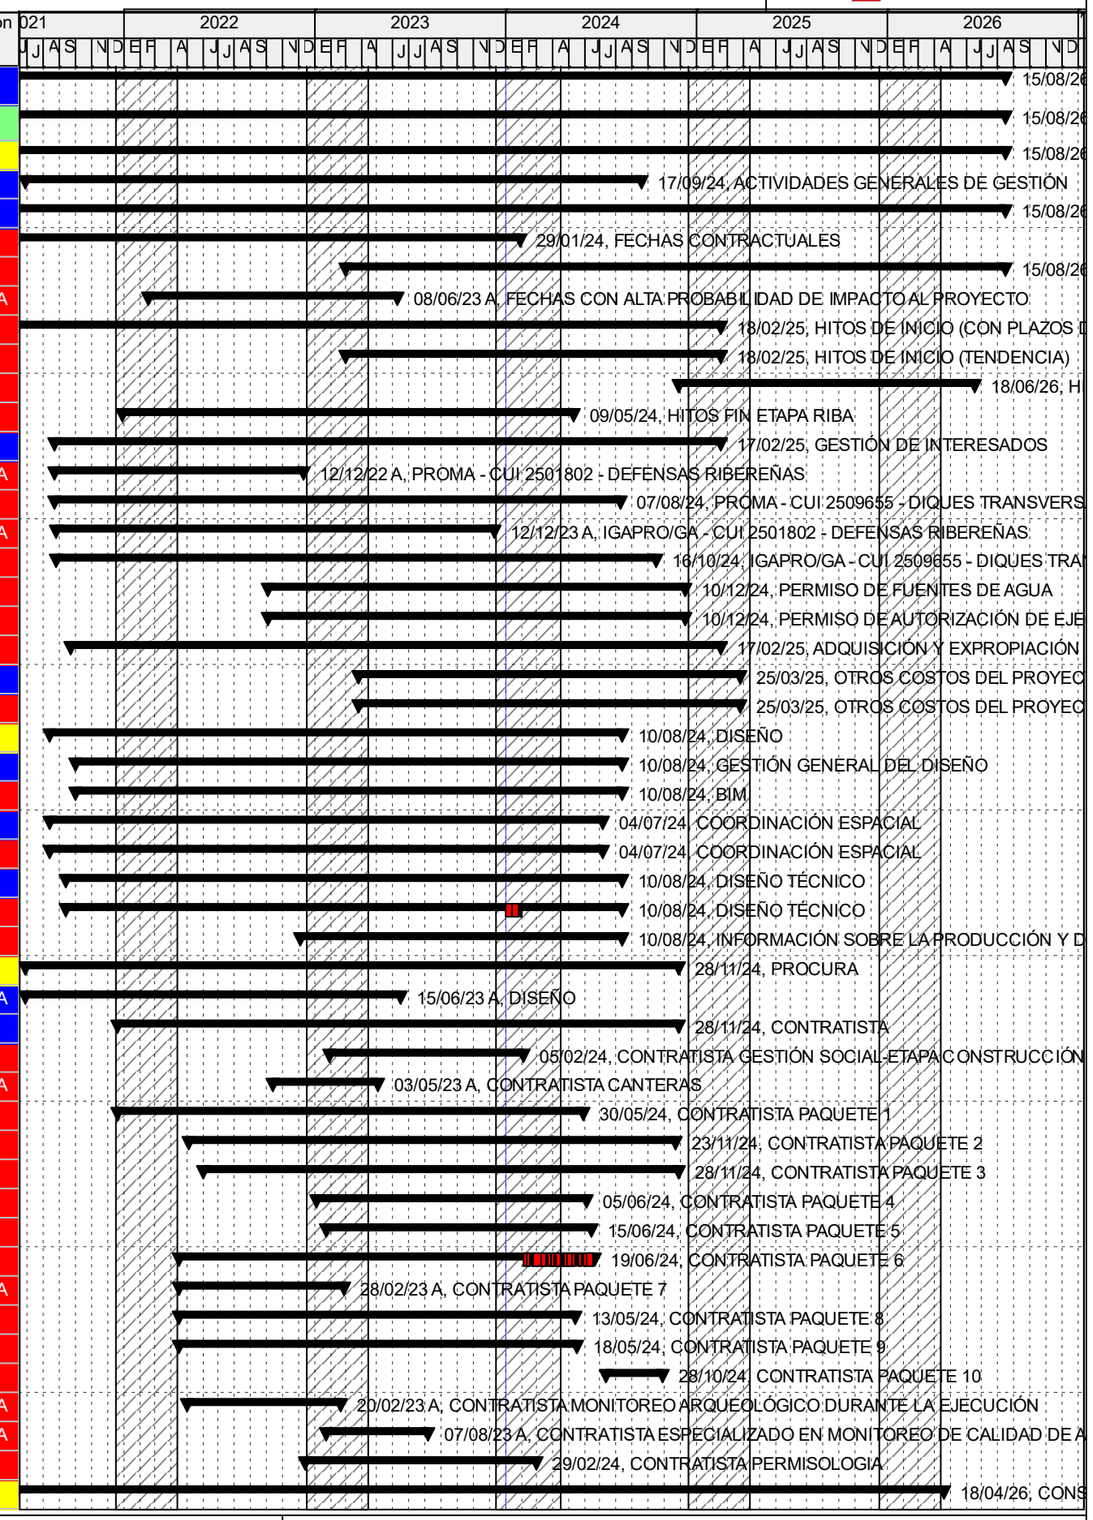

Actual Level of Effort | Remaining Work | Milestone
Actual Work | Critical Remaining Work | summary

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation

400195 Cronograma del Proyecto (8 Semanas) al 31-12-23

ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización
	PRELIMINARES	1487	12/06/21 A	18/04/26
	REQUERIMIENTOS	793	19/09/22 A	08/05/25
	COSTES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA	1487	12/06/21 A	18/04/26
	CIERRE	45	19/06/26	15/08/26
	GENERAL	45	19/06/26	15/08/26
	REPORTE FINAL	11	19/06/26	02/07/26
	ACTIVIDADES DESESTIMADAS	1006	04/04/22 A	09/08/25
	CUI 2501802 - DEFENSAS RIBEREÑAS	990	01/03/23 A	18/06/26
	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	990	01/03/23 A	18/06/26
	CONSTRUCCIÓN GENERAL	666	19/06/24	15/04/26
	GENERAL	666	19/06/24	15/04/26
	PAQUETES DE CONSTRUCCION	990	01/03/23 A	18/06/26
	PAQUETE 6	598	19/06/24	18/06/26
	PAQUETE 7	551	01/03/23 A	27/11/24
	PAQUETE 8	402	13/05/24	16/09/25
	PAQUETE 9	465	18/05/24	09/12/25
	PAQUETE 1C OPERADOR DE CANTERAS	525	03/05/23 A	13/01/25
	EN USO	70	10/04/26	18/06/26
	CAPACITACIONES	70	10/04/26	18/06/26
	CUI 2509655 - DIQUES TRANSVERSALES	554	30/05/24	08/04/26
	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	554	30/05/24	08/04/26
	CONSTRUCCIÓN GENERAL	486	30/05/24	27/09/25
	GENERAL	486	30/05/24	27/09/25
	PAQUETES DE CONSTRUCCION	554	30/05/24	08/04/26
	PAQUETE 01 - QDAS. LEÓN (OSO)	421	30/05/24	24/07/25
	PAQUETE 02 - QDAS. PAMPA HERMOSA 1 Y 2 + QDAS. QUIRRIPANO 1 Y 2 & Diques de Retención	421	12/02/25	08/04/26
	PAQUETE 03 - QDAS. SANTANERO 1 Y 2, Diques de Retención	389	18/02/25	13/03/26
	PAQUETE 04 - QDAS. ALTO PERÚ 1 Y 2, Diques de Retención	420	29/08/24	22/10/25
	PAQUETE 05 - QDAS. ASCOPE 1, 2 Y 3: Diques de Retención	420	27/09/24	20/11/25
	PAQUETE 10 - QDAS. ALUVIÓN	293	29/01/25	22/01/26
	EN USO	67	01/02/26	08/04/26
	CAPACITACIONES	67	01/02/26	08/04/26

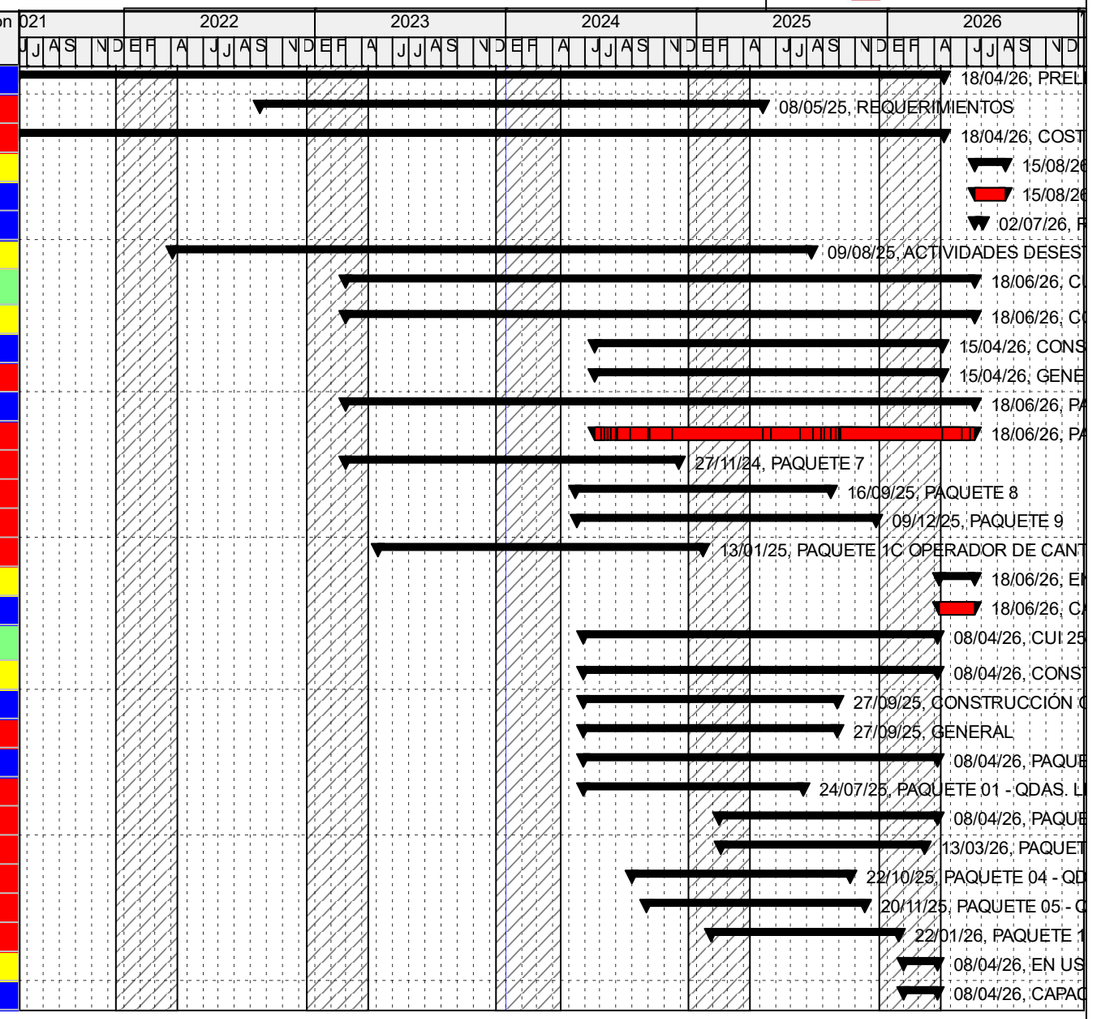

Actual Level of Effort | Remaining Work | Milestone
Actual Work | Critical Remaining Work | summary

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation
