saceem

PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA

Ruta Crítica

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Budgeted Nonlabor Units	Budgeted Labor Cost
400197 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA		196	15-Nov-24	29-May-25	49881.51	S/.7,556,208.48
C.00.00.01	Kick off Meeting (KOM)	0	15-Nov-24		0.00	S/.0.00
400197.501 DEFENSAS RIBEREÑAS		180	1-Dec-24	29-May-25	49881.51	S/.7,556,208.48
400197.501.C CONSTRUCCIÓN		180	1-Dec-24	29-May-25	49881.51	S/.7,556,208.48
400197.501.C.00 GENERAL		180	1-Dec-24	29-May-25	0.00	S/.0.00
400197.501.C.00.00 GENERAL		180	1-Dec-24	29-May-25	0.00	S/.0.00
C.00.00.02	Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio	0	1-Dec-24		0.00	S/.0.00
C.00.00.05	Fin de plazo contractual - Culminación de obras	0		29-May-25	0.00	S/.0.00
400197.501.C.70 OBRAS EXTERIORES		180	1-Dec-24	29-May-25	49881.51	S/.7,556,208.48
400197.501.C.70.00 GENERAL		180	1-Dec-24	29-May-25	0.00	S/.0.00
C.70.00.10	Inicio del Proyecto	0	1-Dec-24		0.00	S/.0.00
C.70.00.20	Fin del Proyecto	0		29-May-25	0.00	S/.0.00
400197.501.C.70.01 PREPARACIÓN DE SITIO		5	1-Dec-24	5-Dec-24	46.48	S/.437,278.28
C.70.01.01	Obras provisionales	5	1-Dec-24	5-Dec-24	46.48	S/.437,278.28
400197.501.C.70.10 CUERPOS DE TERRAPLÉN		175	6-Dec-24	29-May-25	49835.03	S/.7,118,930.20
400197.501.C.70.10.01 MARGEN DERECHO		51	6-Dec-24	25-Jan-25	7533.59	S/.1,104,062.73
400197.501.C.70.10.01.01 TERRAPLÉN A3-D-01		33	6-Dec-24	7-Jan-25	6595.11	S/.931,985.52
C.70.10.01.01.10	Descolmatación (C1) - 1er Tramo	12	6-Dec-24	17-Dec-24	1193.70	S/.248,212.68
C.70.10.01.01.20	Excavación (C1) - 1er Tramo	4	16-Dec-24	19-Dec-24	252.35	S/.36,848.21
C.70.10.01.01.30	Relleno de Cuerpo (C1) - 1er Tramo	11	20-Dec-24	30-Dec-24	189.32	S/.28,489.29
C.70.10.01.01.40	Relleno de Corona (C1) - 1er Tramo	7	25-Dec-24	31-Dec-24	2406.06	S/.299,624.39
C.70.10.01.01.50	Excavación de Uña (C1) - 1er Tramo	2	1-Jan-25	2-Jan-25	2242.73	S/.261,796.03
C.70.10.01.01.60	Geotextil (C1) -1er Tramo	6	2-Jan-25	7-Jan-25	310.95	S/.57,014.92
400197.501.C.70.10.01.02 TERRAPLÉN A3-D-02		18	8-Jan-25	25-Jan-25	938.48	S/.172,077.21
400197.501.C.70.10.01.02.01 Tramo 01		1	8-Jan-25	8-Jan-25	67.03	S/.12,291.23
C.70.10.01.02.01.60	Geotextil (C1) -1er Tramo	1	8-Jan-25	8-Jan-25	67.03	S/.12,291.23
400197.501.C.70.10.01.02.03 Tramo 03		17	9-Jan-25	25-Jan-25	871.45	S/.159,785.98
C.70.10.01.02.03.60	Geotextil (C2) -3er Tramo	17	9-Jan-25	25-Jan-25	871.45	S/.159,785.98
400197.501.C.70.10.02 MARGEN IZQUIERDO		124	26-Jan-25	29-May-25	42301.44	S/.6,014,867.47
400197.501.C.70.10.02.01 TERRAPLÉN A3-I-01		24	26-Jan-25	18-Feb-25	3958.64	S/.803,087.22
C.70.10.02.01.10	Descolmatación (C1) - 1er Tramo	20	26-Jan-25	14-Feb-25	3684.55	S/.765,612.85
C.70.10.02.01.20	Excavación (C1) - 1er Tramo	16	3-Feb-25	18-Feb-25	274.09	S/.37,474.37
400197.501.C.70.10.02.02 TERRAPLÉN A3-I-02		15	15-Feb-25	1-Mar-25	2158.53	S/.424,651.22
C.70.10.02.02.10	Descolmatación (C1) - 2do Tramo	12	15-Feb-25	26-Feb-25	1809.51	S/.377,230.23
C.70.10.02.02.20	Excavación (C1) - 2do Tramo	11	19-Feb-25	1-Mar-25	349.02	S/.47,420.99
400197.501.C.70.10.02.03 TERRAPLÉN A3-I-03		113	6-Feb-25	29-May-25	36184.27	S/.4,787,129.03
400197.501.C.70.10.02.03.02 Tramo 04		113	6-Feb-25	29-May-25	36184.27	S/.4,787,129.03
C.70.10.02.03.02.10	Descolmatación (C1) - 4to Tramo	32	6-Feb-25	9-Mar-25	3607.05	S/.750,784.88
C.70.10.02.03.02.20	Excavación (C1) - 4to Tramo	25	19-Feb-25	15-Mar-25	900.80	S/.127,543.26
C.70.10.02.03.02.30	Relleno de Cuerpo (C1) - 4to Tramo	30	2-Mar-25	31-Mar-25	792.66	S/.115,547.12
C.70.10.02.03.02.40	Relleno de Corona (C1) - 4to Tramo	22	11-Mar-25	1-Apr-25	7087.86	S/.874,576.41
C.70.10.02.03.02.50	Excavación de Uña (C1) - 4to Tramo	18	25-Mar-25	11-Apr-25	6816.47	S/.799,873.83
C.70.10.02.03.02.60	Geotextil (C1) -4to Tramo	18	26-Mar-25	12-Apr-25	997.48	S/.182,896.20
C.70.10.02.03.02.70	Enrocado de Uña (C1) - 4to Tramo	50	28-Mar-25	16-May-25	7702.62	S/.916,973.32
C.70.10.02.03.02.80	Enrocado de Talud (C1) - 4to Tramo	61	30-Mar-25	29-May-25	8279.32	S/.1,018,934.01

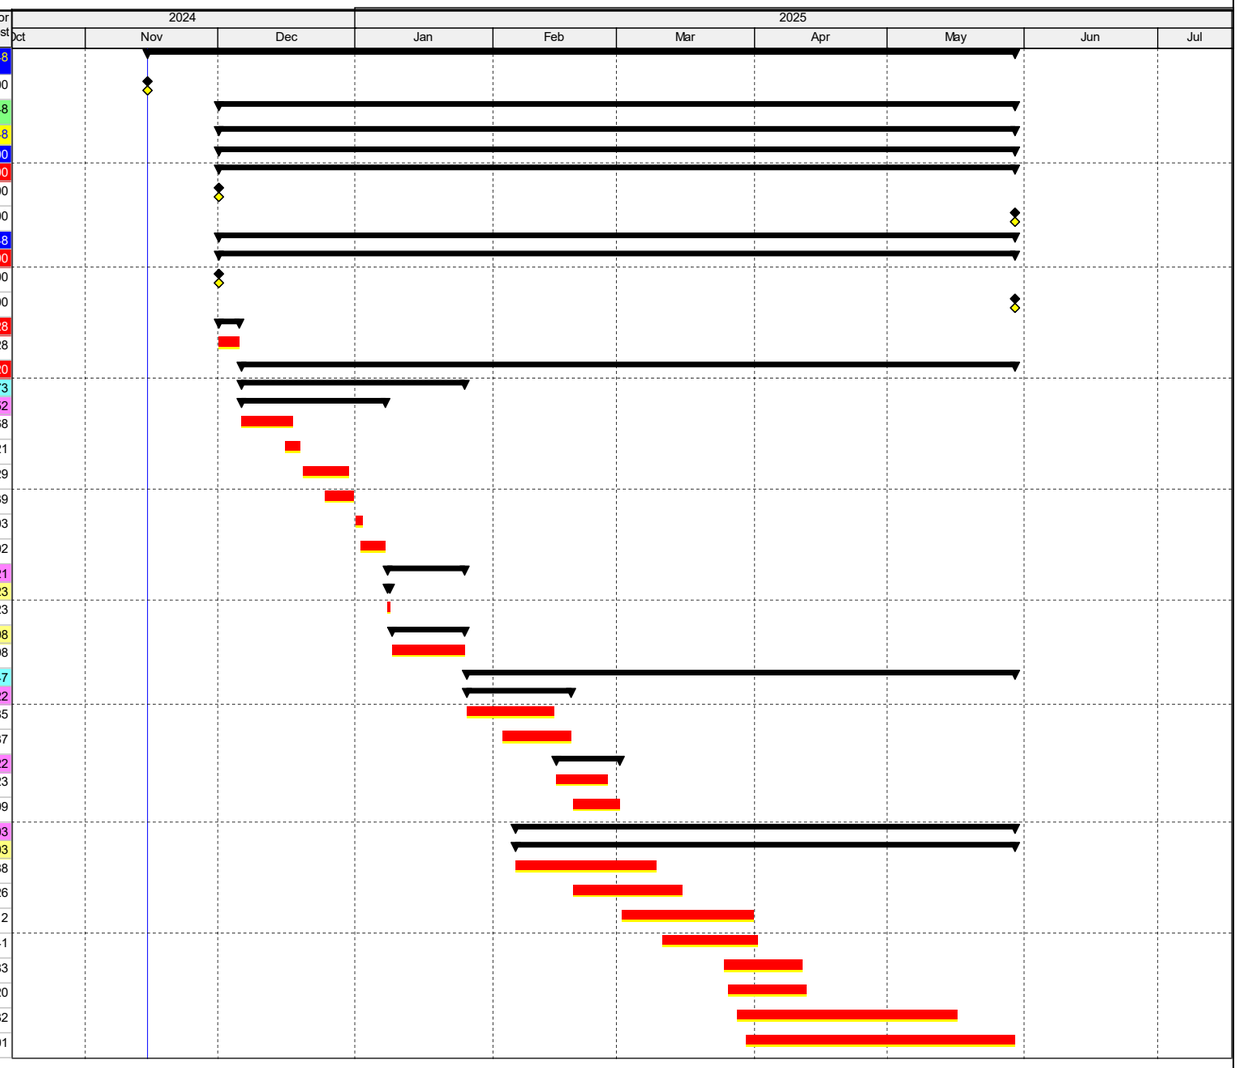

Remaining Level of Effort
Actual Level of Effort
Primary Baseline
Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining ...

TASK filter: Critical.

© Oracle Corporation
