

RECOMENDACIONES

Antes de empezar



Revise los Términos de Referencia del Proceso.




No comparta el link de acceso a Microsoft Teams



Al ingresar



Identifíquese en Teams:
Nombre, apellido y empresa



Mantenga su cámara desactivada



Mantenga su micrófono desactivado



Durante



Q&A: Haga las **preguntas** vía chat. Las **respuestas** se desarrollarán al final.

PROYECTO

DEFENSAS RIBEREÑAS – RIO LACRAMARCA

REUNION ACLARATORIA

PROCESO DE LICITACIÓN:

- **P129.1 SUMINISTRO DE ROCA PUESTO EN ACOPIO PARA LOS SP A2-1 Y A2-2.**
- **P129.2 SUMINISTRO DE PEDRAPLEN P129.2 SUMINISTRO DE PEDRAPLEN PUESTO EN ACOPIO PARA EL SP A2-1**



20 de Enero



17:00 p.m.

Organiza: Área de Adquisiciones de OHSLA

- ❑ Proyecto : “Entrega de las Defensas Ribereñas del Rio Lacramarca”
- ❑ Contratante : Autoridad Nacional de Infraestructura- ANIN
- ❑ Contratista : Obrascón Huarte Laín S.A. Sucursal Perú - OHLa
- ❑ Sistema de Contratación : Acuerdo de Gobierno a Gobierno entre Reino Unido – Perú.
- ❑ Modalidad : Contrato de Ingeniería y Construcción NEC 3



Acuerdo de Gobierno a Gobierno
para la Reconstrucción con Cambios

“Entrega de las Defensas Ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”

PROCURA OHLA

CALENDARIO DE LICITACIÓN

Ítem	Actividad	Responsable	Fecha
0	Comunicación a la ANIN para inicio de nuevos procesos	OHLA	11/12/2024
1	Publicación del proceso en la página web y difusión	OHLA	19/12/2024
2	Inscripción de postores mediante Portal Web	SUBCONTRATISTA	HASTA EL 08/01/2025
3	Precalificación de subcontratistas inscritos	OHLA	10/01/2025
4	Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas propuestos	OHLA	12/01/2025
5	Aceptación de la lista final de subcontratistas sugeridos	ANIN	15/01/2025
6	Invitación a subcontratistas calificados	OHLA	16/01/2025
7	Elaboración de Consultas	SUBCONTRATISTA	20/01/2025
8	Absolución de consultas	OHLA	21/01/2025
9	Presentación de Ofertas	SUBCONTRATISTA	23/01/2025
10	Apertura del Tenderbill y evaluación de propuestas	OHLA	24/01/2025
11	Negociación postores	OHLA	25/01/2025
12	Presentación de propuestas finales	SUBCONTRATISTAS	26/01/2025
13	Apertura y evaluación de propuestas	OHLA	27/01/2025
14	Envío de LOR para aceptación del Gerente del proyecto	OHLA	28/01/2025
15	Respuesta a la LOR EN Rev.00	ANIN	29/01/2025
16	Comunicación de Resultados	OHLA	30/01/2025
17	Inicio de Servicio	Subcontratista adjudicado	Según el KOM

ANIN

*Para asegurar que todo el proceso de licitación se realice de manera justa y transparente, en los plazos establecidos y cumpliendo todos los procedimientos establecidos se ha implementado una portal con una herramienta de gestión de adquisiciones e-procurement llamada “Tenderbill”

CONSTRUCCIÓN OHLA

SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB PROYECTO A2-1 Y A2-2 PUESTO EN ACOPIO

Suministrar roca, hacia puntos de acopio asignados, los cuales servirán para los trabajos de construcción de diques del proyecto.

El subcontratista será responsable de considerar todas las acciones o actividades propias y necesarias para el proceso y cumplimiento del suministro.



Codigo	Descripción	Und	Duración Cronograma	Inicio	Fin							
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA			120	1/01/2025	30/04/2025							
01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA					1-Ene-25	16-Ene-25	31-Ene-25	15-Feb-25	2-Mar-25	17-Mar-25	1-Abr-25
01.01	ROCA EN DIQUES											
01.01.01	SUBPROYECTO A3		90	1/01/2025	30/04/2025							
01.01.01.01	DIQUE A3-D-01	m3	17	1/01/2025	17/01/2025							
01.01.01.02	DIQUE A3-D-02	m3	109	18/01/2025	30/04/2025							
01.01.01.03	DIQUE A3-I-01	m3	17	1/01/2025	17/01/2025							
01.01.01.04	DIQUE A3-I-02	m3	20	18/01/2025	6/02/2025							
01.01.01.05	DIQUE A3-I-03	m3	83	7/02/2025	30/04/2025							

SUMINISTRO DE PEDRAPLÉN PUESTO EN ACOPIO, PARA PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE, SUBPROYECTO A2 TRAMO 1

Suministrar material de pedraplén, hacia puntos de acopio asignados en el Subproyecto A2-1, los cuales servirán para los trabajos de preparación de Fundación de cuerpo de diques en el Subproyecto A2-1.

El Subcontratista será responsable de considerar todas las acciones o actividades propias y necesarias para el proceso y cumplimiento del suministro.



UBICACIÓN	VOL	ESTE	NORTE
ACOPIO KM 5	20,000	769249.00 m E	8993865.00 m S
ACOPIO KM 6	20,000	769010.00 m E	8994624.00 m S



Código	Descripción	Und	Metrado	Duración Cronograma	Inicio	Fin	1-Ene-25	8-Ene-25	15-Ene-25	22-Ene-25	29-Ene-25	5-Feb-25	12-Feb-25	19-Feb-25	26-Feb-25	5-Mar-25	12-Mar-25	19-Mar-25	26-Mar-25	2-Abr-25
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA				90	1/01/2025	31/03/2025														
01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA																			
01.01	SUBPROYECTO A2-T1																			
01.01.01	ROCA EN PEDRAPLEN			90	1/01/2025	31/03/2025														
01.01.01.01	PEDRAPLEN e=0.60m MAX 16"	m3	34,800.00	90	1/01/2025	31/03/2025														
01.01.01.02	PEDRAPLEN e=0.30m MAX 6"	m3	5,200.00	90	1/01/2025	31/03/2025														


Descripción	Und		Del 1/01 al 7/01	Del 8/01 al 14/01	Del 15/01 al 21/01	Del 22/01 al 28/01	Del 29/01 al 04/02	Del 05/02 al 11/02	Del 12/02 al 18/02	Del 19/02 al 25/02	Del 26/02 al 04/03	Del 05/03 al 11/03	Del 12/03 al 18/03	Del 19/03 al 25/03	Del 26/03 al 31/03
PEDRAPLEN e=0.60m MAX 16"	m3	PARCIAL	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,710 m3	2,280 m3
	m3	ACUMULADO	2,710 m3	5,420 m3	8,130 m3	10,840 m3	13,550 m3	16,260 m3	18,970 m3	21,680 m3	24,390 m3	27,100 m3	29,810 m3	32,520 m3	34,800 m3
PEDRAPLEN e=0.30m MAX 6"	m3	PARCIAL	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	404 m3	352 m3
	m3	ACUMULADO	404 m3	808 m3	1,212 m3	1,616 m3	2,020 m3	2,424 m3	2,828 m3	3,232 m3	3,636 m3	4,040 m3	4,444 m3	4,848 m3	5,200 m3

PERMISOS OHLA

El artículo 4 del T.U.O. de la Ley General de Minería aprobado mediante D.S. N° 014-92-EM, prescribe lo siguiente: “Los productos minerales comprados a personas autorizadas para disponer de ellos, no son reivindicables. **La compra hecha a persona no autorizada, sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente. El comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales”.**

Por tanto, es necesario la presentación de los siguientes documentos:

- ✓ Resolución de otorgamiento de concesión minera, emitida por el INGEMMET, con estado vigente.
- ✓ Copia Literal actualizada de la concesión minera, acreditando titularidad de Concesión o contrato con el titular de la concesión, debidamente inscrito.
- ✓ Acreditación del pago de derecho de vigencia del derecho minero.
- ✓ Resolución de inscripción del minero informal en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO y/o Resolución de Formalización Minera con estado vigente y/o Resolución de inicio y/o reinicio de actividades mineras de explotación del minero formal.
- ✓ Instrumento de gestión ambiental IGAFOM o DIA (Declaración de Impacto Ambiental) y su resolución de aprobación.
- ✓ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie – CIRA y/o PMA (Plan de Monitoreo Arqueológico) y su resolución de aprobación.
- ✓ Título habilitante o acreditación de propiedad mediante la copia literal del predio o contrato de arrendamiento del terreno superficial.

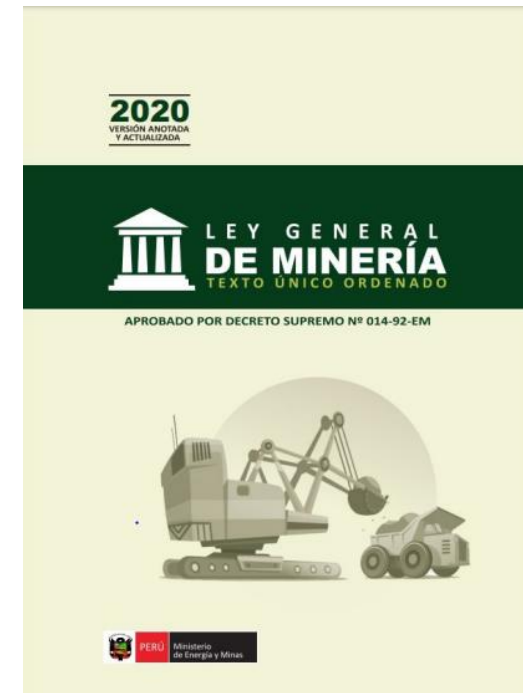

HSE OHLA

Documentación SSO

1	Señalización en la zona de acceso y de acopio - Señalización de SST (NTP 399.010), y de Seguridad Vial(Manual del MTC)
2	Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
3	Programa Anual de Capacitaciones
4	Programa Mensual de Charlas, Capacitaciones y Sensibilización (Envío mensual).
5	Programa Anual de Simulacros
6	Plan de Respuesta Ante Emergencias
7	Plan de gestión de tráfico
8	Mapa de Riesgos

Documentación SSO

9	Procedimientos e Instructivos
10	Matriz IPERC Base
11	Documentos de vehículos y equipos según lineamiento de seguridad
11	Plan de Salud Ocupacional
12	Programas de Prevención y Protección – Anexos al Plan de Salud Ocupacional
13	Matriz de Factores de Riesgo Ocupacional
14	Programa de monitoreo de agentes ocupacionales: Físico, Químico, Psicosociales, Biológico y Ergonómico
15	Matriz de Seguimiento de Evaluación de Requisitos legales aplicables
16	Informes semanales y mensuales del cumplimiento de la gestión SSOMA.

- ❑ Implementación de controles críticos: Vigías, muros de seguridad, plataformas de descarga, cuadradores de volquetes, señalización en accesos, condiciones de seguridad de accesos, etc.
- ❑ Verificación de implementos de seguridad en los equipos y vehículos.
- ❑ Uso de EPPs.
- ❑ Controles de ingeniería para operación de vehículos y equipos.
- ❑ Interacción hombre-máquina.

SUBCONTRATOS OHLA

SUMINISTRO DE PEDRAPLÉN PUESTO EN ACOPIO, PARA PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE, SUBPROYECTO A2 TRAMO 1

- ☐ Modalidad de contratación será de precios unitarios, bajo el modelo del contrato de suministro de OHLa con valorizaciones presentadas mensualmente y pagadas a los 30 días de presentada su valorización.
- ☐ Emitir carta fianza de fiel cumplimiento del 10% (monto contractual incluido IGV)
- ☐ Emitir carta fianza de adelanto. Adelanto podrá ser solicitado hasta por el 10% del monto contractual incluido IGV.
- ☐ La Subcontratista es responsable de obtener y mantener vigentes, todos los permisos necesarios y Suficientes de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de las entidades competentes, y se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y autorizaciones, siendo absoluto responsable por cualquier afectación, inobservancia o incumplimiento que los contravengan y que ameriten la imposición de sanciones o multas por el inicio de procesos administrativos, penales o judiciales.
- ☐ Ante el incumplimiento por parte de la Subcontratista:
 - OHLa aplicará una penalidad del 1% (uno por ciento) de la valorización proyectada mensual por cada día de retraso.
 - OHLa aplica una penalidad del 2% (dos por ciento) de la valorización proyectada mensual, por cada vez que el suministro no cumpla con las especificaciones técnicas detallada en el (Anexo IV) pactadas con OHLa.
- ☐ El subcontratista es responsable del cumplimiento de la calidad de material así como de los puntos de acopio.

MEDIO AMBIENTE

Informe mensual de medio ambiente:

Este documento deberá contener, como mínimo, con la siguiente información:

1. Formación referida a las emergencias ambientales (derrames)
2. Inspecciones ambientales de los kits
3. Registros de simulacro
4. Informe de incidentes ambientales
5. Reporte de Generación de residuos sólidos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GRACIAS
