
B2. Organigrama y Personal Clave

ÍNDICE

B2	**Organigrama de Obra y Personal Clave**
	Organigrama de Obra.
	Personal Clave.
	Residente de obra.
	Jefe de Topografía.
	Jefe de Oficina Técnica.
	Responsable de SSOMA.
	Responsable de Calidad.
	Relacionista Comunitario.

Organigrama de Obra

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1 PARTE - CUENCA CAÑETE

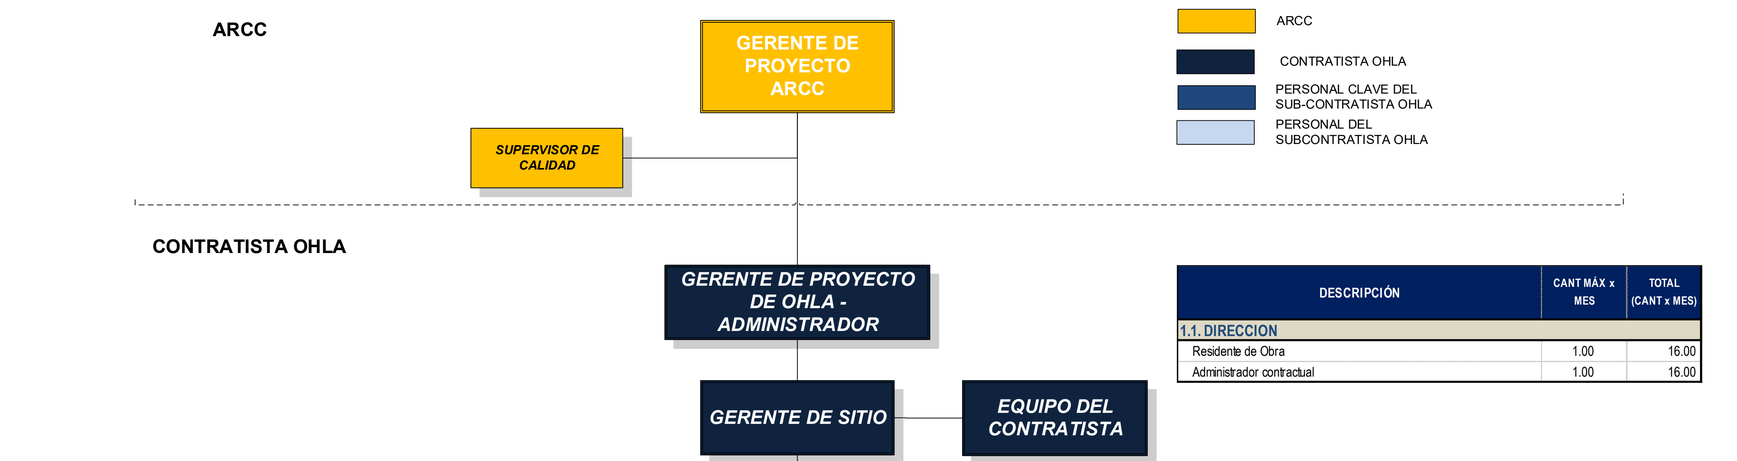

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.1. DIRECCION		
Residente de Obra	1.00	16.00
Administrador contractual	1.00	16.00

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE		
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad)	1.00	16.00
Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvo	1.00	1.00
Supervisor SSO - Frente 1	2.00	30.00
Supervisor SSO - Frente 2	2.00	21.00
Supervisor SSO - Obras civiles	1.00	14.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales	1.00	11.00
Capacitadores / SBC	1.00	16.00
Especialista de medio Ambiente	1.00	16.00
Supervisor de medio ambiente	1.00	15.00
Medico Ocupacional	1.00	16.00
Enfermero ocupacional	1.00	15.00

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.4. CALIDAD		
Responsable de Calidad	1.00	16.00
Supervisor de Control de Calidad	2.00	25.00
Técnico de campo	3.00	40.00
Asistente de campo	3.00	40.00
Jefe de Laboratorio de suelos	1.00	15.00
Técnico de laboratorio de suelos	1.00	15.00

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.6. GESTIÓN SOCIAL		
Asistente en asuntos sociales	1.00	16.00

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.3. OFICINA TÉCNICA		
Jefe de Oficina Técnica	1.00	16.00
Ingeniero de Oficina Técnica	1.00	16.00
Responsable de EDP	1.00	15.00
Responsable de SDC y ODC	1.00	15.00
Jefe de Topografía	1.00	16.00
Topografo	3.00	37.00
Auxiliar de Topografía	3.00	37.00
Dibujante Cadista	2.00	26.00
Ingeniero de Planeamiento y costos	1.00	15.00
Asistente de planeamiento y costos	0.00	0.00
Jefe de Ingeniería	1.00	15.00
Dibujante proyectista	1.00	15.00

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.5. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO		
Jefe de producción - Movimiento de Tierras	1.00	16.00
Jefe de producción - Obras civiles	0.00	0.00
Supervisor de Obra - Frente 1	1.00	16.00
Supervisor de Obra - Frente 2	1.00	11.00
Supervisor SSO - Obras civiles	1.00	15.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales	1.00	14.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento	0.00	0.00
Mecánicos	5.00	67.00
Ayudantes mecánicos	5.00	67.00

DESCRIPCIÓN	CANT MÁX x MES	TOTAL (CANT x MES)
1.7. ADMINISTRACIÓN		
Administrador de Obra	1.00	16.00
Comprador	1.00	16.00
Jefe de Recursos Humanos	1.00	16.00
Asistente de RRHH	1.00	15.00
Responsable de Servicios Generales	1.00	15.00
Asistente administrativo	1.00	15.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza	1.00	16.00
Encargado/Resp de Almacén	1.00	16.00
Auxiliar de Almacén	1.00	15.00

FRENTE1: DIQUES DE-PR-11D, DE-PR-17Bis-D, DE-PR-22-D

FRENTE2: DIQUES DE-PR-8-I; DE-PR-9-I; DE-PR-10-I; DE-PR-21-I; E-PR-24-A-I

Personal Clave

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo	Profesional	Años de Experiencia
Residente de Obra	Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca	Más de **7.19** años de Experiencia en obras en general y **5.17** años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Topografía	Edgar Cari Machaca	Más de **3.89** años de Experiencia en obras en general y **3.89** años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Oficina Técnica	José Raul Ingalupque Arapa	Más de **5.83** años de Experiencia en obras en general y **4.84** años de Experiencia en obras similares.
Responsable SSOMA	Chesster Agusto Muñoz Valdez	Más de **5.74** años de Experiencia en obras general y **5.74** años de Experiencia en obras similares.
Responsable de Calidad	Erik Javier Barzola Hinostroza	Más de **5.27** años de Experiencia en obras en general y **3.85** años de Experiencia en obras similares.
Relacionista Comunitario	Carlos Steve Banda Quintana	Mas de **5.18** años de Experiencia en obras general y **3.25** años de Experiencia en obras similares.

Residente de Obra

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RESIDENTE DE OBRA**
Nombre y Apellidos:	Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 54885
Experiencia General:	7.19 años
Experiencia Similar:	5.17 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción del Puente Daniel Alcides Carrión y acceso. **Actividades**: Obras de concreto armado, conformación de defensa ribereña, enrocado de protección, construcción de puente.	Ingeniero Residente	2/01/2005	19/04/2006	1.29
2	Construcción de Puente sobre el Río Mantaro, distritos de Chilca y Tres de Diciembre, de las Provincias de Huancayo y Chupaca del departamento de Junín (Puente Mantaro). **Actividades**: Defensa ribereña, enrocado de protección, obras de concreto armado, construcción de puentes.	Ingeniero Residente de Obra	13/04/2012	1/10/2013	1.47
3	Creación del Puente vehicular interregional Pampas, de las vías departamentales AY.105 y AP.105, en las localidades de Incachaca y Chacabamba, distritos de Saurama y Uranmarca, provincias de Vilscashuaman y Chincheros en los departamentos de Ayacucho y Apurimac. **Actividades**: Obras de concreto armado, enrocado de protección, conformación de defensa ribereña, construcción de puentes.	Residente de Obra	1/02/2021	30/06/2023	2.41
				Experiencia Total Similar	**5.17**

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombres	Wilfredo Santiago
Apellidos	Huayhua Huaraca
Nacionalidad	Peruano
Lugar de Nacimiento	Lima
Fecha de Nacimiento	21 Diciembre 1,966
Estado Civil	Casado
D.N.I.	08123359
Libreta Militar	2322082662
Grado de Instrucción	Superior
Dirección	Jr. Los Claveles Mz. D Lote 6 – Castillo Grande Tingo Maria – Huanuco.
Teléfono	924650779
Reg. CIP	54885
RUC	10081233590
IPSS	6612211HYHRW002
AFP	INTEGRA
CUSPP	**544601WHHYR4**

LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A 1 - Q08123359

ESTUDIOS REALIZADOS

Educación Primaria	C.E.P. Externado Santo Toribio 1,973 – 1,978
Educación Secundaria	C.E.P. Externado Santo Toribio 1,979 – 1,983
Estudios Superiores	Universidad Nacional de Ingeniería 1,985 – 1,991

SEMINARIOS DE ACTUALIZACION

CISMID X SIMPOSIO EN INGENIERIA SÍSMICA Y AVANCES EN LA INGENIERIA SISMO RESISTENTE (MAYO 1,997)

COMITÉ PERUANO DE MECANICA DE SUELOS, FUNDACIONES Y MECANICA DE ROCAS

SIMPOSIO SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO 98 (JUNIO 1998)

DI DISEÑO DE ESTRUCTURAS SAP 2000, INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN PERU, (NOV. 2,000)

III CONGRESO INTERNACIONAL INGENIERIA ESTRUCTURAL, SISMICA Y PUENTES (JULIO 2008). 20 horas.

APLICACIÓN DEL PREESFUERZO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (SETIEMBRE 2010) 15 HORAS

CURSO DE RESIDENTE DE OBRAS PRIVADAS. (MARZO 2012).20 HORAS
CURSO DE MS-PROYECT (JUNIO 2019). 24 HORAS
CONSTANCIA CAPACITACION EN MONTAJE, OPERACIÓN DE CAROS DE AVANCE CFT DOKA, EFECTUADO EN EL PUENTE PAMPAS.
JUNIO 2022

DIPLOMAS

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS. (MARZO 2012). 20 HORAS

DISEÑO DE PUENTES CON ASSHTO LRFD Y APLICACIÓN DEL MODULO BRIDGE DEL SAP 2000. (MARZO 2012). 20 horas.

LABOR QUE DESEMPEÑA

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION EN ARMONIA CON LOS ALCANCES TECNOLOGICOS Y RECURSOS APORTADOS POR LA EMPRESA O ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LA META U OBJETIVO ENCOMENDADO.

SOLUCION A COMPLEJOS PROBLEMAS DE INGENIERIA APLICANDO TECNICAS DE VANGUARDIA Y LA EXPERIENCIA PROPIA ADQUIRIDA DURANTE MAS DE 26 AÑOS EN LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES.

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CONSTRUCCION, DESARROLLANDO TECNICAS INNOVADORAS PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN DIVERSAS ETAPAS DE LA OBRA OPTIMIZANDO TIEMPOS DE EJECUCION Y RECURSOS DE LA OBRA.

FORMACION DE NUEVOS CUADROS A NIVEL DE TECNICOS CALIFICADOS PARA ALCANZAR METAS DE DESARROLLO LOCAL E INCREMENTAR O FORTALECER A LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO.

VERIFICA, Y DESARROLLA CADA ETAPA DE LA OBRA EN CUMPLIMIENTO A LA NORTATIVA TECNICA Y ADMINISTRATIVA APLICABLE, DENTRO DEL MARCO DEFINIDO POR EL EXPEDIENTE TECNICO, SOLICITANDO SI FUERE NECESARIO IMPLEMENTAR NUEVAS OBRAS NECESARIAS PARA ALCANZAR LAS METAS DEL PROYECTO.

EXPERIENCIA LABORAL

MTC – PROYECTO DE PUENTE ZONA HUALLAGA.

Cargo: Ing. Asistente.

1. Construcción Pte Pendencia.
   Tipo reticulado Sima L= 50.00mt dos tramos.
   Labor realizada: Sellado del Caisson Margen Derecho, construcción de estribo y Lanzamiento de Estructura Metálica (Sistema de apoyos intermedios).
   Lugar: Pendencia – Daniel Alomias Robles – Leoncio Prado - Huanuco
   Fecha: Agosto a Septiembre 1,992.

2. Estudios para la construcción del Nuevo Pte. Rancho.
   Tipo reticulado Sima L= 50.00 mt.
   Labor realizada: Evaluación de infraestructura, elaboración del Expediente Técnico para la construcción definitiva, anteproyecto del sistema de lanzamiento (Sistema de lanzamiento Nariz acoplado).
   Lugar: Rancho – Churubamba – Huanuco - Huanuco
   Fecha: Octubre a Diciembre 1,992.

3. Rehabilitación Pte Aguaytia.
   Tipo: Puente Colgante Americano, dos tramos reticulados y 33 tramos de viaducto L= 702.00 mt.
   Labor Realizada: Reforzamiento de Estructura Metálica, Cambio de tuercas y reforzamiento de pernos de anclaje, mantenimiento del Tramo colgante y dos tramos de estructura reticulada.
   Lugar: Aguaytia – Padre Abad – Ucayali.
   Fecha: Enero a Julio 1,993.

4. Rehabilitación Pte Cayumba.
   Tipo: Arco tri articulado de concreto armado, 1 tramo de Pte. mixto losa de concreto y vigas metálicas. L= 67.00 mt
   Labor Realizada: Defensa ribereña y Calzadura del arranque en ambas márgenes.
   Lugar: Cayumba–Mariano Dámaso Beraun–Leoncio Prado–Huanuco.
   Fecha: Agosto a Octubre 1,993.

5. Construcción del Pte Huanchal.
   Tipo mixto Vigas de acero y losa de concreto armado, L= 15.50 mt.
   Labor Realizada: Fabricación de Vigas metálicas, montaje y lanzamiento con sistema de apoyo intermedio.

Lugar: Huanchal – Huariaca – Pasco - Pasco
Fecha: Noviembre a Diciembre 1,993.

6. Rehabilitación del Pte Tocache.
   Tipo Colgante Wagner Biro L= 220.00 mt.
   Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento de estructura metálica.
   Lugar: Tocache – Tocache – San Martín.
   Fecha: Enero a Marzo 1,994.

7. Rehabilitación del Pte Punta Arenas.
   Tipo Colgante Wagner Biro L = 220. mt. y Reticulado Sima L= 50. mt.
   Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento de estructura metálica.
   Lugar: Punta Arenas – Campanilla – Mariscal Cáceres - San Martín.
   Fecha: Abril a Junio 1,994.

CARGO: Ing. Residente Obra.

8. Rehabilitación Pte Corpac.
   Tipo Colgante L =102.00 mt.
   Labor Realizada: Reparación de péndola central descolgada, Mantenimiento, reforzamiento de la estructura metálica.
   Lugar: Tingo Maria – Leoncio Prado – Huanuco.
   Fecha: Julio a Diciembre 1,994.

9. Rehabilitación Pte Aguaytia.
   Tipo: Puente Colgante Americano, dos tramos reticulados y 33 tramos de viaducto L= 702.00 mt.
   Labor Realizada : Reparación de Juntas de dilatación en la zona del viaducto.
   Lugar: Aguaytia – Padre Abad – Ucayali.
   Fecha : Enero a Marzo 1,995.

10. Rehabilitación del Pte Palcazu.
    Tipo Colgante Wagner Biro L= 180.00 mt.
    Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento estructura metálica.
    Lugar : Palcazu – Oxapampa – Pasco.
    Fecha : Abril a Mayo 1,995.

11. Rehabilitación del Pte Huacamayo.

Tipo reticulado Sima L= 60.00 mt.
Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento estructura metálica.
Lugar : Aguaytia - Padre Abad – Ucayali.
Fecha : Junio a Julio 1,995.

12. Rehabilitación del Pte Neshuya.
    Tipo reticulado Americano L= 50.00 mt.
    Labor Realizada: Mantenimiento y reforzamiento estructura metálica.
    Lugar : Neshuya - Pucallpa – Ucayali.
    Fecha : Agosto 1,995.

13. Conservación y Mejoramiento de la carretera Tingo Maria – Pucallpa, Tramo Tingo Maria - Huanuqueño. L= 48.00 Km.
    Fecha : Septiembre - Diciembre 1,995.

MTC – PROYECTO DE PUENTES ZONA DEL MARAÑON
Cargo : Ing. Residente.

14. Construcción de la 2da Etapa Pte Naranjitos.
    Tipo Modular Mabey Compac L= 48.80 mt .piso metálico 1 vía.
    Labor Realizada: Evaluación infraestructura de la 1era etapa, elaboración de Expediente Técnico definitivo, montaje, lanzamiento y puesta en servicio de la estructura Modular Mabey Compac.
    Lugar : Naranjos – Bagua Grande – Utcubamba - Amazonas
    Fecha : Enero a Mayo 1,996.

15. Construcción Pte Sargento León.
    Tipo Modular Bailey L= 21.35 mt .estribos con contrafuertes y aleros autoportantes, SC HS20-44 de 1 vía.
    Labor Realizada : Evaluación de la superestructura, montaje lanzamiento y puesta en servicio.
    Lugar : Orakuza – Condorcanqui - Amazonas

16. Construcción Pte Alto Urakuza.
    Tipo Modular Bailey L= 24.40 mt estribos con contrafuertes y aleros autoportantes, SC HS20-44 de 1 vía.
    Labor Realizada : Evaluación de la superestructura, montaje lanzamiento y puesta en servicio.
    Lugar : Orakuza – Condorcanqui - Amazonas

17. Diseño y construcción Pte Cayanza.
    Tipo Modular Bailey L= 18.30 mt estribos concreto armado, SC HS20-44 de 1 vía.
    Labor Realizada: Evaluación de la superestructura, montaje lanzamiento y puesta en servicio.
    Lugar: Orakuza – Condorcanqui – Amazonas

    Fecha: Junio – Octubre 1,996. **(Ejecutado en simultaneo ítem 15,16 y 17).**

MTC – JEFATURA PUENTE Aguaytia
Cargo: Ing. Residente.

18. Rehabilitación Pte. Aguaytia.
    Tipo: Puente Colgante Americano, dos tramos reticulados y 33 tramos de viaducto L= 702.00 mt.
    Labor Realizada: Cambio de Planchas y Pines en péndolas centrales del Pte Colgante, cambio de apoyos basculantes, reparación de juntas de dilatación sur.
    Lugar: Aguaytia – Padre Abad – Ucayali.
    Fecha: Julio – Agosto 1,997.

COMPAÑÍA BAZAN Y LAMA S.R.L. (*)
Cargo: Residente de Obra.

19. Construcción Pte Monzón.
    Tipo Colgante Wagner Biro. L= 110 mt
    Labor Realizada: Montaje, lanzamiento y puesta en servicio de la estructura metálica del Pte. Monzón
    Lugar: Bella – Tingo Maria – Leoncio Prado - Huanuco
    Fecha: Octubre 1,997 a Febrero 1,998.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS COINPESA (*)
Cargo: Residente de Obra.

20. Construcción Nuevo Pte Cayumba.
    Tipo Gerber tres tramos concreto armado. L= 140.00 mt.
    Labor Realizada: Construcción de 02 cajones de cimentación, pilares intermedios, dos estribos, dos tramos de superestructura en concreto postensado, tramo central tipo mixto vigas metálicas y tablero de concreto armado.
    Lugar: Cayumba–Mariano Dámaso Beraun–Leoncio Prado–Huanuco.
    Fecha : Mayo 1,998 - Agosto 1,999.

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA PEAH
Cargo : Residente de Obra. **(*)**

21. Construcción Pte. Caracol.
    Tipo Concreto Armado. L= 20.00 mt
    Labor Realizada: Construcción de un cajón de cimentación, dos estribos y la superestructura vigas y tablero de Concreto Armado.
    Lugar : Chinchavito – Chinchao - Huanuco
    Fecha : Agosto 1,999 – Enero 2,000.

Cargo : Jefe de Proyecto.

22. Estudio Definitivo para la red de desagüe Localidad San Miguel. Construcción de 24 Buzones, 861 ml de alcantarillado, 40 conexiones domiciliarias 02 pozas sépticas de aguas residuales domesticas y accesorios. Puesta en servicio.
    Población Futura 480 habitantes.
    Fecha : Febrero – Marzo 2,000.

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA SIMA PERU S.A.

Cargo : Residente de Obra. **(*)**

23. Construcción Pte Bombonera.
    Tipo Mixto, dos tramos, L= 60.00 mt.
    Labor Realizada: Construcción de tres cajones de cimentación, dos estribos y un pilar intermedio, superestructura de vigas metálicas y tablero de concreto armado.
    Lugar : Sicuani - Canchis - Cuzco,
    Fecha: Abril – Diciembre 2,000

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA PEAH

Cargo : Residente de Obra. **(*)**

24. Construcción Pte Pucara.
    Tipo Mixto. L= 27.50 mt .
    Labor Realizada: Anclajes geotécnicos del estribo derecho, acondicionamiento de infraestructura a la nueva geometría del proyecto, Montaje, Lanzamiento y puesta en servicio de las vigas metálicas, encofrado y armadura de refuerzo del tablero de concreto armado.
    Lugar: Pucara – Monzón – Huamalies - Huanuco.
    Fecha : Enero – Mayo 2,001.

25. Rehabilitación Carretera Monzón – Maravillas, Sector Monzón – Pacchac, L= 2.00 Km. ensanche de vía, movimientos de tierra en roca suelta y dura, afirmado.
    Lugar: Monzón – Huamalies - Huanuco.
    Fecha : Julio – Septiembre 2,001.

Cargo : Jefe de Proyecto.

26. Estudio para la Rehabilitación Carretera Monzón – Maravillas, Sector Pacchac – Maravillas L= 5.7 Km. Huanuco.
    Lugar: Pucara – Monzón – Huamalies - Huanuco.
    Fecha : Noviembre – Diciembre 2,001.

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA SIMA PERU SA.
Cargo : Residente de Obra. **(*)**

27. Construcción Pte Bocapan.
    Tipo Marco en concreto Postensado 5 tramos 25.00 mt c/u
    Labor Realizada: Cimentaciones profundas a base de pilotes excavados in situ de 1.20mt Ø y 30 mt de profundidad 30 unidades ,cinco tramos de vigas potenzadas y tablero de concreto, con, luz = 127.50 mt. SC HS-25. doble vía .
    Lugar: Bocapan – Zorritos – Contralmirante Villar– Tumbes
    Fecha : Enero – Marzo 2,002.

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA PEAH

Cargo : Residente de Obra.

28. Construcción Balsa Cautiva I Etapa.
    Infraestructura
    Labor Realizada: Construcción infraestructura Balsa Cautiva Aucayacu.
    Lugar: Aucayacu – Rupa Rupa – Huanuco
    Fecha : Junio – Septiembre 2,002.

MTC – PROVIAS DEPARTAMENTAL
JEFATURA Pte Wawico – RIO NIEVA .

Cargo : Ing. Residente. **(*)**

29. Construcción Pte Wawico I.

Labor Realizada: Construcción infraestructura, superestructura modular Bailey de 9 módulos una vía, piso de madera. L = 27.43 mt
Lugar: Wawico – Imaza – Bagua – Amazonas

30. Construcción Pte Nva Esperanza I.

Labor Realizada: Construcción infraestructura, superestructura modular Bailey de 7 módulos una vía, piso de madera. L = 21.34 mt
Lugar: Nva Esperanza – Imaza – Bagua – Amazonas

31. Construcción Pte Nva Esperanza II.

Labor Realizada: Construcción infraestructura, superestructura modular Bailey de 8 módulos una vía, piso de madera. L = 24.38 mt
Lugar: Wawico – Imaza – Bagua – Amazonas

Fecha : Nov. 02 – May 03. (Ejecutado en simultaneo ítem 29,30 y 31).

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Cargo : Ing. Residente.

32. Mantenimiento Carretera Cerro de Pasco – Yanahuanca

Labor Realizada: Mantenimiento de 48 Km. de Carretera Cerro de Pasco Yanahuanca (4380 msnmm) Cerro de Pasco

Fecha : Oct. 03 – Abril 04. , se realizo en dos etapas.

ING. E. FRANCISCO ARELLANO GOMEZ

Cargo: Ing. Residente. **(*)**

33. Reforzamiento del Pte. SUPE

Aumento de capacidad de cargad el Pte Supe, con el empleo de pernos de anclaje Hilti, y planchas de acero de 12.5 mm en 5 vigas de concreto del Pte Supe. Luz = 35 mt.
Fecha: Julio. 04 – Agosto 04.

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Cargo: Ingeniero Civil - Especialista Obras Civiles.

34. Asistente de Gerencia Comercial – Área Evaluación de proyectos de inversión.

Evaluación de proyectos de inversión, Pte San Cristóbal de Shupluy - Ancash, Pte Yurinaki – Junín, Pte Chirimoyo - Ancash, Pte Daniel Alcides Carrión - Junín, Central Hidroeléctrica San Juan – Cerro de Pasco.
Fecha: Octubre. 04 – Diciembre 04.

Cargo: Ingeniero Residente. **(*)**

35- Construcción Pte Daniel A. Carrión

Construcción del Pte. Daniel Alcides Carrión, infraestructura con pilotes de acero y estribos de concreto armado, superestructura metálica tipo arco de tablero inferior con losa de concreto, Luz = 60.00 mt , cuatro carriles de via vehicular y veredas de 1.70 mt en voladizo a cada lado, ubicado en Huancayo – ciudad
Fecha: Enero 2005 - Enero 2006.

Cargo: Ingeniero Civil - Especialista Obras Civiles.

36.- Construcción Pte Carrasquillo.

Construcción de un Pte Carrasquillo, infraestructura con pilotes pre-excavados de 18 mt. de longitud, y 1.00 mt de diámetro, pilares intermedios, superestructura metálica continua con vigas cajón y losa de concreto armado. Luz = 160 mt, un carril.
Fecha: Mayo 2006 – Diciembre 2006.

37.- Construcción Puentes Interoceánica Sur tramo III

Construcción de 3 puentes de luces variadas, infraestructura con estribos de concreto armado excavación abierta, superestructura de vigas de alma llena y losa de concreto armado, dos carriles por cada puente (Puente El Tigre Luz 25 mt), (Pte Tres Marías Luz = 25 mt), (Pte La Cigarra Luz = 30 mt).
Fecha: Mayo 2007 - Noviembre 2007

GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Cargo: Ingeniero Civil - Especialista Evaluación Proyectos Transporte.

38. Área Evaluación de proyectos de Transporte Sub Gerencia de Estudios.

Evaluación de proyectos de Transporte en forma integral a fin de promover las licitaciones (Carretera Huachon Huancabamba S/10`000,000; Carretera Carhuamayo Paucartambo S/. 11´000,000 carretera Pasco Yanahuanca S/. 30´000,000 y otros proyectos conexos).
Fecha: Enero 2008 - Septiembre 2008.

CONSORCIO PUENTE CHINO (Camargo Correa – Queiroz Galvao)

Cargo : Ing. Residente. Especialista En Puentes

39. Construcción Puente Chino

Labor Realizada: Dirección técnica para la construcción del Puente Chino Luz 115 mt.

Fecha : Ene. 2009 – Julio 2011

Cargo : Ing. Residente Obra.

40. Carretera Puente Pumahuasi – Puente Chino.
Labor Realizada: Direccion técnica para la culminación de la obra en su integridad hasta la recepción de obra.

Fecha : Agosto. 2011 – Febrero 2012

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Cargo: Ingeniero Residente. **(*)**

41. Construcción Puente Comuneros.

Dirección técnica para la Construcción del Puente Comuneros Luz = 300 mt cruza el rio Mantaro, Chilca 3 de Diciembre, Huancayo Junín.

Fecha: Marzo. 2012 – A Setiembre 2013

OBRAINSA.

Cargo: Ingeniero Residente (ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE).

42. Construcción Puente Rio Tambo.

Dirección técnica para la Construcción del Puente Rio Tambo Luz = 192 mt cruza el rio Tambo, Deán Valdivia – Punta de Bombón, provincia de Islay Región Arequipa.

Fecha: Agosto 2015 – A Noviembre 2017.

CONSORCIO PUENTES PARA EL PERU.

Cargo: Ingeniero Especialista de Puentes, (ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE)

43. Evaluación de diversos proyectos de Construcción de puentes en el consorcio puentes para el Perú.

Fecha: Diciembre 2017 – Julio 2019.

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

44. Construcción del Puente Freyre y Accesos. **(*)**

Dirección técnica para la Construcción del Puente Luz = 120 mt cruza el rio Tambo La Punta – Islay - Arequipa.
Obra del Consorcio Puentes Para el Perú. (CPPP)

Fecha: Agosto 2019 – Diciembre 2019.

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

45. Contrato Obra Privada para AUTOPISTA DEL NORTE en la construcción del Puente Viru (1era parte).

Fecha: Agosto 2020 – Enero 2021.

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

CONSORCIO PUENTE DEL SUR. (*)

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

46. Construcción del Puente Interregional Pampas.
Luz = 280 mt (70-140-70) por dovelas.

Fecha: Febrero 2021 – Junio 2023.

Cargo: Ingeniero Residente Obra.

(*) Estos puentes marcados, son puentes carreteros ejecutados en un solo contrato

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 1997

EL TITULO PROFESIONAL DE

INGENIERO CIVIL

A DON

WILFREDO SANTIAGO HUAYHUA HUARACA

POR TANTO:

EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL

DADO EN LIMA A 11 DE SETIEMBRE DE 1997

Secretario General | Decano de la Facultad | Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 239 DEL TOMO 14 RESPECTIVO

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Nº - A - 0401938

Certificado de Habilidad

2024023192

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): HUAYHUA HUARACA WILFREDO SANTIAGO

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 054885 Fecha de Incorporación: 1997-11-22

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS / OTROS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	05	2024

** AREA DE CERTIFICADOS **
MGONZAL - 2024-02-27 16:17:14

SAN ISIDRO , 27 de FEBRERO del 20 24

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

SECRETARÍA

Ing. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

ING. CIP. JORGE REYNALDO CUEVA NOLBERTO
DIRECTOR SECRETARIO DEL CDL CIP
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"

SIMA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES
DESDE 1845

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Jefe de Oficina Comercial SIMA Chimbote Capitán de Fragata Alberto VERGARA Velarde, certifica que:

El Ing. Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca.

Identificado con DNI 08123359, CIP 54885, ha laborado como Ing. Residente de la obra "Construcción del Puente Daniel Alcides Carrión y accesos", según convenio con la Municipalidad Provincial de Huancayo, desde 02 de Enero del 2005 hasta el 19 de Abril del 2006.

Durante su permanencia ha demostrado puntualidad, eficiencia, capacidad técnica, e iniciativa en los trabajos encomendados

Se expide el presente a solicitud del interesado.

Chimbote, 08 de Mayo del 2008

Capitán de Fragata
Jefe Oficina Comercial
SIMA Chimbote
Alberto VERGARA Velarde

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"

SIMA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES
DESDE 1845

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Jefe de Oficina Comercial SIMA Chimbote Capitán de Fragata Alberto VERGARA Velarde, certifica que:

El Ing. Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca.

Identificado con DNI 08123359, CIP 54885, ha laborado como Ing. Especialista en puentes para la obra "Construcción del Puente Carrasquillo y accesos", según convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Provias Departamental, desde 02 de Mayo del 2006 hasta el 30 de Diciembre del 2006.

Durante su permanencia ha demostrado puntualidad, eficiencia, capacidad técnica, e iniciativa en los trabajos encomendados

Se expide el presente a solicitud del interesado.

Chimbote, 08 de Mayo del 2008

Capitán de Fragata
Jefe Oficina Comercial
SIMA Chimbote
Alberto VERGARA Velarde

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"

SIMA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA
CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES
DESDE 1845

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Jefe de Oficina Comercial SIMA Chimbote Capitán de Fragata Alberto VERGARA Velarde, certifica que:

El Ing. Wilfredo Santiago Huayhua Huaraca.

Identificado con DNI 08123359, CIP 54885, ha laborado como Ing. Especialista en puentes para la obra "Construcción de Puentes Interoceánica Sur Tramo III", según contrato con CONIRSA, desde 02 de Mayo del 2007 hasta el 30 de Noviembre del 2007.

Durante su permanencia ha demostrado puntualidad, eficiencia, capacidad técnica, e iniciativa en los trabajos encomendados

Se expide el presente a solicitud del interesado.

Chimbote, 08 de Mayo del 2008

Capitán de Fragata
Jefe Oficina Comercial
SIMA Chimbote
Alberto VERGARA Velarde

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

SIMA
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA

CONSTANCIA POR SERVICIOS PROFESIONALES

EL QUE SUSCRIBE: Jefe de Centro de Operación N° 3 - SIMA Chimbote, con R.U.C. N° 20100003351 y con domicilio legal en la Av. Los Pescadores N° 151- Zona Industrial "27 Octubre" – Chimbote;

DEJA CONSTANCIA: Que, el Ingeniero **WILFREDO SANTIAGO HUAYHUA HUARACA**, identificado con D.N.I. N° 08123359 y Reg. CIP 54885, ha prestado servicios bajo la modalidad de Honorarios Profesionales *desde el 13 de abril del 2012 hasta el 01 de octubre del 2013*; como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, en la obra **"CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"** (Puente Mantaro), durante este periodo ha demostrado eficiencia y responsabilidad en los trabajos encomendados.

Referencia y Ubicación de la Obra:

Ubicación	:	Distritos de Chilca y Tres de Diciembre
Departamento	:	Junín
Provincias	:	Huancayo y Chupaca
Sobre el Río	:	Mantaro

Características Técnicas de la Obra:

Puente	:	Luz 300.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular)
Tipo	:	Atirantado del tipo semi arpa, con pilones tipo "H" y con tablero de estructura metálica inferior, dividido en tres tramos de (70.00 m.-160m.-70.00 m.)
Superestructura	:	02 Vigas principales, 32 vigas transversales y 02 vigas longitudinales de acero ASTM A709 grado 345, Fy= 345 kg/cm2, losa de tablero 0.23 mts.
Subestructura	:	Estribostipo pantallas y pilones tipo "H" con zapatas, asentados sobre 60 Pilotes de concreto armado con fundas perdidas de 1.20 m y 30.00 m. de longitud.

Se le expide la presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 23 enero del 2019

MARINA DE GUERRA DEL PERU
REPÚBLICA DEL PERÚ
Servicio Industrial de la Marina - Chimbote

Capitán de Navío
Jorge CALIZAYA Portal
Jefe de SIMA CHIMBOTE

SIMA CHIMBOTE
OFICINA DE LOGÍSTICA

CONSORCIO
PUENTES PARA EL PERÚ

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que: El Sr. **HUAYHUA HUARACA WILFREDO SANTIAGO,** identificado con **DNI: 08123359,** ha laborado en nuestro Consorcio del 14 de Enero del 2019 al 01 de Enero del 2020, en los siguientes proyectos:

- Desde el 14 de Enero del 2019 al 31 de Julio del 2019 en el proyecto de **"Construcción de Puentes por reemplazo en la zona Centro - Sur del país"**, desempeñándose como **ESPECIALISTA OBRAS DE ARTE.**

- Desde el 01 de Agosto del 2019 al 01 de Enero del 2020 en el proyecto de ***'PE1SD Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - Ilo-Pozo (1puente)'***, desempeñándose como **RESIDENTE DE OBRA.**

El referido colaborador ha demostrado capacidad, honestidad y responsabilidad en las funciones que le fueron encomendadas.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

San Isidro, 17 de Enero del 2020.

CONSORCIO PUENTES PARA EL PERU
ARTURO DÍAZ NÚÑEZ
Representante Legal

Diaz Núñez, Rosario Arturo
Representante Legal

SUCURSAL PERÚ

HERDOÍZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

www.hcc.com.ec
Telf: (+51) 1 713 0294
Av. Santa Cruz, Mcal. Andrés 410
San Isidro - Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU con RUC N° 20600419839, certifica que:

EI ING. WILFREDO SANTIAGO HUAYHUA HUARACA, identificado con DNI **08123359**, ha laborado en nuestra empresa ocupando el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** desde el 01 de Setiembre del 2020 hasta el 08 de Enero del 2021 en la obra:

"Construcción del Puente Virú (km 520+200 de la Carretera Panamericana Norte) ", el cual consiste en 3 tramos (dos de 40 m c/u y uno de 30 m), Longitud total: 110 m.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

San Isidro, 13 de Enero del 2021.

Herdoiza Crespo Construcciones S.A.
Sucursal Perú

Gustavo C. Llanos Huanca
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

CONSORCIO
PUENTE DEL SUR

Lima, 30 de junio del 2023

CERTIFICADO DE TRABAJO

CONSORCIO PUENTE DEL SUR con RUC N° **20607048747**, con domicilio legal en Calle Ricardo Angulo N° 834. Urb. Corpac, San Isidro, provincia y departamento de Lima.

CERTIFICA

Que, **el Señor HUAYHUA HUARACA WILFREDO SANTIAGO** identificado con **DNI N°08123359,** prestó sus servicios desempeñándose en el cargo de **Residente de Obra** desde el **1 de Febrero de 2021** hasta el **30 de Junio de 2023**, en la empresa **CONSORCIO PUENTE DEL SUR, en el proyecto de obra "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS, DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY.105 Y AP.105, EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURAMA Y URANMARCA, PROVINCIAS DE VILCASHUAMAN Y CHINCHEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y APURIMAC".**

Emitimos el presente documento a solicitud del interesado para fines que estime conveniente.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

HUGO JOSUE POW SANG TEJADA
CONSORCIO PUENTE DEL SUR
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Jefe de Topografía

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**JEFE DE TOPOGRAFÍA**
Nombre y Apellidos:	Edgar Cari Machaca
Carrera Profesional:	Topógrafo y Agrimensor - CIP N° 78615
Experiencia General:	3.89 años
Experiencia Similar:	3.89 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de la ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo María – Aguaytía – Pucallpa, Tramo: DV. Aeropuerto Pucallpa – Altura del Cementerio Jardín del Buen Recuerdo. **Actividades**: Movimiento de tierras.	Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	3/04/2014	3/09/2015	1.42
2	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán. **Actividades**: Movimiento de tierras, terraplenes.	Especialista en Trazo y Topografía	10/12/2010	30/05/2013	2.47
Experiencia Total Similar					**3.89**

Aptitudes principales

Consultoría

Trabajo en equipo

Ingeniería

Edgard Cari Machaca

Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico. en Concesionaria Vial del Sur S.A.

Perú

Experiencia

Concesionaria Vial del Sur S.A.

Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.

junio de 2016 - Present (7 años 10 meses)

Perú

COVISUR (CASA, H&H)

“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA”

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente y ampliacion de una segunda Calzada entre las cuidades de Juliaca y Puno con una Lonjitud de 48.5 Km.

Construcción y Administración S.A.

Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.

abril de 2014 - octubre de 2015 (1 año 7 meses)

Perú

Consorcio Vial Pucallpa (CASA, H&H)

“AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA – AGUAYTIA – PUCALLPA”

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente de 8 Carriles a Nivel de Autopista.

ICCGSA - Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.

ING ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO

2013 - mayo de 2014 (1 año)

Cajamarca (La Encañada, Celendin)

Consorcio Vial la Encañada (ICCGSA – TyT)

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDÍN – BALSAS, TRAMO II: KM 26+000 AL KM 52+000 SALDO DE OBRA”

Construcción y Administración S.A.

4 años 10 meses

Ing. Especialista en Trazo y Topografia

diciembre de 2010 - mayo de 2013 (2 años 6 meses)

Perú

Consorcio Vial Trujillo (CASA – H&H)

Obra nueva a nivel de asfalto en caliente, Departamento La Libertad Tramo Desvio Otuzco Desvio Callacuyan, que abarcan entre las Proviancias de Otuzco y Sanchez Cerro con una Lonjitud de 70.9 Km

Ing. Especialista en Trazo y Topografia

agosto de 2008 - diciembre de 2010 (2 años 5 meses)

Perú

Mejoramiento del Corredor Via Interoceanica Sur Peru, Tramo Nº 05 (Tramo. Puno Ilo)

Gobierno Regional de Puno

Ing Esp en Topografia

octubre de 2007 - febrero de 2008 (5 meses)

Perú

Construccion del Puente Yapupampa - Tipo Bateria Alcantarilla Multiplate MP - 152 Abovedada LUZ 128 m.

Construcción y Administración S.A.

Ing Encargado de campo (Trazo y Topografia)

junio de 2005 - julio de 2007 (2 años 2 meses)

Perú

Construccion de la Carretera Panamericana Sur, Tramo: Km 58+000 al Km 130+700 (Puente Pucusana - Cerro Azul)

Construcción y Administración S.A.

Ing. TRAZO Y TOPOGRAFIA

noviembre de 2004 - febrero de 2005 (4 meses)

Perú

Consorcio UNISH (CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION - ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES SAC)
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA LIMA - CANTA - UNISH, SECTOR HUAYLLAY - COCHAMARCA

Educación

Universidad Privada Antenor Orrego

MG TRANSPORTES Y CONSERVACION VIAL, Transportes y Conservacion Vial · (2011 - 2013)

Universidad Nacional del Altiplano

Ing. Especialista en Topografia y Diseño Geometrico de Vias · (1995 - 2001)

Universidad Alas Peruanas

INGENIERO CIVIL

REPUBLICA DEL PERU



A NOMBRE DE LA NACIÓN

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Por cuanto: Don **Edgard Cari Machaca**

ha cumplido los requisitos exigidos por la Facultad de:

Ciencias Agrarias *para optar el*

Título *de:* **Ingeniero Topografo y Agrimensor**

Habiéndose aprobado su otorgamiento en sesión **Extraordinaria** *de*

Consejo Universitario del **04** *de* **Febrero** *del 20* **04**

Por tanto: se le expide el presente **Título** *para que se le reconozca*

como tal.

Dado y firmado en Puno, a los **06** *días del mes de* **Febrero** *del 20* **04**

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

INTERESADO

VICERRECTOR ACADÉMICO

DECANO DE FACULTAD

DECANO

REGISTRADO A FOJAS 323
DEL TOMO XXV

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL



EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

EDGARD CARI MACHACA
Ingeniero Topógrafo y Agrimensor

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito con registro N° **78615**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 18 de Agosto 2004

Ing. CIP Julio Rivera Feijóo
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Gustavo Luyo Velit
SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **EDGARD CARI MACHACA**
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **78615** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **24/09/2022**

Por tanto,

SEGUNDA ESPECIALIDAD

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de **INGENIERO**

Miraflores, 10 de Octubre de 2022

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DECANA NACIONAL
CONSEJO NACIONAL

Ing. María del Carmen Ponce Mejía
DECANA NACIONAL

Ing. Marco Antonio Cabrera Huaman
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL

N 11-78615

CONSTRUCCION Y ADMNISTRACION S. A.

H e H CONSTRUCTORES

CASA Construcción y Administración S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe GERENTE DEL PROYECTO: Construcción de la Ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo María - Aguaytia – Pucallpa, Tramo: DV. Aeropuerto Pucallpa - Altura del Cementerio Jardín del Buen Recuerdo.

CERTIFICA:

Que el Sr. **CARI MACHACA EDGARD**, ha laborado para nuestra empresa Construcción Y Administración S.A. Desde el 03 de Abril del 2014 al 03 Setiembre 2015, desempeñándose en el cargo de: **Ing. Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico.**

Durante su permanencia ha demostrado honradez, puntualidad, eficiencia en las labores de su competencia y encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Pucallpa, 3 de Septiembre del 2015

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.
Ing. Max Paiza Camara
GERENTE DE PROYECTO

OFICINA PRINCIPAL
Av. Javier Prado Este Nº 4109, Urb. Santa Constanza, Santiago de Surco – Lima
Telf. (01) 611-3939

OFICINA PUCALLPA
Carretera Federico Basadre km 28.5 – Campoverde-Coronel Portillo-Ucayali

CERTIFICADO

Quien suscribe, Ing. Luis Carrasco Palomo, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Vial Trujillo, certifica:

Que, el Ing. Edgard Cari Machaca, con CIP N° 78615, ha laborado en nuestro Consorcio como ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA en la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán - Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán", a nivel de carpeta asfáltica en caliente y desarrollada fuera del ámbito urbano (Longitud = 70.90Km.); desde 10.Diciembre.2010 al 30.Mayo.2013. Cargo oficial ante la entidad.

Características:

Entidad:	Provias Nacional.
Ubicación:	Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco (Trujillo).
Monto Contr. inicial :	S/. 174,435,042.97 incl. I.G.V.
Alcances:	Corte en material suelto, corte en roca fija, corte en roca suelta, mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, terraplenes, base granular, imprimación asfáltica, carpeta asfáltica em caliente, cunetas triangulares, cunetas rectangulares, subdren, gavión tipo cajón, señalización preventiva, señalización reglamentaria, tachas reflectivas, postes kilométrico, monitoreo ambiental, revegetación de áreas afectadas, reacondicionamientos del área de DMES , etc.

Se expide el presente certificado, a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Lima, 30 de Julio del 2020

CVT-003

CONSORCIO VIAL TRUJILLO

ING. LUIS CARRASCO PALOMO
Representante Legal

Jefe de Oficina Técnica

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE


Cargo Propuesto:	**JEFE DE OFICINA TÉCNICA**
Nombre y Apellidos:	Jose Raul Ingalupque Arapa
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 159638
Experiencia General:	5.83 años
Experiencia Similar:	4.84 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Construcción de la Segunda Calzada de la Autopista Puno – Juliaca **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones masivas.	Jefe de Costos	10/07/2018	15/05/2023	4.84
Experiencia Total Similar					**4.84**

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

José Raúl Ingaluque Arapa

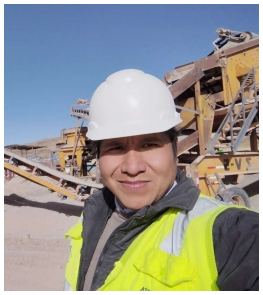

10 de julio de 1984 (39 años) Casado
DNI: 42556361
Cel: 919755215
Domicilio: Jr. Domingo Orue N° 565 – Surquillo, Lima
Av. Sesquicentenario N° 532 - Puno
E-mail: ***jringaluque@gmail.com***
Pretensiones salariales: 12,000 Soles

Ingeniero Civil Colegiado, con 10 años de experiencia como Jefe de Oficina Técnica, Costos metrados y Valorizaciones, Administración de Contratos; en Obras de infraestructura vial, construcción de puentes, central hidroeléctrica, y obras diversas de infraestructura privada y pública. Como profesional tengo el compromiso de poner en práctica lo aprendido a lo largo de mi carrera profesional; con el propósito de plantear nuevas propuestas para la constante mejora y superación personal.

Experiencia Profesional

Construcción y Administración SA - CASA *Ago 2023 - Mar 2024*
(Construcción)
Jefe de Oficina e Ingeniería

- Replanteo del Informe técnico de mantenimiento: ”ITM Sector 3, Uchumayo - Arequipa”, con 27 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Control de requerimientos y avances semanales.
- Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión

Construcción y Administración SA - CASA *Jul 2018 - May 2023*
Perú
(Construcción)
Jefe de Costos, Metrados y Valorizaciones

- Replanteo del expediente de la Obra: ”Segunda Calzada de la Carretera Puno - Juliaca”, con 48 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Control de requerimientos y avances semanales.
- Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos de subcontratistas
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión

Municipalidad Provincial de Puno *Abr 2018 - Jun 2018*
Perú
(Construcción)
Ing. Residente

- Ingeniero Residente de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitación del servicio vial urbano en el Jr Apurímac, Telesforo Catacora del barrio Laykakota de la

ciudad de Puno"
- Control de producción diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y mensuales.
- Realización de adicionales de obra.
- Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la obra.
- Control de calidad de la obra.
- Control de ejecución de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y directivas por Administración directa.

Constructora Malaga Hnos *Jun 2017 - Ene 2018*
(Construcción) *Perú*
Ingeniero de Costos y Valorizaciones

- Replanteo del expediente de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCHABAMBA – CUTERVO – SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE", con 91 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Control de requerimientos y avances semanales.
- Verificación de incompatibilidades con el expediente técnico
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos de subcontratistas
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al Contrato de Concesión

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina *Oct 2016 - Mar 2017*
Perú
(Construcción)
Ing. Residente

- Ingeniero Residente de la obra: "Mejoramiento del Puente Carrozable en el Centro Poblado Santa Cruz de Mijani – Puno" con L=25m
- Control de producción diaria en la obra de acuerdo a las metas diarias y mensuales.
- Realización de adicionales, deductivos y Ampliaciones de plazo.
- Requerimiento de bienes, servicios, mano de obra y subcontratos para la obra.
- Control de calidad de la obra.
- Control de ejecución de obra de acuerdo al Expediente Técnico, normas y directivas legales.

J.C. Contratistas Generales E.I.R.L. *Nov 2015 - Abr 2016*
(Construcción) *Perú*
Ing. Residente - Bocatoma

- Ingeniero Residente de operaciones en la Bocatoma – Central Hidroeléctrica de Yarucaya (Huaura).
- Control de producción diario en la obra de acuerdo a las metas diarias y mensuales.
- Requerimiento de materiales, equipo, personal y subcontratos para la obra.
- Control de calidad de acuerdo al Dossier del cliente.
- Control de ejecución de obra de acuerdo al expediente y absolución de los RFI.
- Control de costos en proveedores para la ejecución de acuerdo al

presupuesto operativo.
- Análisis de costos, presupuestos y programación de obra a largo y corto plazo.

C&C Consul. Ejec. Contratistas Grles Srl. *Abr 2014 - Feb 2015*
(Construcción) *Perú*
Ing. de Producción
- Verificación y replanteo del expediente de obra: "Construcción del Puente Antajarani y Accesos", con L=91m
- Control de producción diaria de todas las partidas de obra, de acuerdo a los rendimientos planteados
- Control diario de HH y HM de acuerdo a las metas semanales
- Requerimiento de materiales, equipo y personal para la obra.
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Ilave *Nov 2012 - Oct 2013*
(Construcción) *Perú*
Jefe de Oficina Técnica
- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Ilave – Mazocruz tramo Ilave - Checa", con 10.00 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Liquidación de Obra
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Perú *Ago 2011 - Sep 2012*
(Construcción) *Perú*
Ing. Metrados, Valorizaciones y Presupuestos
- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Santiago de Chuco - Shorey" con 42.50Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Tambo *Ago 2010 - Jul 2011*
(Construcción) *Perú*
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos
- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande – II Etapa" con

13.00Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Programación de obra y Ampliaciones de Plazo
- Liquidación de Obra
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

Consorcio Vial Piura *Oct 2009 - Jul 2010*
(Construcción) *Perú*
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos
- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande – I Etapa" con 18.00 Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Ing. de Producción en Planta de Asfalto
- Liquidación de Obra, liquidación de Socios Consorciados
- Control técnico legal de acuerdo al RLCE

E. Reyna C. S.A.C. *Ago 2009 - Sep 2009*
(Construcción) *Perú*
Asistente de Licitaciones de Obra
- Revisión de Planos metrados y costos de las diferentes licitaciones de Obra.
- Elaboración de Presupuestos completos de las diferentes obras postuladas.
- Elaboración de Preguntas al comité.
- Seguimiento con las demás fases de Licitaciones

Consorcio Vial Río Salas *Oct 2008 - Jul 2009*
(Construcción) *Perú*
Ing. Costos, Valorizaciones y Presupuestos
- Replanteo del expediente de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Panamericana Antigua - Salas" con un total de 12.50Km
- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos
- Ing. de Producción en Planta de Asfalto en Caliente

Consorcio Vial Huarmey Ancash *Abr 2008 - Sep 2008*
(Construcción) *Perú*
Asistente de Ingeniería
- Elaboración del expediente técnico del "Mejoramiento y rehabilitación de la carretera de Acceso a Puerto Huarmey" con un total de 4.50Km.

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

- Costos y Valorizaciones de obra.
- Adicionales y Deductivos de Obra
- Control de Equipos y combustible (ratios de las diferentes maquinas)
- Análisis de costos

Grados y Titulos

Universidad Nacional de Ingeniería
Ingeniero Civil
Del 2001 - 2006

Universidad Nacional de Altiplano
Egresado de la Maestría en Infraestructura Vial
Del 2020 - 2021

Conocimientos

Inglés: Escrito Básico

Inglés: Oral Básico

Visual BASIC: Seniority Principiante

Autocad: Seniority Senior

MS Office: Seniority Senior

MS Project: Seniority Senior

S10 Costos y presupuestos
Valorizaciones, costos y presupuestos

Civil 3D
Base de datos para trabajar con el AutoCAD y modelamientos en 3D

Ms Project
Programación y control de obras

EvalPav
Evaluación superficial de pavimentos

Documentos personales

- Documento: 42556361
- Licencia de Conducir A-I : U42556361
- Reg. único contribuyente (RUC): Nro. 10425563616
- Colegio de Ingenieros del Perú CIP: 159638

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

Cursos de capacitación

- Costos, Metrados, Presupuestos, Programación y Valorización de obras en Excel con el Software Sistemas RW7 PRO (80 Horas Académicas)
- Ejecución de Obras Públicas Según la Nueva Ley de Contrataciones DL 1444 y DS 344-2018 (32 Horas Lectivas)
- Residencia de Obras Publicas (60 horas lectivas)
- Administración de Contrato de Obras Públicas (80 horas lectivas)
- Supervisión de obras públicas (80 horas lectivas)
- Evaluación superficial pavimentos: Procesamiento con el software EvalPav (60 horas lectivas)
- Mezclas asfálticas modificadas y mezclas tibias, aplicaciones en Perú (60 horas lectivas)
- Geotecnia Aplicada a Infraestructura Vial (20 Horas Académicas)
- Diseño de Pavimentos con adoquines de Concreto (12 horas académicas)
- Bases estabilizadas en el mantenimiento y construcción de carreteras (60 horas lectivas)
- Pavimentos durables con el uso de aditivos
- Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783 (40 Horas Lectivas)
- Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (60 horas lectivas)
- Protocolos de Seguridad frente al Covid 19 en obras Públicas y Consultorias (64 horas lectivas)
- Diseño de Planes de Vigilancia, prevención y control Covid 19 para Construcción (40 horas académicas)
- Gestión de proyectos en construcción basado en control de calidad, aplicando el síndrome del 90% (40 horas académicas)
- Control de Calidad de marcas permanentes en el pavimento (02 Horas Lectivas)

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA
Cel: 919755215
jringaluque@gmail.com

- Sistema de sellado de juntas de dilatación
- Morteros de altas resistencias
- Membranas liquidas aplicadas o reactivas a base agua
- Demolición de rocas sin detonación con Chema Crack
- Reparación de estructuras de concreto

Puno, Abril 2024

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2008

EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN:

INGENIERIA CIVIL

A DON

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

FEDATEO

18 MAR. 2008

POR TANTO:

EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL

DADO EN LIMA A 15 DE ABRIL DEL 2008

L. Quiñap.
Secretario General

Decano de la Facultad

Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 66 DEL TOMO 10 RESPECTIVO

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2013
EL TITULO PROFESIONAL DE

INGENIERO CIVIL

A DON

JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA

POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 02 DE SETIEMBRE DEL 2013

Secretario General | Decano de la Facultad | Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 135 DEL TOMO 19 RESPECTIVO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



El Decano Nacional:

Por cuanto **JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA**

Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° **159638** en cumplimiento de la Ley 28858, el **02/06/2014**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 04 de Junio de 2014

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DECANO
CONSEJO NACIONAL

Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DIRECTOR
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO NACIONAL

CASA
Construcción y Administración S. A.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de **CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.** con **RUC N° 20109565017.**

CERTIFICA:

Que, el Ing. **INGALUQUE ARAPA JOSE RAUL**, identificado con **DNI N.° 42556361**, ha laborado en nuestra empresa desempeñando la función: **JEFE DE COSTOS DE OBRA**, en la categoría **EMPLEADO**, desde el **10 de Julio de 2018** hasta el **15 de Mayo de 2023.**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas

Se expide el presente documento, de acuerdo a ley, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Juliaca, 15 de Mayo de 2023.

Construcción y Administración S.A

Yeny Z. Quispe Cusi
ADMINISTRADORA

Dirección: Urb. Taparachi Mz. A Lt. 19
Teléfono: 051-324135
Juliaca - San Roman - Puno
www.casacontratistas.com

CONSORCIO
VIAL ILAVE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente, la empresa Contratista "CONSORCIO VIAL ILAVE", a través de su Representante Legal Sr. Euclides Reyna Cabada, identificado con DNI N° 07853063

CERTIFICA:

Que, el Señor **JOSE RAUL INGALUQUE ARAPA,** identificado con DNI N° 42556361, ha laborado para la Empresa **"CONSORCIO VIAL ILAVE"** conformado por las empresas: E. Reyna C. SAC y Corporación Inca SAC, en la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Carretera Ilave – Mazocruz, Tramo: Ilave – Checca", con una longitud total de 10 Km a nivel de Asfalto en Caliente.

Periodo	:	Noviembre 2012 a Octubre 2013
Duración	:	12 meses
Cargo	:	Jefe de Oficina Técnica
Monto de la obra:		S/. 22'756,475.63

Durante su permanencia en la empresa, ha demostrado responsabilidad, puntualidad y honestidad, en todos los trabajos desarrollados.

Por cuanto se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Ilave, Octubre del 2013

CONSORCIO VIAL ILAVE

ING. EUCLIDES REYNA CABADA
Representante Legal

Responsable de SSOMA

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RESPONSABLE SSOMA**
Nombre y Apellidos:	Chesster Agusto Muñoz Valdez
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 141210
Experiencia General:	5.74 años
Experiencia Similar:	5.74 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Creación del paso a desnivel en la intersección de la Av. Las Palmeras – Av. Javier Prado Este – Av. Golf de los Incas (Ovalo Monitor). **Actividades**: Movimiento de tierras, obras de concreto armado, viaducto.	Jefe de Seguridad	1/12/2021	31/05/2022	0.50
2	Intercambio Vial El Derby – San Borja Norte Paso a Desnivel Manuel Olguín. **Actividades**: Movimiento de tierras, obras de concreto armado, viaducto.	Jefe SSOMA	2/04/2018	31/12/2019	1.75
3	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. José de Lama Tramo Comprendido entre Av. Dos de Mayo y Ovalo. **Actividades**: Movimiento de tierras.	Jefe de Seguridad	1/05/2014	29/02/2016	1.83
4	Construcción del Puente Ñaña y accesos. **Actividades**: Movimiento de tierras, enrocado de protección, defensa ribereña	Jefe de SSOMA	1/08/2016	31/03/2018	1.66
				Experiencia Total Similar	**5.74**



CHESSTER AGUSTO MUÑOZ VALDEZ

AV. TOMAS VALLE 2254 URB. ANTARES- SAN MARTIN DE PORRES- LIMA

PERFIL

Ingeniero CIP 141210 Ambiental y Recursos Naturales con experiencia certificada como Coordinador y Especialista ambiental, Jefatura SSOMA, auditor interno en Sistema de gestión integrado de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, cuento con excelentes relaciones interpersonales, dinamismo, creatividad lo que me facilita el entrenamiento y capacitación al personal a cargo, asimismo tengo alto nivel de compromiso, soy honesto y eficaz en las tareas asignadas dichas cualidades me permiten relacionarme con facilidad enfatizando el trabajo en equipo.

Datos Generales

- **Celular**
  997512902
- **Fecha de Nacimiento**
  13 de junio de 1985
- **Documento Nacional de Identidad**
  43619862
- **Estado Civil**
  Casado
- **Licencia de Conducir**
  Q43619862 válido hasta 26/04/2029
- **E-mail**
  cmunoz.secperu@gmail.com

Formación Personal

- **MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE**
- **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC)**

  Ing. CIP Ambiental y de Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales.

  CIP : 141210 Colegio de Ingenieros de Lima
- **LICEO NAVAL TENIENTE CLAVERO**

  Primaria y Secundaria 1991-2002

  Ventanilla - Callao

Experiencia Profesional

CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.

Cargo: Coordinador de Medio Ambiente

Fecha: junio 2022 – hasta diciembre 2023

Referencia:

Jefatura Socio Ambiental:

Luis Barrios Rivas celular: 997370391



OBRA: VIADUCTO OVALO MONITOR HUASCAR, DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO - LIMA

Cargo: Jefe de SSOMA

Fecha: noviembre 2021 – hasta mayo 2022

Referencia:

Recursos humanos:

Lesly Ortiz celular: 986646472



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA – OBRA 2 (80´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Especialista Ambiental


Fecha: Enero 2020 – hasta noviembre 2021

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472



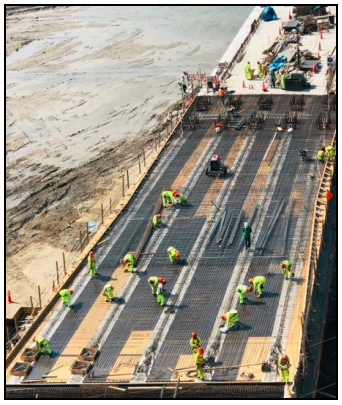

Descripción: La obra abarca 05 puentes divididos en dos Regiones: Cajamarca (Puente Chilete, La Mónica y Monte Nazario Sur), Región La Libertad (Puente Punta Moreno y Puente Ochape)

Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de tierras, construcción de pilares, montaje de vigas pre-fabricadas de concreto, vaciado de pre losas, construcción de los accesos, montaje y desmontaje de puentes provisionales.

Cliente: Provias Nacional

OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN (80´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Julio 2019 – Diciembre 2019

Referencia:

Recursos Humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472






Descripción: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las vías de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de tierras, construcción de pilares, montaje de vigas metálicas y pre fabricadas de concreto.

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

OBRA: VIADUCTO ARMENDARIZ (58´000 000 Millones de Soles)

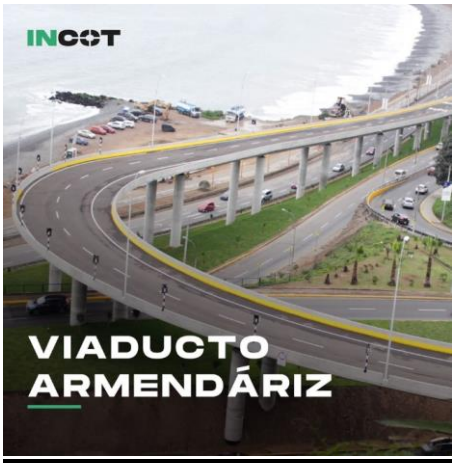

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Noviembre 2018 – Julio 2019

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472

Descripción: Viaducto Armendáriz, abarca los distritos de Miraflores y Barranco. Es una obra que involucra actividades de pilotaje, movimiento de tierras, armaduras de acero, zapatas, pilares, andamios falso puente, encofrados de plataforma, muros new jersey, asfaltado, señalización horizontal, vertical, sembrado de áreas verdes y instalación de guardavías.

Cliente: EMAPE

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

OBRA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EL DERBY Y PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN (80´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Marzo 2018 – Noviembre 2018

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472

Descripción: Intercambio vial a desnivel, abarca los distritos de Surco, San Borja y las vías de la Panamericana Sur. Es una obra que involucra, pilotaje, movimiento de

tierras, construcción de pilares, montaje de vigas metálicas y pre fabricadas de concreto.

Cliente: Concesionaria Rutas de Lima

Proyecto: Municipalidad Metropolitana de Lima



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS (18´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Agosto 2016 – Marzo 2018

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472

Puente de 70m de luz con estribos método constructivo caisson finaliza con accesos asfaltados.



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE DE LAMA SULLANA – PIURA (14´000 000 Millones de Soles)

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Mayo 2015 – Febrero 2016

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO (Proyecto de 78´450,520.35 Millones de Nuevos Soles)

CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE CARGA (Proyecto de 15´219,574.36 Millones de Nuevos Soles)

OBRA: Terminal de Pasajeros – Distrito San Andrés – Provincia Pisco – Región Ica

Fecha: Enero 2014 – Mayo 2015

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

EDIFICACION MULTIFAMILIAR VERDEA (Proyecto de 14 Millones de Soles)

OBRA: Construcción de Edificación Multifamiliar Verdea – Miraflores – Lima

Cargo: Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Fecha: Setiembre 2013 – Diciembre 2013

Referencia:

Recursos humanos

Lesly Ortiz celular: 986646472



SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION PERU S.A.

(Certificado en Iso 9001:2008, Iso 14001:2004, Ohsas 18001:2007)

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES RIMAC Y HUASCAR CON CARROS DE AVANCE PARA DOVELAS SUCESIVAS DEL TREN ELECTRICO DE LIMA TRAMO 2 DE LINEA 1
Cargo: Supervisor de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Referencia: Jefa de Recursos Humanos – Angélica Vásquez – Telf. 989009235
Fecha : Junio 2013 – Setiembre 2013

SEDAPAL CENTRO OPERATIVO LA ATARJEA
Equipo Mantenimiento de Planta (EMP)
Fecha: Noviembre 2012 – Marzo 2013
Cargo: Supervisor de Medio Ambiente

Referencia: Ing. Gustavo Molero Ibañez-Jefe Equipo Mantenimiento de Planta 945262426

SEDAPAL - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y CALLAO

Equipo Gestión Ambiental
Fecha: Mayo 2012 – Octubre 2012
Referencia: Ing. Lizbeth Cortez García- Analista Ambiental Principal Nextel: 837*3618

1.- Ejecución de las actividades programadas en el Plan Ambiental

- Monitoreo de Cámaras de Rebombeo.- se monitoreó cámaras de rebombeo de los distritos de Lima y Callao.
- Monitoreo de Emisiones Contaminantes de Vehículos Automotores.- se utilizo equipo analizador de gases marca BOSCH en unidades propias y/o contratadas, con motor diesel o gasolina. Base legal D.S N°047-2001-MTC-LMP de emisiones contaminantes.
- Elaboración de Plan de Contingencia: Derrame de Residuos Sólidos en el Manejo y Disposición final para actividades de Mantenimiento de redes de alcantarillado con Hidrojet.

- Elaborar Protocolo para medición de olores en cámaras de desagüe.- medición de olores usando la metodología olfatométrica y clasificación de nivel de intensidad de olor.
- Inspección de la Reserva Ecología del Rio Rímac.- inspección ambiental cuenca baja del rio Rímac.

2.- Desarrollo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental

- Inspección Ambiental a obra.- verificando en campo el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del EIA aprobado por el Ministerio de Vivienda en cumplimiento a la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.
- Elaborar informe de inspección ambiental al canal de riego Nieveria en Huachipa.

3.- Verificación de cumplimiento Legal Ambiental.

- Declaración del consumo de agua, energía eléctrica, papel, combustible y residuos sólidos en la página Web del MINAM y SEDAPAL.
- Verificación de cumplimiento de la legislación ambiental en auditorías internas.- participando en calidad de observador, asistiendo al profesional en la verificación del cumplimiento de legislación ambiental.

4.- Desarrollo del Programa de Sensibilización Ambiental.

- Encuesta de sensibilización ambiental.- Se entregó encuesta al personal de SEDAPAL para medir el grado de sensibilización del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

CONSULTORA DE SST Y MEDIO AMBIENTE ASESOREHS S.A.C

Referencia: Ing. CIP Jennifer Faura Urrutia RPC 956268960
www.asesorehs.com.pe
Fecha: Marzo 2012 – Mayo 2012

Capacitación, consultoría, auditoria en el ámbito ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Desarrollo de Procedimientos, matrices IPERC, planes de contingencia, programas de sst para las entidades del sector público y privado.

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C (A Bureau Veritas Group Company)

Fecha: Setiembre 2011 – Diciembre 2011

- Área de Operaciones y Medio Ambiente (OPMA).- desempeñando labores de monitoreo ambiental de agua, aire, suelo para empresas del sector minero, pesquero, agrícola.

Diplomado:

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional - CESAP

- Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Interpretación de la Norma OHSAS 18001:2007.
- Normativa Nacional e Internacional en Materia de SSO.
- Psicología Aplicada a la Seguridad Ocupacional.
- Identificación, Análisis, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.
- Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
- Plan de Respuesta a Emergencias.
- Controles de Higiene Ocupacional.
- Gestión de Sustancias Químicas y Residuos.
- Ergonomía Ocupacional.
- Estudio Antropométrico Humano.
- Inspecciones de Seguridad
- Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diplomado: "Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento y Liderazgo Personal"

- Liderazgo y Excelencia – El crecimiento personal
- Psicología del trabajo
- Introducción a la seguridad basada en el comportamiento (SBC)
- Percepciones, personalidad y comportamiento
- Estudio y análisis del comportamiento seguro
- Comportamientos problemáticos: Causas y soluciones
- Implementación de los procesos de la SBC

Cursos y certificados

- Interpretación y formación de auditor interno del sistema de gestión integrado de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 – AÑO 2021
- Tecsup "**Gestión Ambiental**" (matriz de evaluación de riesgos ambientales) – año 2011
- Tecsup "**Evaluación del Impacto Ambiental**" (metodología de identificación de impactos ambientales, uso de matriz leopold) – año 2010
- Certificado DAAI programa de capacitación orientado a fortalecer la gestión ambiental industrial en las regiones en el marco de las transferencias de funciones y competencias ambientales.
- Certificado asistencia XVI Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental año 2006 (contaminación del agua, desarrollo sostenible)
- Taller Sistemas de Información Geográfica para los Procesos de Zonificación Ecológica y Económica-Ordenamiento Territorial-EAP Geografía UNMSM
- **Cursos Rímac Seguros:**
  - Prevención de trabajos en altura

- IPERC
- Trabajos de Soldadura Eléctrica
- Conceptos básicos en la seguridad de construcción

Computación e Idiomas

- Ingles Avanzado Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao (CIUNAC).
- MS EXCEL nivel avanzado CEPS-Universidad Nacional de Ingeniería
- MS EXCEL FINANCIERO Y CONTABILIDAD CEPS- UNI
- Microsoft Office 2007 (Windows, Word, Excel, Access, Power Point)
- Autocad CEPS-UNI
- Microsoft Project 2010 – CEPS- UNI

INCOT

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/12/2021 hasta el 31/05/2022, como **JEFE DE SEGURIDAD** en la obra:

"Creación del paso a desnivel en la intersección de la Av. Las Palmeras – Av. Javier Prado Este – Av. Golf de Los Incas (Ovalo Monitor)"

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

FELIPE NAVARRO LLOSA
Apoderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

INCOT

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:


Por el presente documento, certificamos que el señor(a):

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 02/04/2018 hasta 31/12/2019, como **JEFE SSOMA**, en la obra: **"INTERCAMBIO VIAL EL DERBY – SAN BORJA NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN"**.

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 02 de enero de 2020



(+511) 349 38 38
hola@incot.com.pe

www.incot.com.pe

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/08/2016 hasta el 31/03/2018, como **JEFE DE SSOMA** en la obra:

"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS"

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

FELIPE NAVARRO LLOSA
Apoderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor:

MUÑOZ VALDEZ CHESSTER AGUSTO

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/05/2014 hasta el 29/02/2016, como **JEFE DE SEGURIDAD** en la obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. JOSE DE LAMA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. DOS DE MAYO Y OVALO"

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

FELIPE NAVARRO LLOSA
Apoderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado
INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

REPVBLICA DEL PERV

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional del Callao

Por cuanto, el Consejo Universitario:

Con fecha **20** *de* **Julio** *del* **2012** *ha conferido el Titulo Profesional de:* **Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales**

a Don(ña) **Chessler Agusto Muñoz Valdez**

Por tanto, se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en el Callao el **23** *de* **Julio** *del* **2012**

Mg. Ing. CHRISTIAN SUAREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

Dr. MANUEL A. MORI PAREDES
RECTOR

Mg. MARIA TERESA VALDERRAMA ROJAS
DECANO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Consejo Departamental de Lima

extiende en la fecha el presente

DIPLOMA

Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales - Reg. CIP N° 141210

Chesster Agusto Muñoz Valdez

En reconocimiento de su condición de

MIEMBRO ORDINARIO

de la orden

San Isidro, 26 de Noviembre del 2012

Ing. CIP Francisco Aramayo Pinazo
DECANO

Ing. CIP Ruben Gómez Sánchez Soto
DIRECTOR SECRETARIO

Responsable de Calidad

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RESPONSABLE CALIDAD**
Nombre y Apellidos:	Erik Javier Barzola Hinostroza
Carrera Profesional:	Ingeniería Civil - CIP N° 128788
Experiencia General:	5.27 años
Experiencia Similar:	3.85 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Contratación del Servicio de Accesos, Plataformas y Movimiento de Tierras Sección 1 para el Río Cañete (Paquete 5). **Actividades**: Movimiento de tierras, estructuras de concreto, construcción de diques, construcción de canales, enrocado de protección, defensa ribereña.	Responsable de Calidad	28/08/2023	21/02/2024	0.48
2	Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Abancay. **Actividades**: Movimiento de tierras, terraplén, pontones.	Especialista en Calidad	1/09/2021	30/05/2022	0.74
3	Construcción del Puente Virú (Km 500+200 de la Carretera Panamericana Norte). **Actividades**: Movimiento de tierras, enrocado de protección, conformación de defensa ribereña, obras de concreto armado.	Jefe de Calidad	1/02/2021	30/08/2021	0.58
4	Construcción de la Carretera Costanera, El Arenal - Punta Bombón. **Actividades**: Movimiento de tierras, enrocado de protección, obras de concreto armado.	Ingeniero Especialista en Calidad	1/08/2020	30/12/2020	0.41
5	Obra Carretera Satipo – Mazamari DV Pangoa Puerto Ocopa. **Actividades**: Movimiento de tierras, concreto reforzado para puentes.	Jefe de Control de Calidad	24/06/2013	31/03/2014	0.77
6	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay, Tramo: Km. 1+550 (Av. Los Chancas) – Lircay **Actividades**: Movimiento de tierras.	Supervisor Control de Calidad	01/05/2015	15/03/2016	0.87
				Experiencia Total Similar	**3.85**

SR: ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA
Dirección: Calle los Treboles 216 Urb Recaudadores Salamanca de Monterrico Ate - Lima
Teléfonos: RPC: 991040459
Correo personal: ericssonjbcivil@hotmail.com
Linkeldn : https://www.linkedin.com/in/erik-barzola-hinostroza-77138770



Titulado y colegiado en la carrera de Ingeniería Civil con estudios de pre factibilidad, gestión de la producción en proyectos de construcción y sistemas integrados de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad laboral y responsabilidad social) con experiencia en empresas constructoras, mineras y afines. Persona proactiva y organizada; con capacidad de liderazgo, comunicativo y poder trabajar en equipo, desenvolvimiento para trabajar con responsabilidad en la obtención de resultados con altos niveles de satisfacción y eficacia además con facilidad para adaptarse a cambios y aprender conceptos con metodologías nuevas. Con el objetivo de destacar en altos cargos funcionarios.

***DATOS PERSONALES**:*

FECHA DE NACIMIENTO	*: 2 DE JULIO 1982*
LUGAR DE NACIMIENTO	*: LIMA*
DOMICILIO ACTUAL	*: CALLE LOS TREBOLES 216 - URB RECAUDADORES SALAMANCA ATE - LIMA*
DNI	*41551358*
ESTADO CIVIL	*: CONVIVIENTE*

INFORMACION ACADEMICA:

PRIMARIA-SECUNDARIA	*: COLEGIO PARTICULAR INGENIERIA*
SUPERIOR	*: UNIVERSIDAD RICARDO PALMA*
TITULO PROFESIONAL	*: INGENIERIO CIVIL*
NUMERO DE COLEGIATURA	*: CIP N° 128788*
FECHA DE COLEGIATURA	*: 09-08-2011*

EXPERIENCIA LABORAL:

- **PERIODO LABORAL 25.08.2023 AL PRESENTE**

EMPRESA : OBRASCÓN HUARTE LAIN, S. A	OHLA Perú

AREA : CALIDAD
CARGO : RESPONSABLE DE CALIDAD

PROYECTO : "SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE (PAQUETE 5)"

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, CONFORMACION DE DIQUES, ALCANTATILLAS, CANALES ACCESOS.

- Coordinación en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.
- Coordinación de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del contratista bajo minutas de seguimiento
- Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.
- Elaboración de Informes semanales y mensuales según la programación de Notificaciones de inspección -NPI y las Notificaciones de prueba y resultado – NRP.
- Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)
- Aseguramiento para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad
- Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente.
- Gestión de No Conformidades internas halladas en el la obra para mejorar nuestros procesos constructivos.
- Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.

- **PERIODO LABORAL 24.01.2023 AL 26.06.2023**

EMPRESA : CONSORCIO CONURMA CONSULGAL	CONSORCIO CONURMA CONSULGAL

AREA : CALIDAD
CARGO : GERENTE SUPERVISOR DE CALIDAD

PROYECTO : "SERVICIO DE SUPERVISOR DE CALIDAD Y SUPERVISION SSOMA DEL PAQUETE 4 DEL PROGRAMA PEIP-EB, QUE CONSISTE EN UN CONTRATO NEC4 ECC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 11 ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA"

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS, ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO.

- Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestión y realizando el aseguramiento de calidad basados en lo aprobado por el cliente de obra.
- Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades semanales y mensuales ante el Supervisor – Cliente.
- Coordinación en reuniones semanales de alertas tempranas y de progreso para identificar las fortalezas y debilidades por el contratista para generar alertas al cliente de obra.
- Coordinación de reuniones semanales para verificar los entregables de Calidad y seguridad del contratista bajo minutas de seguimiento
- Cumplir con los entregables del contrato mediante los alcances del proyecto mediante las alertas tempranas y seguimiento de las Notificaciones de defecto.
- Elaboración de Informes semanales y mensuales según la programación de Notificaciones de inspección -NPI y las Notificaciones de prueba y resultado – NRP.

- **PERIODO LABORAL 27.07.2022 AL 28.02.2023**

EMPRESA : CONSORCIO SALUD DEL CENTRO	中国电建 POWERCHINA | 中国水电 SINOHYDRO

AREA : CALIDAD
CARGO : ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA,

DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURAS, ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS, EQUIPAMIENTO.

- Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)
- Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad
- Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente
- Gestión de No Conformidades halladas en el obra fomentar y así para mejorar el procesos constructivos.
- Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.
- Seguimiento y cumplimiento de auditorías internas y externas programadas.
- Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados para sustentar con informes.
- Coordinación directa con la Supervisión de obra para programar liberaciones mensuales cumpliendo los objetivos de producción.
- Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de control.

Logros:

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos de las Especificaciones Técnicas y de las normas de construcción aplicables para el Proyectos.
Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos mediante un plan de gestión de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada especialidad además de optimizar los procesos velando por su instalación y funcionamiento.

➢ **PERIODO LABORAL 01.09.2021 AL 31.05.2022**

EMPRESA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD - SUCURSAL DEL PERU	中铁隧道局集团有限公司秘鲁分公司 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU

AREA : CALIDAD
CARGO : ING ESP. DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : "LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY". CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA CORTES BANQUETAS, MEJORAMIENTOS DE SUBRASANTE TERRAPLEN BASE SUBBASE A NIVEL SE ASFALTO, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS MARCO Y TMC, MUROS DE SUELO REFORZADOS MUROS C.A Y PONTONES),

RESPONSABILIDADES:

- Cumplir los requisitos del expediente técnico mediante las herramientas de gestión y realizando el aseguramiento de calidad con los formatos y procedimientos de calidad.
- Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y las actividades de Obras de Arte en general.
- Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.
- Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en cada proceso ejecutado.
- Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.
- Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.

- **PERIODO LABORAL 01.02.2021 AL 30.08.2021**

EMPRESA : SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONESSUCURSAL PERU.	SUDINCO

AREA : CALIDAD
CARGO : JEFE DE CALIDAD
PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VIRÚ KM 520 + 200 DE LA RED VIAL N°4: PATIVILCA – SANTA - TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY - EMPALME R01N"

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, CONSTRUCCION DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO, OBRAS DE ARTE (ZAPATAS PILARES LOSA COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO, PUENTE DELONGITUD DE PUENTE 100 METROS.

RESPONSABILIDADES:

- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el estudio de ingeniería EDI y las Especificaciones Técnicas del proyecto.*
- *Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para Movimiento de tierra, Pilotajes y de las civiles en general.*
- *Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.*
- *Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en cada proceso ejecutado.*

- *Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales*
- *Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.*

➢ **PERIODO LABORAL 01.08.2020 AL 30.12.20**

EMPRESA : OBRAS DE INGENIERIA SA	OBRAINSA

AREA : CALIDAD
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD
PROYECTO : CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA, OBRAS DE ARTE (CUNETAS, ALCANTARILLAS, MUROS REFORZADOS MUROS C.A), COLOCACION DE GEOTEXTIL PARA CONFORMACION DE ENROCADO, CONSTRUCCION DEL PUENTE TAMBO.

RESPONSABILIDADES:

- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y operativos generales y específicas, conjuntamente con los planos aprobados según el estudio de ingeniería EDI y las Especificaciones Técnicas del proyecto.*
- *Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y de las obras civiles en general.*
- *Asegurar los procesos y requisitos del cliente con los registros y formatos mediante protocolos de liberación para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.*
- *Controlar y asegurar los entregables del proyecto, realizando el control de calidad respectivo en cada proceso ejecutado.*
- *Validación de los ensayos y pruebas de laboratorio, cumpliendo con la calidad de los materiales*
- *Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.*

➢ **PERIODO LABORAL : 01.08.2019 al 15.05.2020**

EMPRESA : CONSORCIO SACYR - AJANI	sacyr AJANI

AREA : CALIDAD
CARGO : INGENIERO DE CALIDAD
PROYECTO :"PRIMARY CRUSHER BUILDIN AND OVERLAND CONVEYORS"
CLIENTE : ANGLO AMERICAN - MINA QUELLAVECO

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, COLOCACION DE CONCRETO DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO PARA MONTAJE Y CONFORMACION DE ESTRUCTURAS DEL CHANCADOR PRIMARIO, BASES PARA FAJA DE TRANSPORTADORA OVERLAND, CONSTRUCCION PEDESTALES DE BASE PARA MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICAS Y MISCELANEOS.

Responsable Engineer of Quality Assurance
•Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes de Puntos de Inspección, Procedimientos, etc.)
• Aseguramiento de calidad para los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad
• Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente
• Gestión de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos constructivos.
• Identificar y reportar las causas de las No Conformidades, implementación de Acciones Correctivas y Preventivas.
• Seguimiento y cumplimiento de auditorías internas y externas programadas.
• Validar resultados de laboratorio y seguimiento de resultados ´para sustentar con informes.
• Coordinación directa con la Supervisión de obra para programar liberaciones mensuales cumpliendo los objetivos de producción.
•Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de control.
**Proyecto bilingüe (Inglés/Español)*
**Supervisión SMI - Fluor*

Logros:

- Se garantiza el cumplimiento de los entregables parciales mediante el control mensual de indicadores de costos KPI y cumpliendo los objetivos mensuales indicados para el proyecto, además se establece una estrategia de aseguramiento y control de la calidad mejorando los procedimientos de gestión y procedimientos operativos para difundir al personal empleado y obrero sensibilizando la importancia de la calidad en el proyecto.
- Se logro obtener un resultado satisfactorios en las auditorias programadas donde tuve que motivar al personal en mejora de sus procesos y fortaleciendo con oportunidades de mejoraen capacitaciones de Calidad.

- **PERIODO LABORAL : 17.02.2018 al 30.06.2019**

EMPRESA : CONSORCIO SICUANI II **CONSORCIO: EMPRESAS CONSORCIO SULLANA II**	NEPTUNO CONSTRUCTORA ERALMA

AREA : CALIDAD
CARGO : INGENIERO DE CALIDAD
PROYECTO :"AMPLIACION DE LA EDIFICACIONES PARA SU MEJORAMIENTO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA- II ETAPA"

ENTREGABLES DEL PROYECTO:

Responsabilidades:

- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad para asegurar y velar por el aseguramiento de calidad del proyecto.*
- *Realizar seguimiento de la implementación del plan de calidad aplicado al proyecto.*
- *Asegurar los procesos y requisitos del cliente basado en registros y formatos para validar las actividades con los procedimientos ante el Supervisor – Cliente.*
- *Seguimiento y Cierre de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.*
- *Coordinación con el cliente sobre los avances del proyecto en reuniones semanales, además de proponer soluciones técnicas con relación del proyecto basado a la calidad final de los procesos, con los especialistas de: Estructuras, Sanitarios, Eléctrico, Electromecánico y de comunicaciones*

Logros:

Se garantizó el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas de construcción aplicables para el Proyectos.
Se verifico permanentemente la eficiencia en las operaciones a través del control de procesos mediante un plan de gestión de calidad y verificar la trazabilidad de las actividades de cada especialidad además de optimizar los procesos velando por su instalación y funcionamiento.

- **PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2017 – al 31.Enero 2018**

EMPRESA : GRAÑA Y MONTERO	Grupo Graña y Montero

AREA : CALIDAD
CARGO : INGENIERO DE CALIDAD
PROYECTO : LINEA AMARILLA VIA EXPRESA – CLIENTE LAM SAC

RESPONSABILIDADES:

- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad*
- *Participación de auditorías internas programadas en Obra.*
- *Responsable para identificar y optimizar los procesos de la obra en general para mejorar el resultado final del producto.*
- *Seguimiento de No Conformidades (NC), Productos No Conformes (PNC) identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas.*
- *Asegurar el cumplimiento con la ingeniería aplicada por nuestro cliente y requisitos de lo establecido por el Proyecto.*
- *Validar resultados de laboratorio para revisión y aprobación del cliente.*
- *Control de inspecciones y liberaciones en terreno con actividades de procesos siguientes: Suelos, acero, concreto e instrumentación con ensayos no destructivos y verificar trabajos electromecánicos.*

Logros:
Se garantizó el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas aplicables al Proyecto.

Cumplir con las exigencias del proyecto marcando mejoras ante la evaluación de las auditorías internas de obra y mejorar nuestros procesos de gestión y operacionales en general.

- **PERIODO LABORAL : 01 de Abril 2016 – al 31 de Noviembre 2016**

EMPRESA : SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	

AREA : CALIDAD

CARGO : SUPERVISOR DE CALIDAD
PROYECTO : AMPLIACION DE REFINERIA TALARA OBRAS CIVILES Y MOVIMIENTO DE TIERRA CR: 02070
ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS METALICAS.

RESPONSABILIDADES:

- *Control de inspecciones y liberaciones en terreno con las actividades de procesos siguientes: Movimiento de tierra, acero, concreto e instrumentación con ensayos no destructivos y verificar el material procesado en extracción y en chancadoras para obtención de los materiales para el cumpliendo de los requisitos del proyecto.*

- *Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, con elaboración de registros y Protocolos de Control de calidad, Dossier de Calidad.*
- *Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad*
- *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente establecidos.*
- *Validar resultados de laboratorio para revisión y aprobación del cliente. Evaluación y homologación de Proveedores con seguimiento de gestión documental. Gestión de No Conformidades identificación e implementación de las causas de las No Conformidades para poder evaluar acciones Correctivas y Preventivas*.

LOGROS:
Se mantuvo una adecuada interacción con el cliente en reuniones semanales donde el cliente quedo satisfecho en los procesos y trabajos culminados además se difundió las lecciones aprendidas en el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa. Logre de mejorar mis objetivos emprendidos en el transcurso del proyecto como de aumentar mis conocimientos en la inspección y control del montaje de estructuras electromecánicas.

- **PERIODO LABORAL : 06 de Agosto 2014 – al 15 de Marzo 2016**

EMPRESA : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A	

AREA : CONTROL DE CALIDAD

CARGO : SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO : REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES(ALCANTARILLAS TMC MARCO, MUROS C.A) MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA CALZADAS, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

PROYECTO : AMPLIACION DE PRESA DE RELAVES - STATER DAM CC: K-170
CLIENTE : **CERRO VERDE**
ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE RELLENOS DE DRENAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, CONSTRUCCION RELLENOS PARA CONFORMACION DE PAD VERIFICACION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS GEOSISTETICOS.

RESPONSABILIDADES:

- *Planificación de las estrategias a utilizar en el proyecto (Plan de Calidad, Planes dePuntos de Inspección, Procedimientos, etc.)*
- *Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y de las civiles en general.*
- *Control de inspecciones y liberaciones de actividades en procesos: Suelos, acero y concreto, además de verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumpliendo de los requisitos del proyecto.*
- *Liberación de estructuras Civiles del Proyecto, realización de registros y Protocolos de Control*
- *Aseguramiento de calidad en los procesos de Calidad: analizar, implementar y monitorear el Sistema de Gestión de Calidad*
- *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente*
- *Evaluación y homologar de Proveedores*
- *Gestión de No Conformidades halladas en el proyecto para mejorar en nuestros procesos constructivos..*
- *Identificar y reportar las causas de las No Conformidades*
- *Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas*
- *Realizar y organizar auditorias internas y externas*
- *Validar protocolos de liberación generados por los ingenieros de Control de Calidad*
- *Validar resultados de laboratorio*
- *Responsable de la definición de TAGs Civiles*
- *Responsable del Cierre documental en las Carpetas TOP (TurnOverPackage / Dossier)*
- *Velar por la Mejora Continua del proyecto*
- *Coordinación directa con la Supervisión y el Cliente para programar objetivos de producción.*

LOGROS:

Se mantuvo una adecuada interacción con el cliente donde quedó plasmada la satisfacción en los procesos y trabajos terminados además se dio fomento las lecciones aprendidas en el proyecto dando un realce a la mejora continua de la empresa.

Empresa : INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS GENERALES S.A (ICCGSA)	ICCGSA

AREA : SUB GERENCIA DE CALIDAD
CARGO : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
PROYECTOS : REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SATIPOMAZAMARI PUERTO OCOPA - CONSORCIO VIAL JUNIN.

ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES, COLOCACION DE PILOTES DE CONCRETO REFORZADOS PARA PUENTES.

RESPONSABILIDADES:

- *Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad (SGC).*
- *Coordinación con el cliente sobre los avances del proyecto, además de proponer soluciones técnicas con relación del proyecto basado a la calidad final de los procesos, con los especialistas de suelos y pavimentos.*
- *Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medición y Prueba (Calibración y Trazabilidad).*
- *Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de obras civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del proyecto.*
- *Asegurar y hacer cumplir los procedimientos constructivos para movimiento de tierra explanaciones y de las civiles en general.*
- *Verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumpliendo de los requisitos del proyecto.*
- *Asegurar el cumplimiento de las EETT y requisitos del Cliente Evaluación y homologar de Proveedores Gestión de No Conformidades*
- *Identificar y reportar las causas de las No Conformidades*
- *Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas*
- *Realizar y organizar las auditorías internas y externas*
- *Validar protocolos de liberación generados por los ingenieros de Control de Calidad*
- *Validar resultados de laboratorio para el cliente Supervisor*

➢ **PERIODO LABORAL : 01 de Agosto 2011 al - 30 de Marzo 2013**

EMPRESA : COSAPI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	

AREA : CALIDAD
CARGO : INGENIERO DE CALIDAD QA/QC

PROYECTOS:

- **PROYECTO TOROMOCHO, CONTRATO No. CC-04: CONCRETE PLACEMENT WET AREA.**
  ENTREGABLES: OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ACTIVIDAD MECÁNICAS Y ELÉCTRICA

- **PROYECTO: REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN TRAMO: Km 52+000 a CELENDÍN.**

  ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

- **PROYECTO: REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EL DESCANSO – LANGUI TRAMO: EL DESCANSO AL Km 20+000. CONSORCIO.**

  ENTREGABLES DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS CIVILES ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTOS DE PLATAFORMA DE CALZADAS, COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE, COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES PARA SUBDRENES.

  RESPONSABILIDADES:

  - *Gestionar el sistema de gestión de calidad del proyecto.*
  - *Elaborar el plan de gestión de calidad del proyecto.*
  - *Verificar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de sistema de gestión de calidad (SGC).*
  - *Establecer normas de control de calidad para los procesos.*
  - *Participación de auditorías internas programadas en Obra.*
  - *Responsable de la implementación de indicadores del área, que permita identificar y optimizar las oportunidades de mejora.*
  - *Responsable de elaborar los informes semanales y Mensuales de los proyectos al*

Residente y Gerente del Proyecto.

- *Responsable de cumplir con los compromisos de calidad para con el Cliente. Según la Programación Semanal de Producción, cumpliendo el plan Semanal de Muestreo, Pruebas y Ensayos.*

- *Elaborar un Plan y seguimiento de Control de Equipos de Medición y Prueba (Calibración y Trazabilidad).*

- *Liberación en los procesos de movimientos de tierra, verificar el material procesado en chancadoras para obtención de los materiales para el cumpliendo de los requisitos del proyecto.*

- *Supervisar el avance con controles de Calidad y llevar el control del desarrollo de obras civiles, movimiento de tierra en explanaciones cortes y mejoramiento del proyecto*

LOGROS:

- *Se mantuvo una adecuada interacción interna con las áreas para el proyecto ejecutado. Además se propuso acciones correctivas de mejora de nuestros procesos al proyecto con seguimientos respectivos para tener confianza con el cliente y se obtuvo la satisfacción del cliente.*

CURSOS CURRICULARES APLICADOS EN PROGRAMAS INFORMATICOS:

- MICROSOFT OFFICE: WORD, POWER POINT, EXCEL (Nivel Avanzado)
- DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA: AUTOCAD 2018
- TOPOGRAFIA: MANEJO DE EQUIPOS SATELITAL GPS , ESTACION TOTAL Y NIVEL.
- DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EN: AUTODESK CIVIL 3D.
- PROGRAMA ORACLE - ACE 2017.
- PROGRAMA S10 -2018

IDIOMAS :

- INGLES BASICO - INTERMEDIO – FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS "UNIVERSIDAD RICARDO PALMA"

MAESTRIA:

- MASTER INGENIERÍA VIAL CON MENCIÓN EN CARRETERAS, PUENTES Y TÚNELES – UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. – EGRESADO – 2023

DIPLOMADOS Y CERTIFICADOS:

- DIPLOMADO EN SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015– BS GRUPO PERU
- CERTIFICADO SIX SIGMA BLACK BELT 2013 - American Society for Quality (ASQ) -BS GRUPO – PERU
- CERTIFICACION EN: MEJORA DE PROCESOS, ANALISIS DE PNC, AUDITORIAS INTERNAS – INSTITUTO ICONTEC – COLOMBIA
- CERTIFICADO ASNT ORG - VISUAL TESTIS-LEVEL II, REGISTER NUMBER 20200119-002-VT-PW
- DIPLOMA DE ESTUDIO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO ISO/ IEC 17025. – CERTIFICADO 01.02.2021- PUCP
- CERTIFICADO DE FORMACIÓN COMO AUDITOR INTERNO ISO/IEC17025 - CERTIFICADO 01.02.2021 –PUCP
- CERTIFICADO CONTRATOS NEC4 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS – CEO ACADEMY
- CERTIFICADO RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HOSPITALARIAS– CEO ACADEMY

ASPIRACIONES:

Desempeñar un cargo como Especialista de una Gerencia de Calidad y ampliar mis conocimientos en el área de Gerencia de proyectos así como en proyectos en el ámbito nacional o internacional, además de compartir las lecciones aprendidas en diversos proyectos para incrementar la rentabilidad de la institución o empresa en la que me encuentre.

APTITUDES :

Creativo, Liderazgo, Empatía, Honestidad, Colaboración y capacidad para trabajar en equipo, dar soluciones técnicas y metodologías de gestión.

REFERENCIAS LABORALES:

Nombre Profesional	***Cargo***	***Empresa***	***Contacto***
Raúl Plascencia	*Especialista Suelos Pavimentos*	*CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD - SUCURSAL DEL PERU*	*918066285*
Hugo Paullo	*Residente de Obra*	*Sudamericana Integral de Construcciones Sucursal Perú SA*	*957593949*
Enrique Cabrera	*Residente de Obra*	*Obras de Ingenieria SA*	*970836202*
Wagner Mejia	*Jefe Calidad*	*Consorcio SACYR AJANI*	*902769641*
Giancarlo Gonzales	*Jefe de Calidad*	*Ingenieros Contratistas generales S.A ICCGSA*	*942521555*

OHLA
Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Barzola Hinostroza Erik Javier,** identificado con **D.N.I. N° 41551358** laboró en nuestra Empresa desde el **28 De Agosto Del 2023** hasta el **21 De Febrero Del 2024,** desempeñando el cargo de **Responsable De Calidad** en la obra: **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS SECCIÓN 1 PARA EL RÍO CAÑETE (PAQUETE 5)"**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 29 De Febrero Del 2024

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTÍNEZ
JEFE DE RR.HH.

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701
Miraflores, 15074 – Lima
T. (+51) 1 625 7200
www.ohla-group.com

中铁隧道局集团有限公司秘鲁分公司
CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente dejamos constancia que: El señor(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado con DNI:41551358

Ha trabajo para nuestra empresa en el Proyecto: "**CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY"**, demostrando eficiencia en las tareas encomendadas, desde la fecha del 01 de Setiembre de 2021 al 30 de Mayo 2022, desempeñándose como **ESPECIALISTA EN CALIDAD.**

Sin otro particular, se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes.

Abancay, 30 de Mayo de 2022

Atentamente

CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD - SUCURSAL DEL PERÚ
Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Abancay

ZHIMIN PEI
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A SUCURSAL PERU con RUC N° 20600419839, certifica que:

El Sr. **BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER,** identificado con DNI **41551358**, ha laborado en nuestra empresa ocupando el cargo de **JEFE DE CALIDAD** desde el 01 de Febrero del 2021 hasta el 30 de Agosto del 2021 en la obra:

"Construcción del Puente Virú (km 520+200 de la Carretera Panamericana Norte) ", el cual consiste en 3 tramos (dos de 40 m c/u y uno de 30 m), Longitud total: 110 m.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

San Isidro, 02 de Setiembre 2021.

Gustavo Llanos Huanca
Sudamericana Integral De Construcciones
Sudinco S.A. Sucursal Perú
JEFE DE RRHH

CERTIFICADO DE TRABAJO


Certificamos que: El señor(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER identificado con DNI:41551358

Ha trabajo para nuestra empresa en el Proyecto: "**CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTANERA, EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN",** donde a demostrando eficiencia y cumpliendo con sus actividades de su especialidad, desde el 01 de agosto de 2020 al 30 de diciembre 2020, desempeñándose como **INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD.**

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea convenientes.

Mollendo, 30 de Diciembre del 2020

Atentamente



CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente, dejamos constancia que **BARZOLA HINOSTROZA ERIK JAVIER,** identificado con D.N.I 41551358 trabajo en nuestra compañía GYM S.A desde el 3 agosto de 2017 hasta 31 de enero de 2018 desempeñando el cargo de INGENIERO DE CALIDAD en el Proyecto "Vía Expresa Línea Amarilla"

Sin otro particular, se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines que el interesado considere convenientes.

Lima, 31 de Enero del 2018

GYM S.A

MARIA DEL CARMEN DAVILA RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
GyM S.A.

JJC
GRUPO

Certificado

El que suscribe en representación de JJC Contratistas Generales S.A . Certifica que el (la) Sr(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER, laboro para nuestra organización del 01/05/2015 al 15/03/2016 en el siguientes Proyectos

PROYECTO/SEDE	CARGO /FUNCIÓN	DESDE	HASTA
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY, TRAMO: KM. 1+550 (AV. LOS CHANCAS) – LIRCAY	SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD	01/05/2015	15/03/2016

El (la) Sr(a) BARZOLA HINOSTROZA, ERIK JAVIER, presento eficientemente sus servicios en el(los) Proyectos/ indicados:

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 15 de Marzo del 2016

VICTOR MIGUEL DEL SOLAR LAYNES
Departamento de Recursos Humanos

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification
ABE

CERTIFICADO DE TRABAJO

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CON RUC: 20100114187

CERTIFICA QUE:

El Sr. **ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA** DNI: **41551358**

Ha laborado en la Obra Carretera Satipo – Mazamari DV Pangoa Puerto Ocopa, desde el 24 de Junio del 2013 al 31 de Marzo del 2014, desempeñando el cargo de JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

El referido trabajador demostró capacidad, honestidad y responsabilidad en sus tareas que le fueron encomendadas en los siguientes proyectos y periodos:

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

San Isidro 31 de Marzo del 2014.

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JOSE CARBAJAL OLIVERA
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Lima, 31 de Diciembre del 2012

Certificamos que el Sr(a). **BARZOLA HINOSTROZA ERICK JAVIER**, Trabajo para nuestra organización desempeñándose como **ING. DE CONTROL DE CALIDAD** en el proyecto

REFERENCIA

CERTIFICADO DE TRABAJO

C.O 2934

01.02.2012 – 31.12.2012

PROY. ESP. DE INFRAEST. DE TRANSPORTE NACIONAL REHABILIT. Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN, Con ejecución del contrato entre PROVIAS NACIONAL y CONSORCIO COSAPI - JOHESA

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para fines que estime

Atte

COSAPI S.A

RUC 20100082391

Brandon Rafael Fernández Meza

Jefe de Nómina y Riesgos Humanos

Recursos Humanos

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Resolución N° 11-220688 C. U. R.R.U.G.T.
Lima, 09 de Marzo de 2011

El Rector de la Universidad y Presidente del Consejo Universitario:

Visto el expediente de Título Profesional de Ingeniero Civil
y estando a lo aprobado por la Facultad de Ingeniería
y lo acordado por el Consejo Universitario en sesión del 08 de 03 de 2011

RESUELVE:

Artículo Primero.- Conferir el Título Profesional de Ingeniero Civil

a favor de Erik Javier Barzola Hinostroza

Artículo Segundo.- La Secretaría General queda encargada de dar curso a la expedición del diploma respectivo y de efectuar los registros correspondientes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Resolución del Consejo de la Facultad N° 086-2011-FI-D
Resolución del Consejo Universitario N° 11-220688
REGISTRADO
Facultad, Libro N° 007 Folio N° 2811
RRU-UR, Libro N° 076 Folio N° 22055

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Ricardo Palma

Por cuanto: El Consejo Universitario en su sesión

del 08 de Marzo de 2011 ha conferido el

Título Profesional de Ingeniero Civil

Al

Don Erik Javier Barzola Hinostroza

Por tanto le expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, a los 09 días de Marzo de 2011

DECANO DE LA FACULTAD



RECTOR

SECRETARIO ACADÉMICO

SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **ERIK JAVIER BARZOLA HINOSTROZA**
Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° 128788 en cumplimiento de la Ley 28858

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 09 de Agosto de 2011

Ing. CIP Juan Fernán Muñoz Rodríguez
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Hugo Rósulo Lázano Núñez
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

Relacionista Comunitario

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RELACIONISTA COMUNITARIO**
Nombre y Apellidos:	Carlos Steve Banda Quintana
Carrera Profesional:	Sociología - CSP N° 1137
Experiencia General:	5.18 años
Experiencia Similar:	3.25 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay Div. Cochamarca – Empalme PE 3N. **Actividades**: Movimiento de tierras, pontones	Especialista en Relaciones Comunitarias	17/04/2023	31/08/2023	0.37
2	Supervisión del Mejoramiento, rehabilitación y conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial-Lima-Canta-Huayllay Div. Cochamarca – Empalma PE 3N. **Actividades**: Movimiento de tierras, pontones	Especialista en Relaciones Comunitarias	4/04/2022	31/12/2022	0.74
3	Supervisión del saldo de obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Lima – Canta – Huayllay – DV. Cochamarca – Empalme PE 3N;Tramo: Canta – Huayllay de 95.2 KM de longitud, Lima, Junin y Pasco, Perú. **Actividades**: Movimiento de tierras, pontones	Especialista en Relaciones Comunitarias y Mecanismo de Resolución de Quejas	1/11/2019	18/12/2021	2.13
				Experiencia Total Similar	**3.25**

CURRICULUM VITAE

I.– DATOS PERSONALES

Nombres	:	Carlos Steve Banda Quintana
D.N.I.	:	08689152
Dirección	:	Jr. José María Meléndez 141 – Dpto. 302 Urb. Los Cipreses – Cercado- Lima (Altura Universidad Nacional San Marcos) - Perú
Teléfonos	:	(511) 999-655 443 , 928- 551 896
Correo electrónico	:	supervisor_banda@yahoo.es

II.– DESCRIPCION DE PERFIL PROFESIONAL

Sociólogo titulado y colegiado. Especialista en Relaciones Comunitarias en Proyectos Viales y también Especialista en Proyectos de Agua y Saneamiento en zona selva, rural y urbana (PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa 148, Programa Agua Para Todos, Pronasar), también experiencia en Gerencia Social. Además experiencia con comunidades campesinas, negociación con organizaciones sindicales, elaboración de diagnósticos y estrategias sociales, resolución de conflictos, supervisión e intervención social, capacitación con poblaciones de segmentos socioeconómicos C, D y E (urbana y rural) en asentamientos humanos en Lima y provincias.

Capacidad de liderazgo, proactividad, creatividad, adaptación a los cambios, perseverancia, innovación, responsabilidad, logro de resultados, capacidad de gestión, trabajo en equipo y bajo presión. Voluntad de capacitación permanente para ofrecer sugerencias e ideas actualizadas para mejorar o simplificar actividades y/o servicios.

III.– GRADOS Y TITULOS OBTENIDOS

MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL 2017

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Mención en Gestión de Proyectos Sociales
Facultad de Ciencias Sociales

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 2001
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Facultad de Ciencias Sociales

MIEMBRO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERU 2002
Registro Nº 1137

IV.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ (Abril – Agosto 2023)

  "Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay"
  Consorcio Cesel – Cal y Mayor

- Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ (Abril – Diciembre 2022)

  "Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay"
  Consorcio Cesel – Cal y Mayor

- Especialista en Relaciones Comunitarias e Implementación MRQ (Nov. 2019 – Dic. 2021)

  "Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N - Tramo 2: Canta – Huayllay"
  Consorcio Cesel – Cal y Mayor

- Coordinador General de Intervención Social en Consultoría de Obra (Julio 2017 – Feb. 2019)

  "Servicio de Consultoría para la ejecución en Etapa de Inversión a nivel de

Obra del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla - Distrito Cieneguilla"
Licitación Pública Nº 048-2016-Sedapal
Consorcio Virgen del Carmen - Cieneguilla

- Especialista Social en Relaciones Comunitarias (Nov. 2016 – Feb. 2018)

"Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento y de la
Carretera Puerto Bermudez – San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro"
Consorcio Supervisor Puerto Sungaro

- Especialista Social en Relaciones Comunitarias (Marzo – Dic. 2016)

"Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento y de la
Carretera Puerto Bermudez – San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, DV San Alejandro"
Consorcio Supervisor Puerto Sungaro

- Especialista Social en Relaciones Comunitarias (Ene 2014 –Feb. 2015)

"Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento
de la Carretera Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco –
Emp, Ruta 10. Tramo: Santiago de Chuco – Cachicadán – Mollepata – Región La Libertad"
Promoción y Gestión PROMOGEST SAC

- Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en: (Noviembre 2015 - Diciembre 2016)

"Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto:
"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
en los distritos de Ate y Santa Anita"
Concurso Público Nº 030-2015-Sedapal
Consorcio Agua Santa Anita

- Supervisor Social en Programa Nacional de Saneamiento Urbano en: (Diciembre 2014 – (Agosto 2015)

"Supervisión de la Obra Instalación de agua y Alcantarillado de
San Sebastián de Sacra del Distrito de Lampa
Consorcio Kazuki

- Coordinador Social en Programa Nacional de Saneamiento Rural en: (Agosto 2013 - Agosto 2018)

"Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para la instalación,
Rehabilitación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento
de 327 centros poblados del ámbito rural" Grupo Nº 02 – Items 02
Concurso Público Nº 002-2013-PNSR
Consorcio Agua Norte

- Coordinador Social en Programa 148 en: (Agosto 2014 - Setiembre 2015)

"Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo
y Expediente Técnico del proyecto Sectorizacion del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de la Parte Alta de Chorrillos Matriz-Proceres-Chorrillos"
AMC N° 0124-2013-SEDAPAL
derivada del Concurso Público N° 0020-2013-SEDAPAL
Consorcio SYU

- Gerente de Desarrollo Humano y Servicios Públicos (Enero – Julio 2011)

Municipalidad distrital de San Marcos – Huari - Ancash

- Supervisor Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Abril –Noviembre 2010)

"Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de Las Delicias de Villa y Anexos – Distrito de Chorrillos" –
Concurso Publico Nº 0027-2009-SEDAPAL
Consultoría Alpha Consult

- Especialista en Capacitación Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Dic. 2009 – Abril 2010)

"Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Para el
Esquema Paraíso Alto – Sector 308 - Distrito de Villa María del Triunfo" –
Licitación Pública Nº 0005-2009-CO -SEDAPAL-
Consorcio Saneamiento Sur

- Especialista en Capacitación Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Agosto – Dic. 2009)

"Elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico y la ejecución de las Obras del Proyecto: Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en nuevas habilitaciones de las partes altas de Huaycan-Distrito de Ate" – Procedimiento Especial de Selección Nº 0008-2009-SEDAPAL
Consorcio Huaycan I

- Especialista en Intervención Social en Proyectos de Inversión Pública (PIP) correspondientes al PRONASAR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) en: (Marzo _ Abril 2009)

1. "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Monzón (Huanuco)"
   Adjudicación Directa Selectiva N 0012-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT

2. "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados Rinconada y Cerro Lunar (Puno)"
   Adjudicación Directa Selectiva N 0016-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT
   Consorcio Sebastián Rodríguez Martínez - CAA Ing. Consultores E.I.R.L.

- Supervisor Social en Programa "Agua Para Todos" en: (Mayo 2008 _ Mayo 2009)

  "Consultoría para la Supervisión de la Obra:
  Procedimiento Especial de Selección Nº 0009-2006-SEDAPAL
  Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo"
  Procedimiento Especial de Selección Nº 0011-2006-SEDAPAL
  Consultoría Alpha Consult S.A.

V.- CURSOS Y CAPACITACIONES.

Clases Magistrales en Ciencias Sociales — 2023
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales

Conferencia : Estado y Conflictos. — 2013
Conflictividad Socioambiental en el Perú
Colegio de Sociólogos del Perú.

Conferencia : Consulta previa a pueblos indígenas en el Perú. ¿Cuándo va? — 2013
Colegio de Sociólogos del Perú.

Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Social — 2011
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo -
Asociación Benéfica PRISMA.

II Foro Panel : Conflictos Sociales, Inteligencia y Gobernabilidad Democrática en el Perú — 2011
Comisión de Inteligencia
Congreso de la República del Perú

Negociación y Gestión de Conflictos. — 2009
Oficina General de Recursos Humanos.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ONG Cooperación Internacional y Donaciones. FUTURUM ACCTID — 2003
Area de Capacitación en Cooperación Técnica Internacional

Proyectos Sociales de Desarrollo. FUTURUM ACCTID — 2003
Area de Capacitación en Cooperación Técnica Internacional

VI.- IDIOMAS.

Conocimientos de Idioma Inglés – Nivel Avanzado

VII.- REFERENCIAS

Ing. Jorge Salinas : 99844-2524
Representante Legal de Consorcio SYU

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de **Ciencias Sociales**


con fecha 21 *de* Noviembre *de* 2001 *acordó otorgar el Título Profesional de*

Licenciado en Sociología

a Don (ña) **Carlos Steve Banda Quintana**

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 25 *de* Marzo *de* 2002



Registrado a fojas 210 del libro 50

Registrado a fojas 225 del libro 4 de la Facultad

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS SECRETARIA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS RECTORADO

RECTOR

INTERESADO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES E.A.P. SOCIOLOGIA DIRECTOR

DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL

UNION S

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

El Secretario General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que suscribe, CERTIFICA: que este documento es auténtico y ha sido expedido y suscrito por las autoridades competentes de la Universidad, cuya(s) firma(s) son igualmente auténticas.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes.

Lima, 05 ABR 2002

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
SECRETARIA GENERAL

LIC. JOSE AGUSTIN LUQUE BARBA
SECRETARIO GENERAL
DNI.-07348140

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
A388432

A 388432

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales

con fecha 31 *de* Mayo *de* 2001 *acordó otorgar el Grado Académico de:*

Bachiller en Ciencias Sociales Especialidad Sociología

a Don (ña) Carlos Steve Banda Quintana

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Grado Académico, a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 19 *de* Julio *de* 2001



Registrado a fojas 417 del libro 57
Registrado a fojas 335 del libro III de la Facultad

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS SECRETARIA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS RECTORADO

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES E.A.P. SOCIOLOGIA DIRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DECANO

INTERESADO

DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL

UNION ®

A 275284

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

A275284

Colegio de Sociólogos del Perú

Por cuanto, el Sociólogo

Carlos Steve Banda Quintana

ha cumplido con las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes y está inscrito en el Registro Nacional de la Orden, con el Nº 1137

Por tanto,

se expide el presente Certificado, que lo acredita como colegiado y lo faculta para el ejercicio de la profesión en el territorio de la República.

Lima, 10 *de* Mayo *de* 2002

COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERU
DECANO
NACIONAL

Dr. Germaná Cavero
DECANO NACIONAL
Colegio de Sociólogos del Perú

COLEGIO DE SOCIOLOGOS
DECANO
Región Lima-Callao

Lic. Elia Luna Del Valle
DECANA
Colegio de Sociólogos del Perú
Región Lima-Callao

Cal y Mayor y Asociados

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Quien suscribe representante legal de **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL,** Don Victor Hugo Francia Jacobo**.**


HACE CONSTAR:

Que el Licenciado Don **Carlos Steve Banda Quintana,** identificado con **DNI. No 08689152**, desempeño en nuestra empresa como **"ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS"** en la **"Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial–Lima–Canta–Huayllay Div. Cochamarca – Empalme PE 3N"**, en el periodo desde el 17 de abril 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, según contrato de locación de servicios firmado el 17 de abril de 2023.

El servicio prestado es conforme al contrato de consultoría de obra Nº. 077-2014-MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel – Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por conveniente.

Lima, 31 de Agosto de 2023



CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO
Representante Legal
vfrancia@calymayor.com.mx

Cal y Mayor y Asociados

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Quien suscribe representante legal de **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL,** Don Victor Hugo Francia Jacobo.

HACE CONSTAR:

Que el Licenciado Don **Carlos Steve Banda Quintana,** identificado con **DNI. No 08689152**, desempeño en nuestra empresa como **"ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS"** en la **"Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por niveles de Servicios del Corredor Vial–Lima–Canta–Huayllay Div. Cochamarca – Empalme PE 3N"**, en el periodo desde el 04 de abril 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, según contrato de locación de servicios firmado el 04 de abril de 2022.

El servicio prestado es conforme al contrato de consultoría de obra Nº. 077-2014-MTC/20, entre el Proyecto Especial de Infraestructura - Provias y El Consorcio Cesel – Cal y Mayor y Asociados del 18 de agosto de 2014.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea por conveniente.

Lima, 02 de enero 2022

Cal y Mayor y Asociados
CPC Victor Hugo Francia Jacobo
Representante Legal

CPC VICTOR HUGO FRANCIA JACOBO
Representante Legal
vfrancia@calymayor.com.mx

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

CONSTANCIA

El que suscribe, Representante Legal de CESEL S.A., deja constancia que el Sociólogo **CARLOS STEVE BANDA QUINTANA**, identificado con DNI. Nro. 08689152 y registro CSP. Nº 1137, ha prestado servicios profesionales a la Empresa, parte conformante del Consorcio CESEL – CAL Y MAYOR, en calidad de **ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS Y MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS**, asesorando en temas de relaciones comunitarias, en coordinación con el administrador del proyecto PACRI y especialista social de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de Provias Nacional, elaboración de reportes mensuales de incidencias presentadas en el proyecto sobre temas de gestión social de los afectados en el proyecto, para la Gerencia de Transportes, participando en el siguiente proyecto:

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N; TRAMO: CANTA – HUAYLLAY DE 95.2 KM DE LONGITUD. LIMA, JUNIN Y PASCO, PERU.
A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
CLIENTE: PROVIAS NACIONAL

Tiempo de contratación: Desde 01/11/2019 Hasta 18/12/2021

Lima, 28 de diciembre de 2021.

Ing. Marco Montalvo Farfan
Representante Legal
CESEL S.A.

CESEL S.A. Coordinador de Proyecto Ing. Jenny Bardales Olaya

CESEL S.A. Gerente de Recursos Humanos

RH-605-2021

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

Consorcio Supervisor
PUERTO SUNGARO

CERTIFICADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

El que suscribe, M. Sc. Ing. R. Jorge Peñaranda Castañeda, representante legal del Consorcio Supervisor Puerto Súngaro, con RUC N° 20600784804 deja constancia que:

El Sr. **CARLOS STEVE BANDA QUINTANA,** identificado con DNI N° 08689152, con CIP N° 1137 prestó sus servicios profesionales en la empresa, según contrato de locación de servicios, en el proyecto que a continuación se detalla:

Proyecto	: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro – Dv. San Alejandro".
Cliente	: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional del ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
Cargo en el proyecto	: Especialista en Relaciones Comunitarias.
Periodos	: *Etapa de Revisión del Estudio del Proyecto:* 13 de noviembre del 2015 al 12 de diciembre del 2015 *Etapa de Supervisión del Proyecto:* 16 de marzo del 2016 al 18 de febrero del 2018

Se extiende la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

San Isidro, 03 de julio del 2019

M. Sc. Ing. R. Jorge Peñaranda Castañeda
Representante Legal

RR.HH. J.Z.A.

PS-JZ-06
