


	FORMATO B7: HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS										CO-PE-1PE326-CM-HA-003
											Revisión 0
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II										Fecha: 09/03/2022
	PARTE – CUENCA HUAURA										Página 1 de 2

Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
Río: HUAURA
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del Paquete: HABILITACIÓN DE ACCESOS ,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA
Referencia: TDR

Jefe de Topografía	Und.	9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Ingeniero de Planeamiento y costos	Und.	9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Responsable de Calidad	Und.	10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Jefe de Laboratorio de suelos	Und.	9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Jefe de Producción	Und.	9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Jefe/Responsable de Mantenimiento	Und.	9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Administrador de Obra	Und.	9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Jefe de Recursos Humanos	Und.	-										
PERSONAL STAFF - MOI	Und.	122	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	5.0

* Los cargos deben ser definidos por cada Postor de acuerdo a su organigrama. Es indispensable incluir las posiciones claves en el histograma de Mano de Obra Indirecta.

MANO DE OBRA

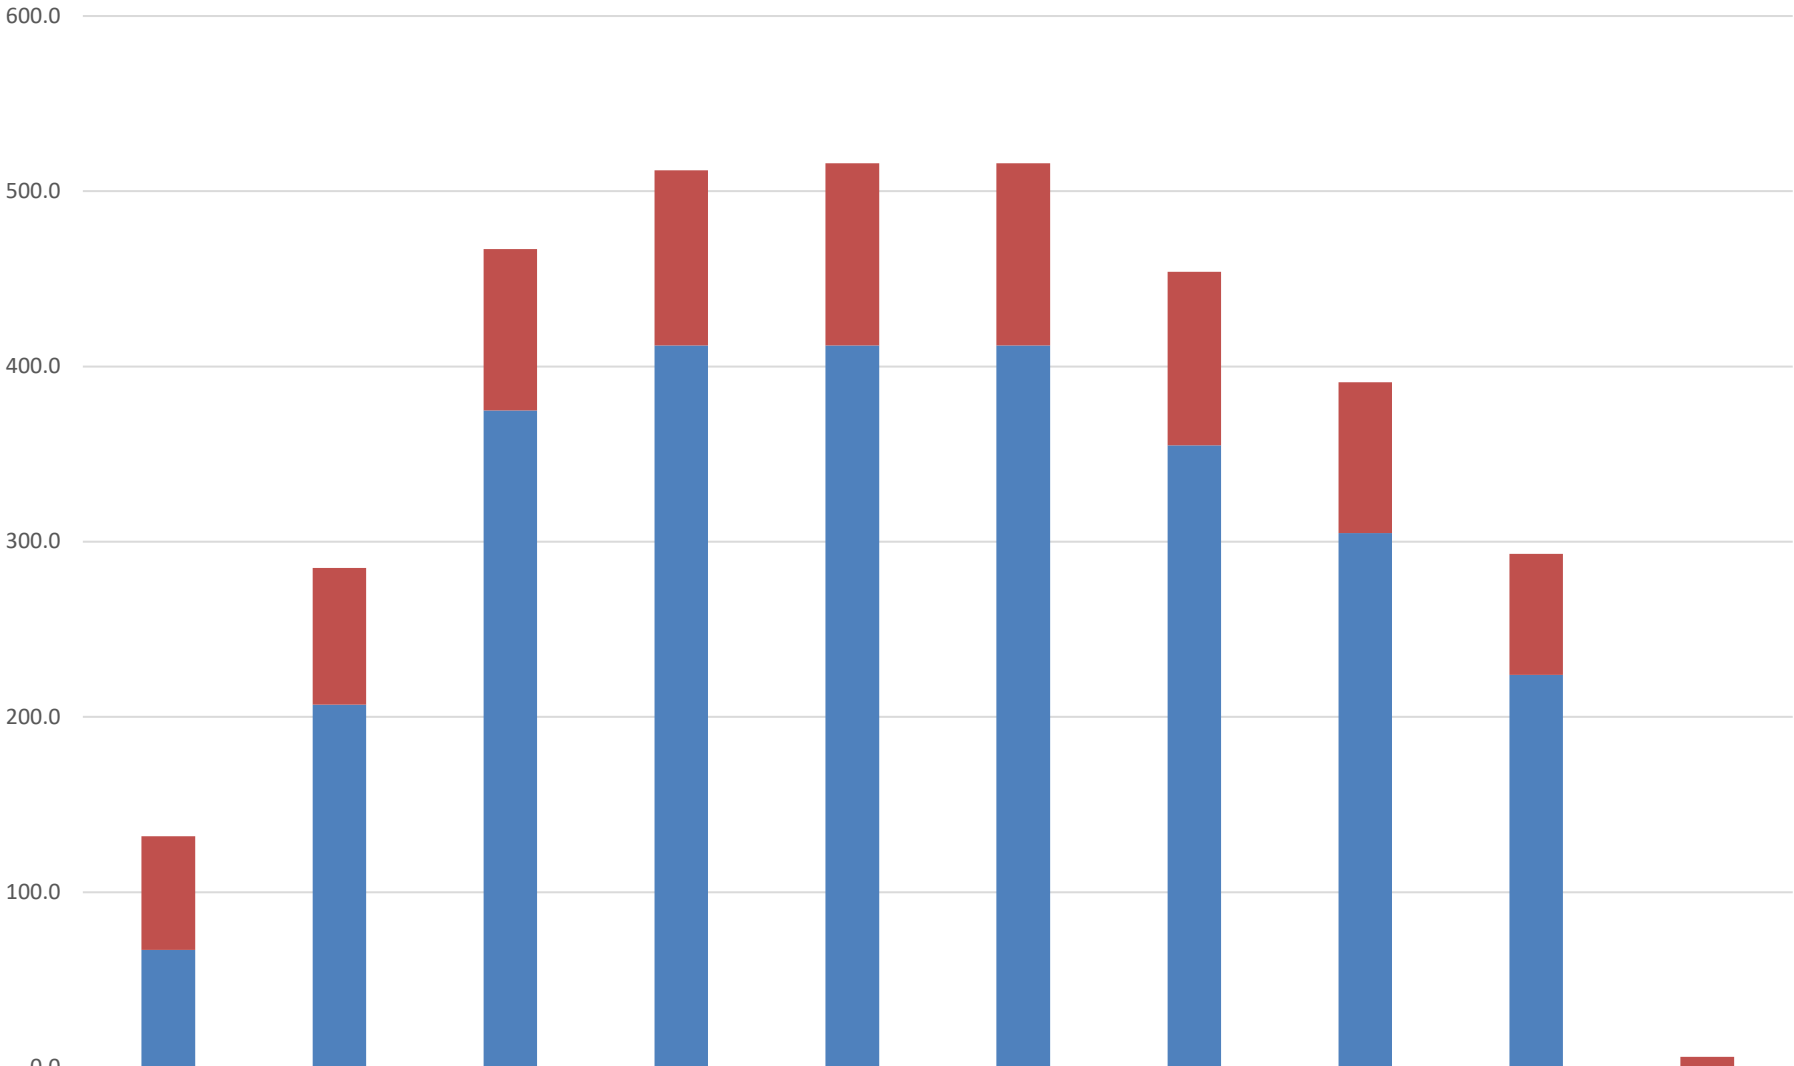

■ M.O Indirecta

■ M.O Directa

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

65

78

92

100

104

104

99

86

69

6

67.0

207.0

375.0

412.0

412.0

412.0

355.0

305.0

224.0

0.0
