




PRESENTACIÓN EJECUTIVA

P28 SUBPROYECTO A3 P28 EJECUCION DE
SUBPROYECTO A3





ÍNDICE

QUIENES SOMOS

01

PLAN DE
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

02

PLAN DE
CALIDAD

03

PLAN DE
SEGURIDAD


04

PLAN DE MEDIO
AMBIENTE

05

PROPUESTA
ECONÓMICA

06






1. QUIENES SOMOS


MELCONSI SAC es una empresa peruana, fundada en el año 2000 en el departamento de Lima, que ha ejecutado obras tales como:


- Montaje electromecánico.
- Electrificación en redes primarias, secundarias, domiciliarias.
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Instalación de líneas de tuberías.
- Fabricación y montaje de estructuras metálicas en acero al carbono e inoxidable (tanques, tuberías, plataformas, barandas, entre otros).
- Defensas ribereñas.
- Obras civiles.
- Instalación de sistemas de agua contra incendio.
- Instalación de sistemas de Presión Constante.
- Instalaciones mecánicas, sanitarias, comunicaciones y eléctricas en edificios de departamentos multifamiliares.



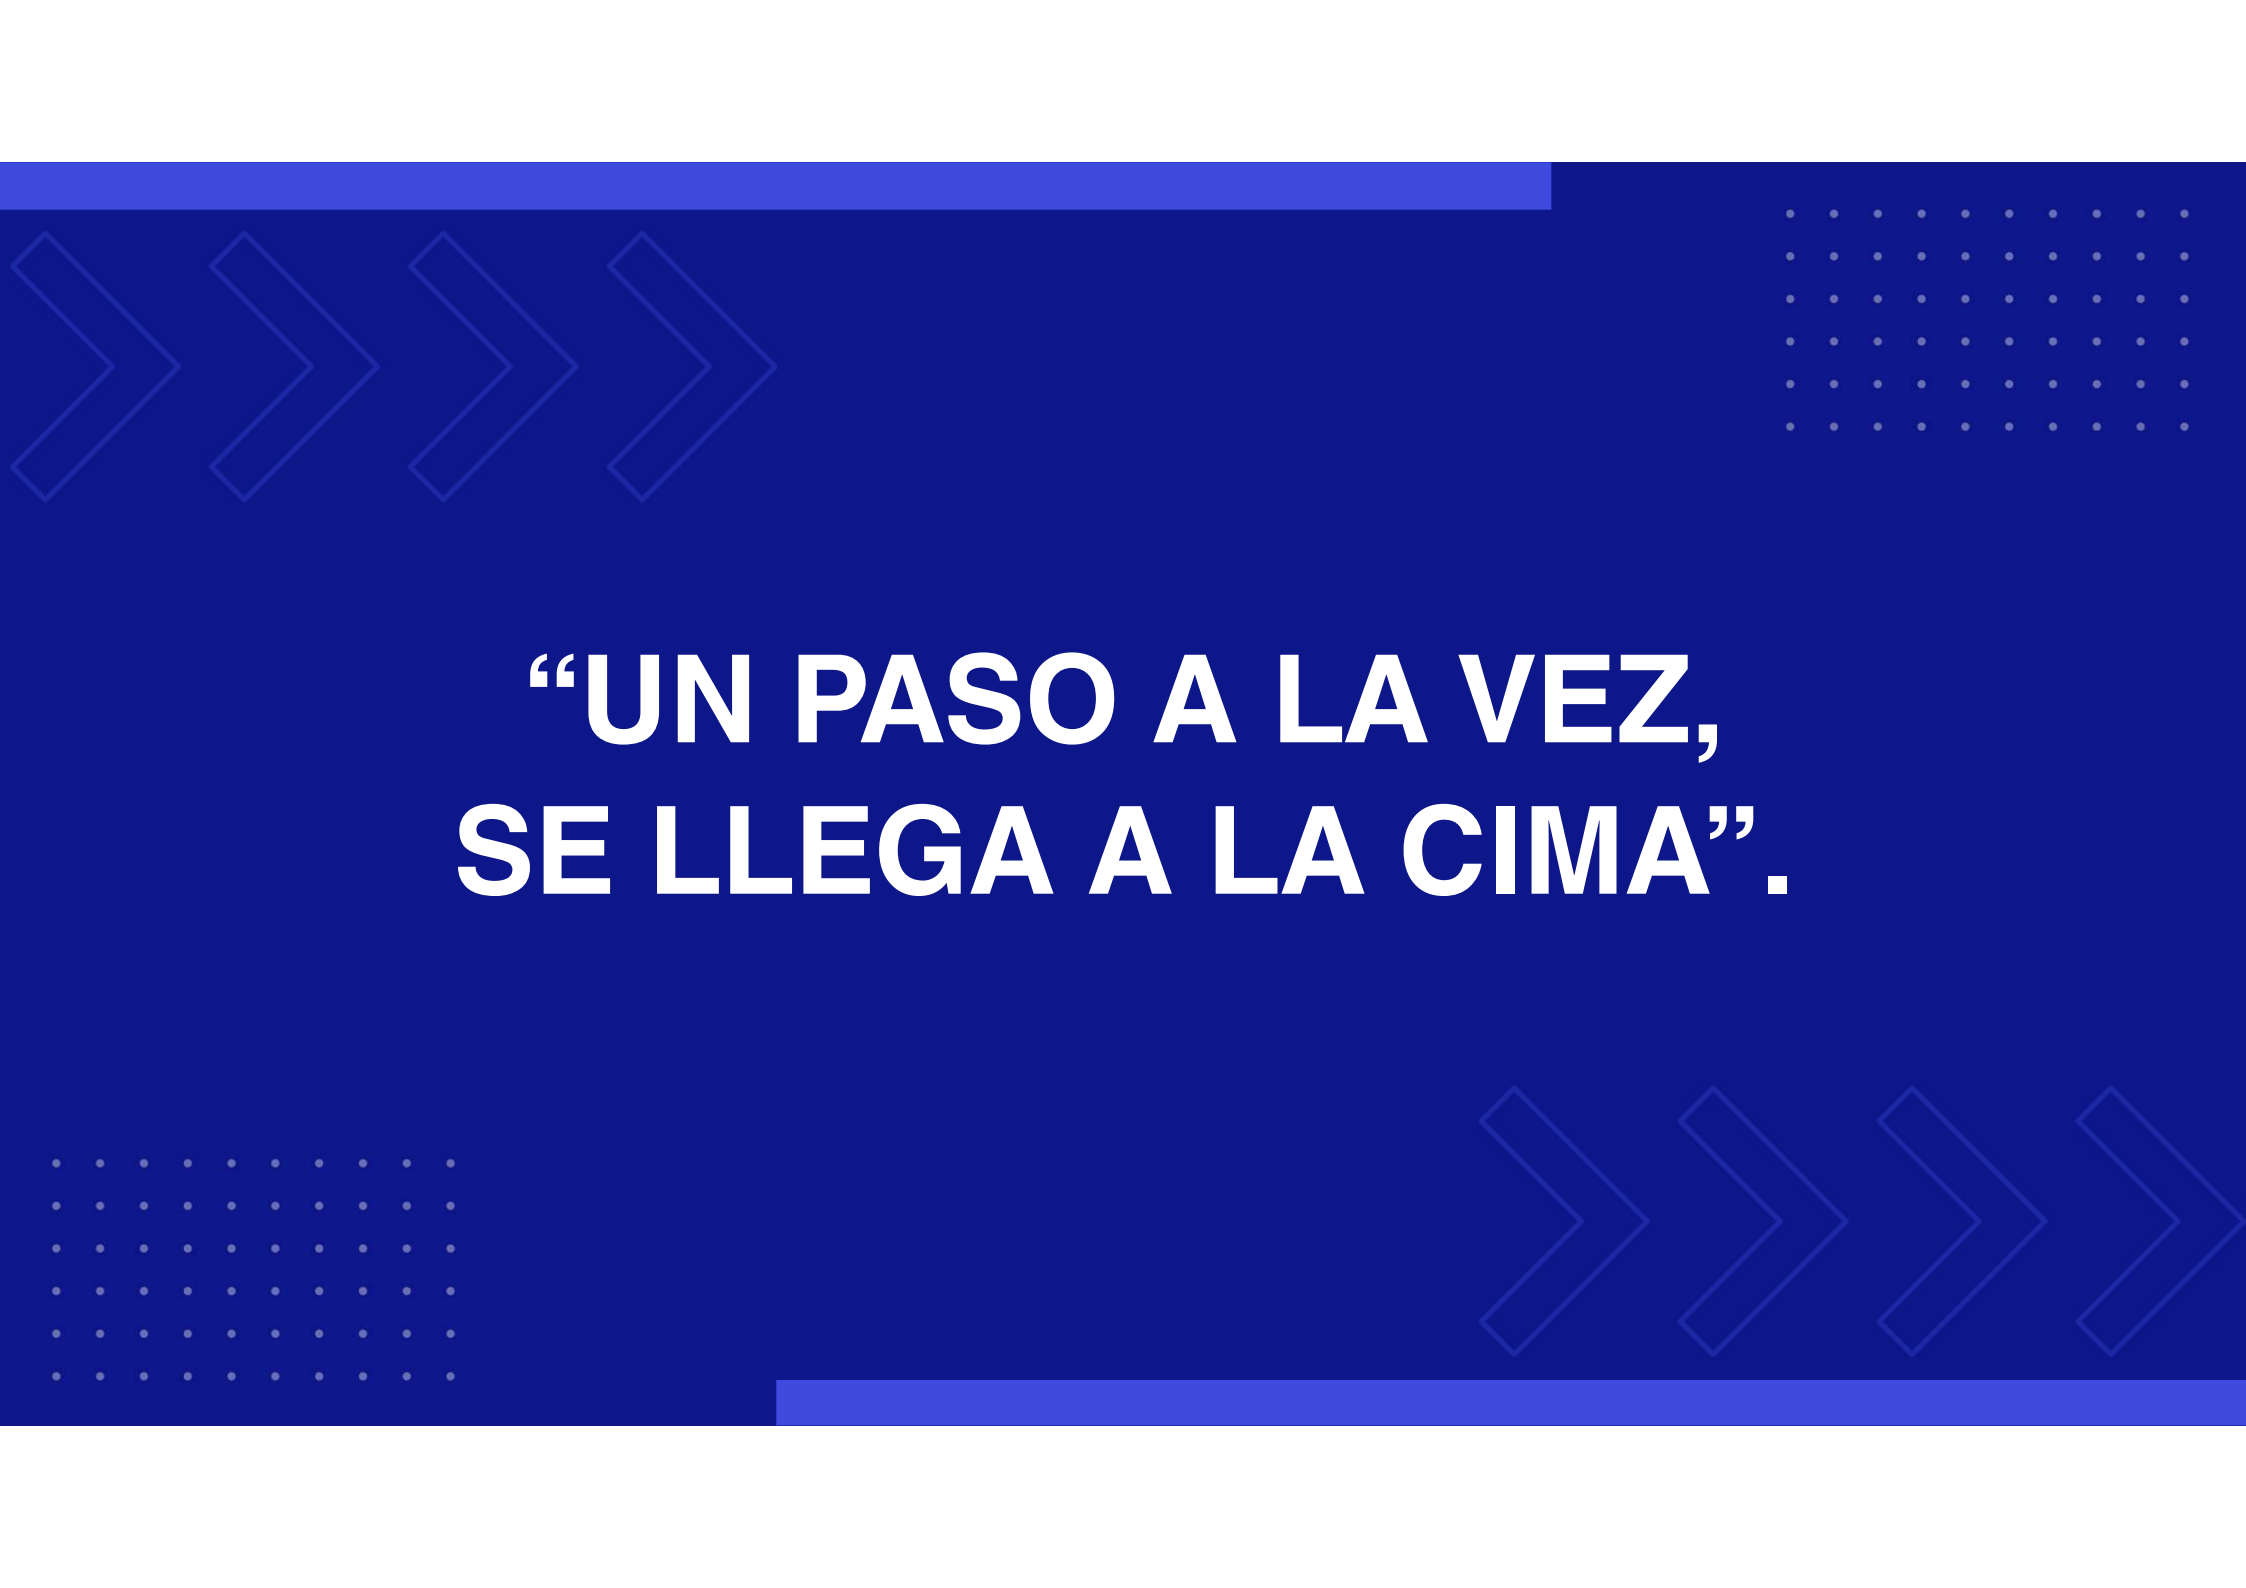


**“UN PASO A LA VEZ,
SE LLEGA A LA CIMA”.**

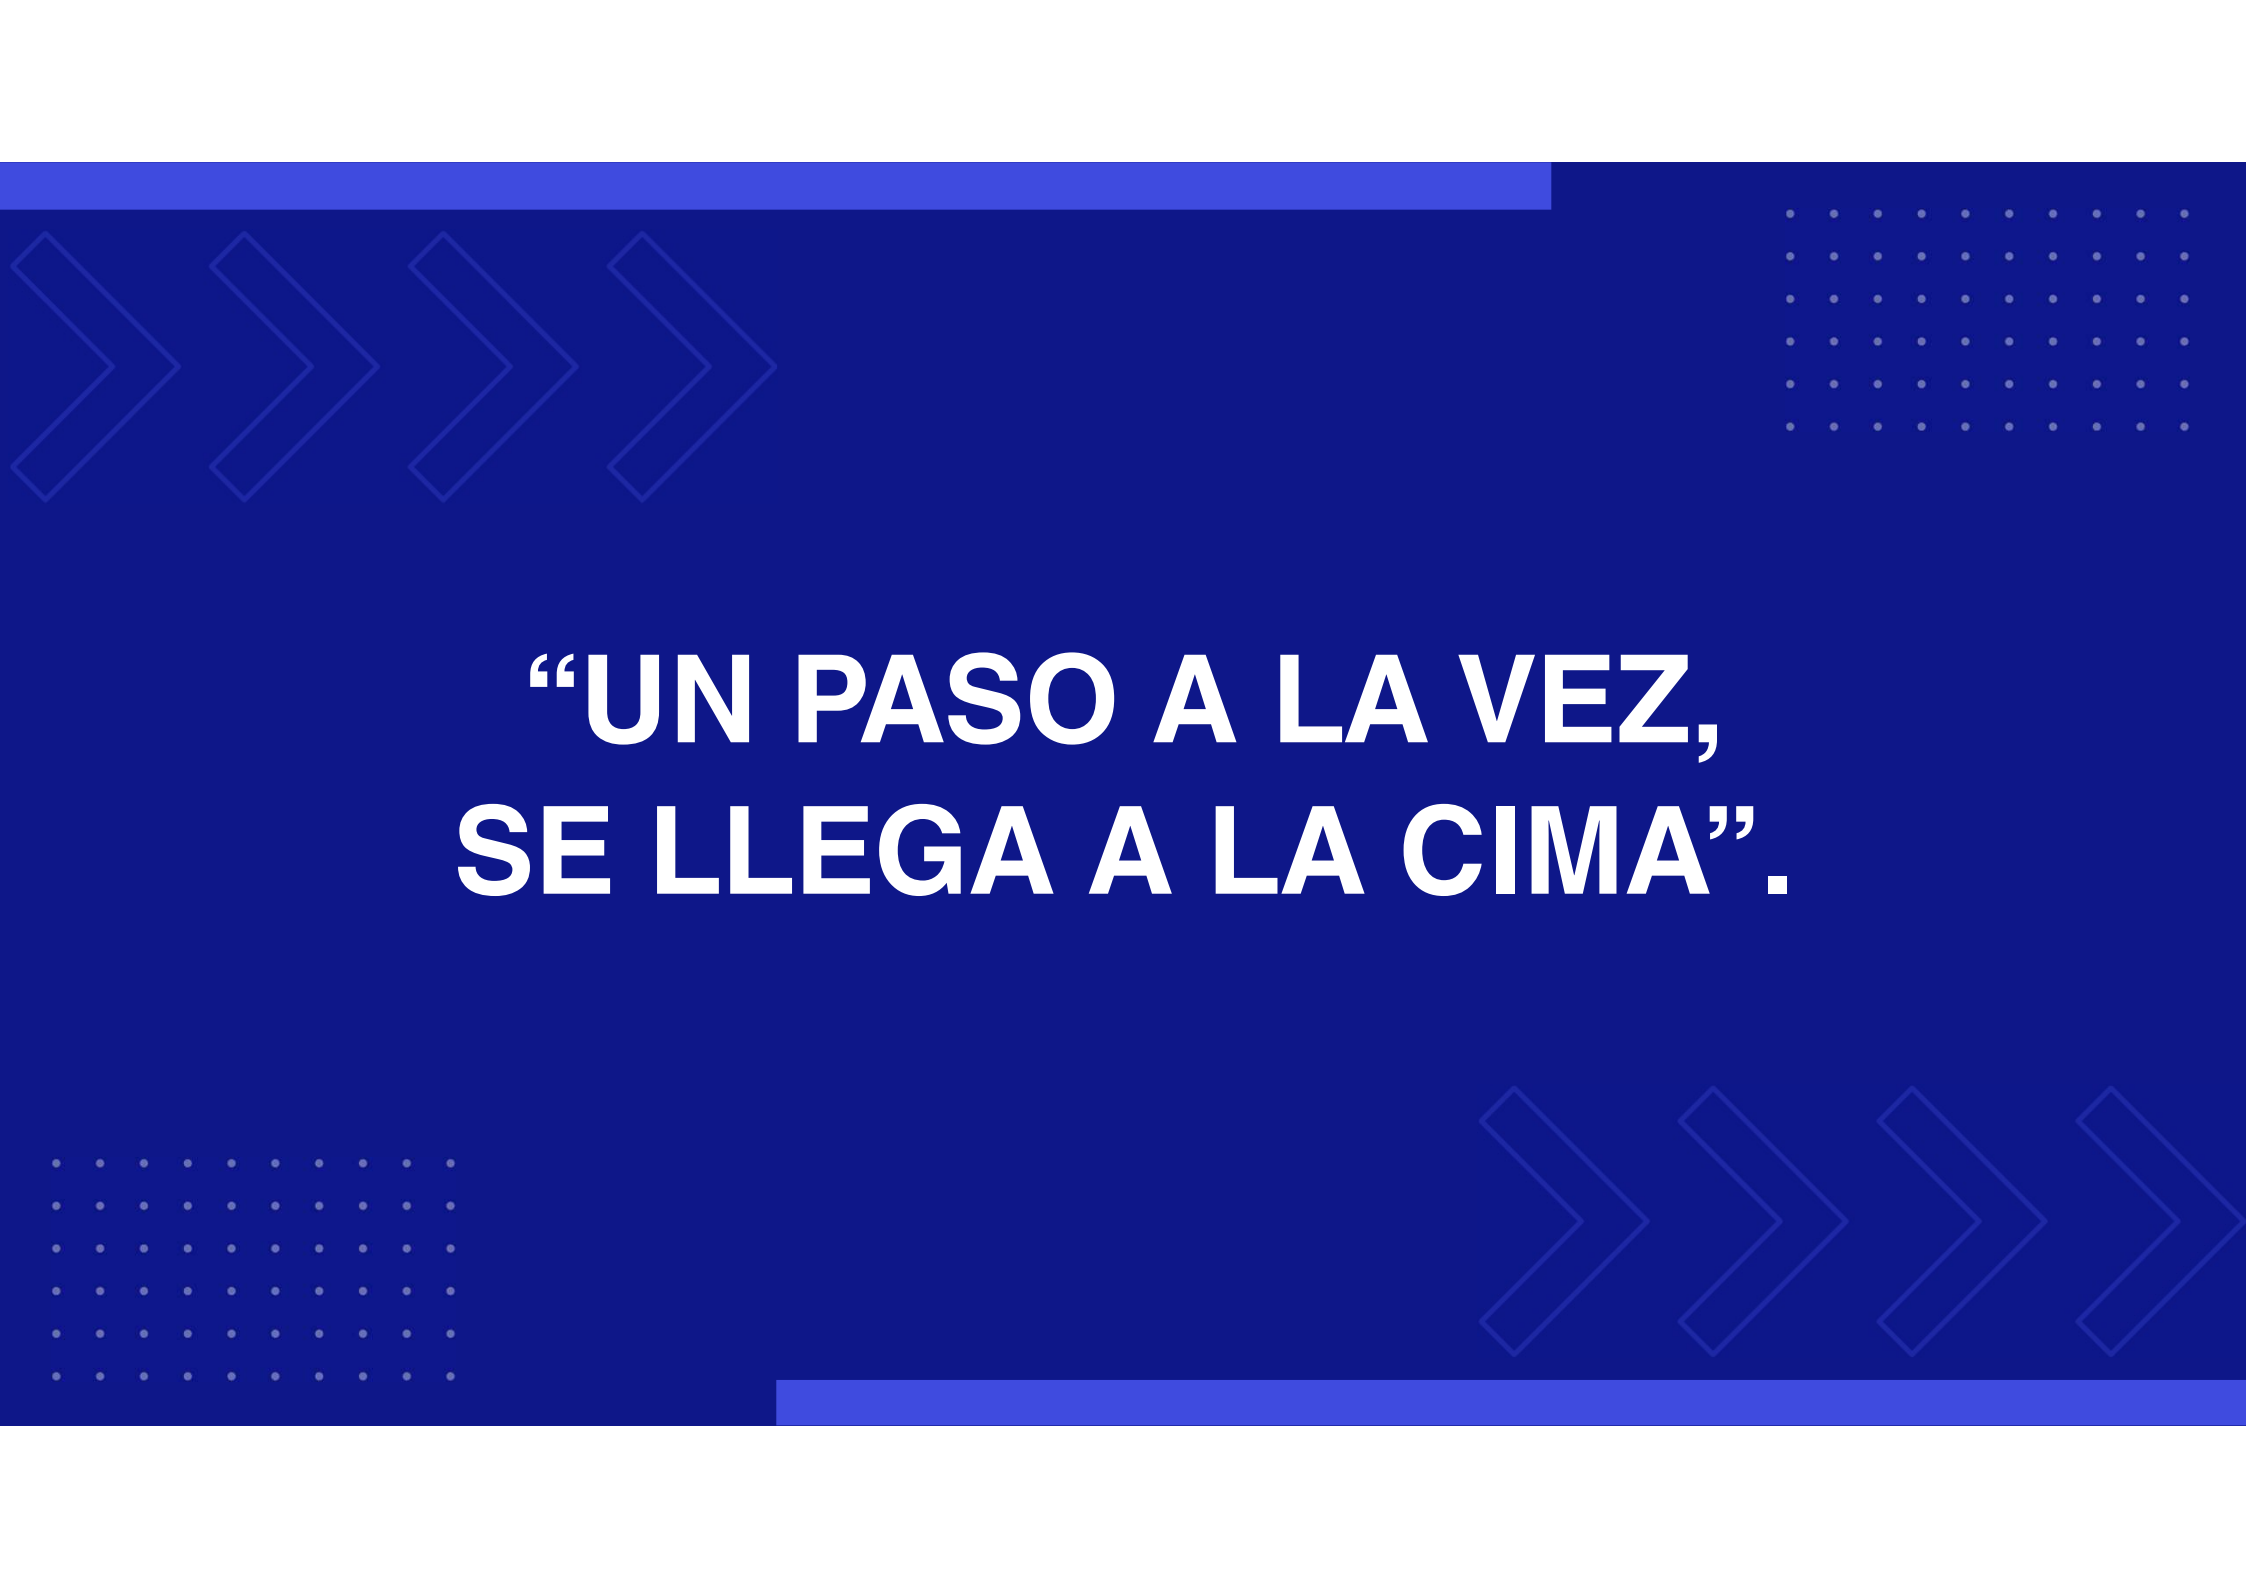




2. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Se considera 01 jornada de trabajo diaria para la ejecución de las actividades del presente proyecto.
2. Iniciaremos con la **movilización de equipos y personal a obra**. Posteriormente, iniciaremos los **trabajos de trazo topográfico**.
3. Se habilitarán los **accesos y áreas auxiliares tales como canteras, DME**, puntos de acopio, áreas para talleres, etc. En paralelo, iniciarán los trabajos de Monitoreo Ambiental, los cuales se desarrollarán hasta el fin de las actividades.
4. Se habilitarán el **campamento de obra, zona de talleres** y plantas de procesamiento de materiales. Se iniciará el procesamiento del material de corte, para obtener materiales para conformación del cuerpo del dique, corona, afirmado, etc.
5. Se realizarán los trabajos de **descolmatación del cauce**, para luego realizar **los trabajos de desvío de aguas superficiales en el cauce del río**.





2. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

6. En el caso de las **captaciones y retornos**, las **cámaras** estarán **construidas antes del** inicio de los trabajos de conformación de los **diques** donde se ubican.

7. Iniciarán los **trabajos en diques**, empleando la secuencia constructiva indica.

8. En paralelo a los trabajos de refuerzo en diques existentes, se realizarán las **Obras de Arte**.


9. Los trabajos de Infraestructura **verde y paisajismo** al **finalizar** la conformación de **los diques**.


D-01, iniciando con los movimientos de tierra, luego con los trabajos de pavimentos y bordillos, finalizando con la instalación de mobiliario.

10. Se **construirán las rampas de acceso**:

- Rampa en Dique A2-D-03, Derecha: A2-RA-D-05.
- Rampa en Dique A2-I-04, Izquierda: A2-RA-I-05.

11. **Finalizados los trabajos en los diques**, se procederá al cierre de las áreas empleadas, y a la posterior **desmovilización de los equipos del proyecto**.





3. PLAN DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD

	PLAN DE CALIDAD	Código: MEL-PC-CAL-0001
		Revisión: 01
		Fecha: 09/04/2024
		Página: 1 De 119

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PLAN DE CALIDAD MEL - PL - CAL - 0001

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
R00	16/01/2023	Emitido para Revisión y Comentarios	Daleska Lamela Sánchez	Araceli Rosado Cenas	Máximo Riquelme M
R01	12/04/2024	Emitido para Revisión y comentarios	Diana Villegaray Ingeniero de Calidad	Cristhian Nolasco Gerente de Operaciones	Máximo Riquelme Gerente General
Firmas				 Cristhian E. Nolasco Cabrera Ingeniero de Operaciones Del 1 de 11	 MELCONSI S.A.C. MAXIMO RIQUELME MARTINO

POLITICA DE CALIDAD



POLÍTICA DE CALIDAD

En la empresa MELCONSI S.A.C., estamos comprometidos con la excelencia en cada proyecto que realizamos, brindando soluciones constructivas innovadoras y sostenibles que satisfagan plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Nuestra política de calidad se expresa a través de los siguientes compromisos:

Satisfacción del Cliente:
Identificar y comprender las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad y manteniendo una comunicación continua para asegurar su satisfacción. Entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, superando sus expectativas en calidad, funcionalidad y estética.

Mejora Continua:
Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad que promueva la mejora continua basada en la retroalimentación y experiencia previa. Fomentar una cultura de innovación y aprendizaje para optimizar procesos y mejorar la eficiencia y calidad de las obras mediante nuevas técnicas y tecnologías de construcción.

Cumplimiento de Requisitos:
Asegurar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales en nuestras actividades y proyectos. Establecer y revisar objetivos de calidad medibles y coherentes con nuestra organización, optimizando el uso de materiales y recursos para reducir desperdicios y costos.

Control de Calidad:
Establecer procedimientos de control de calidad en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta la entrega final. Realizar inspecciones y auditorías regulares para mantener los estándares de calidad, documentar y comunicar adecuadamente los cambios y actualizaciones en los proyectos.

Desarrollo del Personal:
Fomentar el desarrollo profesional y personal de nuestros colaboradores a través de capacitación continua, asegurando competencias necesarias para la excelencia. Promover un ambiente de trabajo seguro, saludable y respetuoso, valorando el trabajo en equipo y la colaboración. Ofrecer formación continua y oportunidades de desarrollo, manteniendo un equipo altamente cualificado y motivado.


Relación con Proveedores y Subcontratistas:
Gestionar responsablemente las relaciones con nuestros proveedores y subcontratistas asegurando la calidad de sus servicios, trabajando en estrecha colaboración con ellos para garantizar la calidad de materiales y servicios suministrados.

Esta política de calidad es comunicada, entendida y aplicada por todos los colaboradores de la Empresa MELCONSI S.A.C. y está disponible para todas las partes interesadas. La alta dirección se compromete a revisarla periódicamente para asegurar su continua adecuación y efectividad.

Lima, Perú – Mayo de 2024


MELCONSI S.A.C.
MAXIMO RIQUELME MARTINO

Gerente General
MELCONSI S.A.C.
Rev.: 1




© 2006 The Authors
 Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



PPI

		PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CALIDAD (PPI)						Código: Versión: Fecha: Página:		MEL-PP-CAL-F001 01 06/01/2024 1	
CUENTE:						ELABORADO POR:		DIANA VILLAGARAY		PPI N°: PPI-0001	
SUPERVISIÓN:						REVISADO POR:		PEDRO HURTADO			
CONTRALISTA:						APROBADO POR:		PEDRO HURTADO			
OBRA:											
SUBCONTRATISTA:		I (MELCONSI) SAC.									
ESPECIALIDAD:		OBRAS EXTERIORES									
ITEM	ACTIVIDAD	PUNTO DE CONTROL (QUE CONTROLAR)	MÓDULO / DOCUMENTOS DE REFERENCIA (QUE CONSULTAR)	EQUIPO (CON QUE)	FRECUENCIA (CUÁNTO CONTROLAR)	CATEGORÍA DE ACEPTACIÓN Y RESEÑANCIAS	REGISTRO	RESPONSABLES (QUE QUIEN CONTROLAR)		NIVEL DE INSPECCIÓN	
								ERIGICIÓN	ERIGIMIENTO	SUPERVISIÓN	SEGUNda ETAPA
7.7	Control de acabado de superficies y dimensiones finales de la obra	Verificación del acabado y dimensiones solicitados por el proyecto	Procedimiento Operativo para Vacío de Cimentación Especificaciones Técnicas de Obras Civiles	Visual, Instrumental y Documental	Continuada	Para concreto Estructura: Poder ser superficial se debe realizar un acabado después del retiro de los encofrados. El tipo de acabado dependerá de las características de la obra. No presentará rasca de piedra, no presentará fisuras. Se debe controlar la profundidad de la armadura en cuanto a dimensiones y posición de la pieza estructural.	Formulario de Control del Concreto Simple MEDIO-CALIFICADO Formulario de Control del Concreto Armado in situ CALIFICADO	E.T	E.T	CIA / SUP. DE CALIDAD APOC	V.1, E
LEYENDA:											
ESPERA (E)		El trabajo no procede sin la presencia del personal autorizado y las firmas de autorización.									
TESTIGO (T)		Se necesita ser testigo presencial de la inspección y de las pruebas seleccionadas.									
REVISIÓN (R)		Revisión y aprobación de la documentación empleada (protocolos, procedimientos, certificados, etc.).									
INSPECCIÓN (I)		Realizar mediciones de las características del producto y comparar con los requisitos especificados.									
VERIFICACIÓN (V)		Confirmar en base a evidencia objetiva que se cumplen los requisitos especificados.									
4.B. APROBACIONES:											
REPRESENTANTES											
 TELLO CESPEDES PAUL ENRIQUE JEFE DE PRODUCCIÓN CIP 128993				 MARGARETH DIANA VILLAGARAY CABALLÓN JEFA DE CALIDAD CIP: 155584				 Ing. Pedro M. Hurtado Bozzo Residente de obra CIP 105483			
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN				INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD				RESIDENTE DE OBRA			
N° DE VISIÓN	PUNTO DEL DOCUMENTO			CONTROL DE CAMBIO		ESTADO DE LA INSPECCIÓN		FECHA			
02	Entrega para Revisión y Comentarios:					—		06/01/2024			



3. PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL TOPOGRÁFICO	Código:	MEL-PRO-SSM-024
		Versión:	01
		Fecha:	23/09/2024
		Página:	1 de 14


PROCEDIMIENTO DE CONTROL TOPOGRÁFICO


CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA (PAQUETE - R 07) SUBPROYECTO A3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 LEONARDO RODRÍGUEZ CÁRDENAS DCCAS	 ALEXANDER RIQUELME CORDOVA MELCONSI SAC	 MAXIMILIANO REYES MAUTHEU MELCONSI SAC
SSOMA	SUBGERENTE GENERAL	GERENTE GENERAL
Fecha: 23/ 09 / 2024	Fecha: 23/ 09 / 2024	Fecha: 23/ 09 / 2024

FORMATOS

		FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		Código: MEL-910-CAL-0043		
				Versión: 01		
				Página: 01		
PROYECTO:						
CLIENTE:						
ELOCITE:						
UBICACIÓN:						
ELEMENTO:						
N° PLANO		REV				
DESCRIPCIÓN		ING. DE CAMPO (CONSTRUCCIÓN)				
		C	NC	NA		
		COMENTARIOS				
1	Comprobación de vigencia de Planos y datos topográficos					
2	Operatividad y calibración de los equipos topográficos					
3	Comprobación de puntos topográficos					
4	Operatividad de los equipos y vehículos de movimiento de tierra:					
5	Ubicación del trazo, medidas y profundidad de corte					
6	Nivel de Excavación de Terreno					
7	Material adecuado para relleno					
7.1	Documento asociado al muestreo (proctor)					
8	Aplica caladura/Entibado					
8.1	Mazda según diseño (concreto ciclope)					
8.2	Proceso constructivo por paños intercalados					
8.3	Verificación de medidas de los paños según plano					
		C: CONFORME NC: NO CONFORME NA: NO APLICA				
Se adjunta fotografías:		SI	☐ NO	☐		
Se adjunta Croquis:		SI	☐ NO	☐		
OBSERVACIONES:		Firma:				
		Cargo:				
		Nombre:				
		Fecha:				
		RESPONSABLE DE MELCONSI SAC				
Firma:		Firma:				
Cargo:		Cargo:				
Nombre:		Nombre:				
Fecha:		Fecha:				
JEFE DE PRODUCCIÓN CONTRATISTA		RESPONSABLE DE CALIDAD CONTRATISTA		RESPONSABLE DE SITIO DEL CONTRATISTA		





4. PLAN DE SEGURIDAD

PLAN ANUAL

	PLAN	Código: MEL-PSSM-001
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisión: 04
		Fecha: 07/09/2023
Página: 1 de 34		

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE

SEGURIDAD Y

SALUD

EN EL TRABAJO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 SSOMA	 Alexander Riquelme Córdor	 MAXIMO ROQUELES MAUTINO
SSOMA	SUBGERENTE GENERAL	GERENTE GENERAL
Fecha: 07/09/2024	Fecha: 07/09/2024	Fecha: 07/09/2024



POLÍTICA

POLÍTICA INTERNA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MELCONSI S.A.C. es una empresa que se dedica como actividad principal al rubro de construcción de edificios y como actividad secundaria la fabricación de productos metálicos para las estructuras, cumpliendo con los estándares de seguridad y ambiente, en cada uno de nuestros procesos, al considerar que nuestra responsabilidad con nuestros colaboradores, clientes y ambiente, así como con los recursos más importantes de la empresa, es por ello que asumimos el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), mediante los siguientes compromisos: Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, clientes, visitantes, proveedores, colaboradores de trabajo seguro, con el fin de evitar incidentes, accidentes o daños a la salud. Proteger el medio ambiente, reduciendo los impactos ambientales que puedan generar nuestros procesos. Promover la consulta y participación de nuestros trabajadores, sus representantes y clientes, activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Aplicar la mejora continua, para alcanzar un alto nivel de desempeño y para ello, identificamos los riesgos de SSOMA que se originan en nuestros procesos y los relacionamos a los riesgos del negocio. Resguardar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes pertinentes a medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como también los acuerdos y compromisos que la organización suscribe. Integrar el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente al sistema de gestión que cuenta la organización. Definir a todos los colaboradores de la organización a nivel de la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual servirá de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. MELCONSI S.A.C. Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Lima, 02 de enero del 2024.	
---	--

PRE

	PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ORDEN DE REQUISITO Y CANCELACIÓN TÍTULO: 02	Código: MEL-P-0009-002 Revisión: 01 Fecha: 06/07/2023 Página: 1 de 02
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		
Elaborado por: HUMBERTO VICOSCA Fecha: 07/09/2024	Revisado por: JEFE DE PREVENCIÓN Fecha: 07/09/2024	Aprobado por: GERENTE GENERAL Fecha: 07/09/2024

LÍNEA BASE

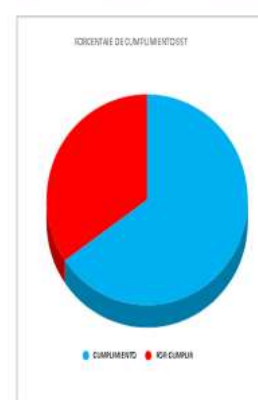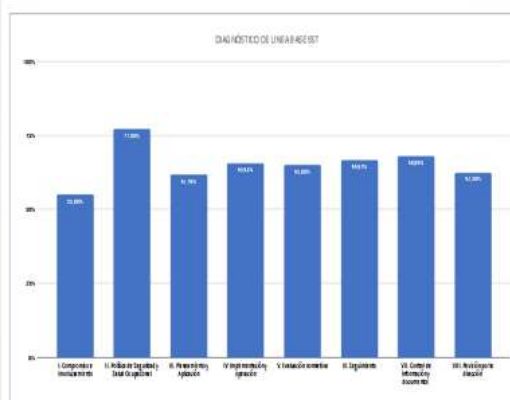

Porcentaje de Cumplimiento	Calificación
75-100	ACEPTABLE
50-75	REGULAR
25-50	BAJO
0-25	INSUFICIENTE

CONCLUSIÓN
De acuerdo al porcentaje final del diagnóstico de línea base IS, el mismo que de acuerdo a los rangos de cumplimiento, se encuentra en:
65.21%
REGULAR

AUDITORIA

		FORMATO		Fecha: _____ Versión: 01 Fecha: 02/07/2023	
REGISTRO DE AUDITORÍAS					
DATOS DEL EMPLEADOR					
1	2	3	4	5	6
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
WELDON SAC	20030694412	Cd. San Pedro Nro. 271, Santa Luita El Dns, Los Olivos, LIMA	CONSTRUCCIÓN		
10 NOMBRE(S) DEL(LOS) AUDITADO(S)			11 N° REGISTRO		
Jesús Martín Sierra Alguero			Resolución Directoral N° 003-2023-GR/CD/CD/OT/DE/DP/DP/OT		
12 FECHAS DE AUDITORÍA		13 PROCESOS AUDITADOS		14 NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS	
10/11/2023		Solo Contable		Yessenia Paredes Araya	
10/11/2023		Atendidos del Riesgo		Marcel La Madrid Jarama	
27/11/2023		Sueldo		Roxsany Gonzalez Torres	
15 NÚMERO DE NO CONFORMIDADES		16 INFORMACIÓN A ADJUNTAR			
2		Al informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditados. El Plan de acción para cierre de no conformidades (guiarcel a la auditoría). Entre plan de acción conforme la descripción de los causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de excel adjunto)			
		17 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD			
18 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD		19 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD			
No Cumple, la empresa no cuenta con programas de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, factores psicosociales y riesgos de ergonomía vigente a la fecha de auditoría, dicho programa se encuentra incluido en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.		No se tiene en consideración la normativa vigente			
No Cumple, se constató que no cuenta con un programas y registros donde constara el seguimiento de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, factores psicosociales y de riesgos de ergonomía, según las actividades que realizan actualmente, desactualizado durante el año 2023 y con vigencia a la fecha de la auditoría.		No se tiene en consideración la normativa vigente			
20 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS		21 NOMBRE DEL RESPONSABLE		22 FECHA DE EJECUCIÓN	
				DIA MES AÑO	
Actualizar el Programa Anual de Seguridad y salud en el Trabajo (incluir monitoreos de agentes ocupacionales)		Leonardo Rodrigo Ceballos Cruz		28 1 2024	
Realizar monitoreos de agentes ocupacionales		Empresa sistema		30 11 2024	
		23 RESPONSABLE DEL REGISTRO			
Nombre:		Leonardo Rodrigo Ceballos Cruz			
Cargo:		JEFE/CA			
Fecha:		05/01/2024			
Firma:					

PROCEDIMIENTO- IPERC

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA VACIADO
DE CONCRETO


CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO
LACRAMARCA (PAQUETE – R 07) SUBPROYECTO A3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN (CÓMISFISCAL) GOBIERNO DEPARTAMENTAL ANTIOQUIA BOGOTÁ	 Alexander Negretes Cárdenas	 MELCONIS S.A.S. BOGOTÁ
SSOMA	SUBGERENTE GENERAL	GERENTE GENERAL
Fecha: 23/09/2024	Fecha: 23/09/2024	Fecha: 23/09/2024

[illegible]

REGISTROS

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | MEL-FO-SSM-01: REGISTRO DE EXAMENES MÉDICOS.xlsx | Δ |
| 2 | MEL-FO-SSM-010: REGISTRO DE AUDITORIA.xlsx | Δ |
| 3 | MEL-FO-SSM-008,MEL-FO-SSM-009: DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGISTRO DE EST... | Δ |
| 4 | MEL-FO-SSM-007: REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS.xlsx | Δ |
| 5 | MEL-FO-SSM-006: REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DES... | Δ |
| 6 | MEL-FO-SSM-005: REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA.xlsx | Δ |
| 7 | MEL-FO-SSM-004: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA.xlsx | Δ |
| 8 | MEL-FO-SSM-003: REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.xlsx | Δ |
| 9 | MEL-FO-SSM-002: REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES.xlsx | Δ |
| 10 | MEL-FO-SSM-001: REGISTRO DE ACCIDENTES.xlsx | Δ |



5. PLAN DE MEDIO AMBIENTE

DOCUMENTOS

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)

MELCONSI S.A.C. es una empresa que se dedica como actividad principal al rubro de construcción de edificios y como actividad secundaria la fabricación de productos metálicos para uso estructural, cumpliendo con los estándares de seguridad y ambiental, en cada uno de nuestros procesos, es consciente que nuestra responsabilidad con nuestros colaboradores, clientes y el ambiente, son considerados como los recursos más importantes de la empresa. Es por ello que asumimos, el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), mediante los siguientes compromisos:

- Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, clientes, visitantes, proporcionando condiciones de trabajo seguras, con el fin de evitar incidentes, accidentes o daños a la salud.
- Proteger el medio ambiente, reduciendo los impactos ambientales que pueden generar nuestros procesos.
- Promover la consulta y participación de nuestros trabajadores, sus representantes y clientes, activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio ambiente.
- Aplicar la mejora continua, para alcanzar un alto nivel de desempeño y para ello, identificamos los riesgos de SSOMA que se originan en nuestras actividades y los reducimos a los niveles más bajo posibles.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes pertinentes a medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Así como también los acuerdos y compromisos que la organización suscribe.
- Integrar el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente los otros sistemas de gestión que cuenta la organización.
- Diffundir a todos los colaboradores de la organización e interesados la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, lo que servirá de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

MELCONSI S.A.C.
MAXIMO JOSE LUIS MAUTENO

Lima, 02 de enero del 2024.

ELCONSI S.A.C.
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: MEL-PL-SDM-002
Versión: 02
Fecha: 02/01/2023
Página: 3 de 40

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 INGENIERA SSOMA Fecha: 07 / 09 / 2024	 JEFE DE PROYECTOS Fecha: 07 / 09 / 2024	 GERENTE GENERAL Fecha: 07 / 09 / 2024





CAMPAÑAS E INSPECCIONES



RESIDUOS LÍQUIDOS



RESIDUOS NO PELIGROSOS




MITIGACIÓN DE POLVO



PROCEDIMIENTO DE MITIGACIÓN DE POLVO IE 88301 PAMPAROMAS

REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELAB. POR	REV. POR	APROB. POR
000	13/10/2023	Emisión para Aprobación	Katherine Gayán	Jhoratan Chávez	Máximo Riquelme
FIRMAS					




6. PROPUESTA ECONÓMICA

Proyecto:

Defensas ribereñas del río Lacramarca

COSTO DIRECTO		SI.	38,281,650.10
GASTOS GENERALES	13.69%	SI.	5,240,037.80
UTILIDAD	6%	SI.	2,296,899.01
SUB TOTAL		SI.	45,818,586.91
IGV	18%	SI.	8,247,345.64
TOTAL		SI.	54,065,932.55





Contáctenos

Puedes escribirnos a melconsisac@gmail.com





Muchas Gracias.

